



دکرني، اوپولگولواو مالداري وزارت  
وزارت زراعت، آبياري و مالداري

داغفغانستان اسلامي جمهوري دولت  
دولت جمهوري اسلامي افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معينيت آبياري و منابع طبيعى  
رياست آبياري  
آمریت انجنيري

احكام	تاریخ	پيش نهاد
<p>۱۱۰۲ کارهای ۱۳۹۸/۰۲/۲۳</p> <p>شماره: ۰۹۷۶۰۱۱۳</p> <p>من بنیه ها و جنگ ها و نا فتن مایی نموده همچو تهروره صرحت وزریه امور امور</p> <p>مشت شاه غنی</p> <p>امین آبادی و منابع طبی</p>		<p>به مقام محترم وزارت، زراعت، آبياري و مالداري!</p> <p>پروژه دیوار محافظی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه ئی ولايت لغمان که قبلًا توسيط انجنيران اين رياست سروي، ديزاين و مبلغ چهار ملیون و چهار صد و هفتادو پنج هزارو هشت صدو چهل و يك (4475841) افغانی برآورد آن تخمين گردیده است و هم چنان شامل پلان مالي سال 1398 رياست آبياري نيز بوده و آماده پروشه تدارکاتي مي باشد.</p> <p>بنما موضوع به مقام محترم پيش نهاد آنقدم است اميد حکم منظوري پروژه متذکره را از بودجه پروژه احداث ذخایر کوچك آب و ساختمان هاي آبياري داراي کود AFG390676 اعطای فرمائيد. پسنهاد هذا بتعديد (14) ورق نقشه، جدول برآورد قيمت دار و بدون قيمت و جدول ميعاد کار پروژه متذکره جهت مزيد معلومات تقديم است.</p> <p>با احترام</p> <p>انجنير خليل الرحمن "عمر" سرپرست رياست آبياري</p>

		ملاحظات
		تاریخ تخمینی تکمیل پروژه
05/07/98		05
180		04
06/01/98		03
17/12/97	تاریخ تخمینی نش اطلاعیه تضمیم بر اعلانی فرادراد	02
03/12/97	تاریخ ارایه گزارش ارزیابی	01
01/12/97	تاریخ ختم ارزیابی اورها	00
01/11/97	تاریخ تخمینی بازگشایی آورها	-
11/10/97	تاریخ تخمینی اعلان تدارکات / پروژه	-
15/11/97	تاریخ تخمینی مظاومی آغاز بروکس تدارکات ایروزه	-
ندراد	تاریخ ارزیابی قبل از اعلیات داوطلبان در صورت که ایروز باشد	-
4475841	قیمت تخمینی تدارکات / پروژه به (الگانی)	-
300000000	مبلغ بودجه منظور شده به الگانی	-
MAIL/PD/NCB/ W127/98	شماره قرارداد	-
در صورت ضرورت گرفته می شود	توضیح تدارکات از منابع داخلی	-
بروزه پذان شده چندین یا انتقالی	بروزه پذان شده چندین یا انتقالی	0
جدید	سال های قبل	0
اعمار	کنگوری تدارکات	-
به اسلن پیشرفت کار	نوع قرارداد	-
روش یا شیوه تدارکات (در پار داخلی)	روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های نوع تدارکات	-
ساختمنی		-
جهات انتقالی		-
دولت افغانستان	دولت افغانستان	8
شهردان	قرمه	7
قرغنه نمی	ولسوالی	6
لغن	ولایت	5
AFG/390676	کود بوجه	4
الختباری	بودجه اختباری پاپیکری-الختباری	3
الکشاونی	نوع بوجه (عادی/ الکشاونی)	2
وزارت زراعت ایباری و مداری	اداره تدارکاتی	1
سکور زراعت و اکتشاف دهات	سکور	0
شماره		-



دکرنی، اوپولگولواو مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

دافتاشن اسلامی جمهوری دولت  
دولت جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امریت انженیری

تاریخ: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷

شماره: ( ۵۴۰ )  
۳۹۱

✓ به ریاست محترم تهیه و تدارکات!

به منظور تسریع روند تطبیق پروژه های اکشافی اینک به تعداد (16) ورق اسناد پروژه اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولابت لغمان که شامل (11) ورق نقشه، یک ورق فورم تعهد بودجوى، دو ورق جدول بر آورد قیمت دار و بدون قیمت و یک ورق جدول میعاد و گرتی پروژه، یک ورق لست تجهیزات ساختمانی پروژه فوق الذکر می باشد، جهت طی مراحل پروسه تدارکاتی به شما ارسال است.

با احترام

انجینیر خلیل الرحمن "عمر"

سرپرست ریاست آبیاری

۱۳۹۷/۱۱/۲۷  
۹۷/۱۱/۱۰  
MAYL/PD/IR/1397/11/27  
کاپی ها:

به امریت برنامه، نظارت و ارزیابی  
امریت آبیاری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت (لغمان)

۹۷/۱۱/۱۵  
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

صرف برای تدارکات یک ساله {ماده 13(3)، حکم 14(15)

<p><b>درخواست تدارکات</b></p> <p>قانون تدارکات سلطان ۱۳۸۷ فصل ۲ ماده ۱۲</p> <p>احکام طرز العمل تدارکات واحد پالیسی تدارکات حمل ۱۳۸۶ فصل ۲ حکم ۱۳</p>	 <p><b>وزارت زراعت، آبیاری و مالداری</b></p> <p>Ministry of Agriculture</p>				
<p>تاریخ درخواست خریداری</p> <p>( ) شماره پروژه:</p>	<p>شماره درخواست خریداری در AFMIS</p> <p>اداره درخواست کننده: ریاست آبیاری</p> <p>نوعیت تدارکاتی:</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">اجناس</td> <td style="width: 10%;">امور ساختمانی</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">خدمات</td> </tr> </table> <p>روش باز</p>	اجناس	امور ساختمانی	<input checked="" type="checkbox"/>	خدمات	<p>روش تدارکاتی { ماده ۲۰ ، حکم ۲۱ (۱) } :</p> <p>کود بودجه { ماده ۲۰ ، حکم ۲۰ (۱) } :</p> <p>ایا بودجه منظور گردیده است؟ { ماده ۱۳ (۱) . حکم ۱۴ (۱) }</p>
اجناس	امور ساختمانی	<input checked="" type="checkbox"/>	خدمات		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">نخیر</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">بلی</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نخیر	بلی	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نخیر	بلی		

استدلال

این پیروزه در قسمت تامین آب کافی جهت ابیاری زمین های زراعتی برای دهاقنی در منطقه مفید واقع میگردد.

توضیح {ماده 14 (1) ، حکم 15 (1) برای اجناس ، 17 برای امور ساختمانی	نام پروره	قیمت فی واحد	قیمت تخمینی کل
پروره احداث نخایر کوچک آب و ساختمانهای آبیاری از کود بودجه AFG/390676	پروره : دیوار محافظه کاتال شهیدان ولسوالی : فرغه نی ولايت: لغمان	-4475841 افغانی	۱
قیمت تخمینی { ماده 12 (2) ، حکم 13 (1) -2 }			درخواست کننده :
اسم: انجیر خلیل الرحمن "عمر"      وظیفه: سرپرست ریاست آبیاری			تاریخ: ۰۲/۱۱/۱۳۹۷

## تائید موجویت پوچه از سوی ریاست مالی

پروژه آبیاری و ذخایر آب دارای AFG390676 بوده و در پلان سال مالی 1398 مبلغ 280,000,000 افغانی منظوری دارد. از آن جمله مبلغ 4,475,841 افغانی آن بابت اعمار دیوار محافظه کار شهیدان ولسوالی قرغه نه ولایت لغمان طبق پلان مالی سال 1398 تعهد گردیده. بالاحترام

تأیید کننده { ماده 13 (1) ، حکم 14 (1) :  
اسم: وظیفه:



دکرني، ابولگوني او مالداري و وزارت

وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock**

داغفغانستان اسلامي جمهوریت

جمهوری اسلامی افغانستان

معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

أمریت انجنیری



ولایت : لغمان

ولسوالی : قرغه بی

قریه : شهیدان

پروژه : دیوار محافظه کانال شهیدان

Province : Laghman

Distrect : Qarghayi

Village : Shahedan

Project : Shahedan Canal Protection Wall

شماره	تفصیل امور	واحد	حجم	قیمت فیات تخمینی به افغانی	قیمت مجموعی تخمینی به افغانی	ملاحظه
1	کند نکاری برای تهدابها در زمین ریگی و چندر	متر مکعب	2234			
2	سنگ کاری بامصاله نسبت 1:4 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	1646.1			
3	سنگ کاری خشکه مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	23.3			
4	هنگاف کاری بامصاله نسبت 1:3	متر مربع	1431			
5	کانگریت سیخ دار (RCC) با قالب بندی مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	1.4			
6	کانگریت بدون سیخ (PCC) با قالب بندی مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	48.2			
7	پرکاری عقب دیوارها توسط مواد کندن کاری شده مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	731			
8	تخليه کردن آب از تهداب به اساس ضرورت در اسنای کارکردن	LS	1			
مجموع قیمت تخمینی به افغانی						
4,475,841						

قرار شرح فوق جدول برآورد اول امور کاری پروژه ( دیوار محافظه کانال شهیدان ) ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان غرض اجرآت بعدی ترتیب و تقدیم است.

انجینیر سالار (اکبر) :

عبدالرحمون انجینیر دیزاين :

محمد زمان انجینیر برآورده :

03 07 1397



دکرني ، ابولگوني او مالداري وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

*Islamic Republic of Afghanistan*  
*Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*

دافتارستان اسلامي جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان



معینیت آبیاری و منابع طبیعی  
ریاست آبیاری  
امرت انجمنی

Province : Laghman

Distrect : Qarghayi

Village : Shahedan

Project : Shahedan Canal Protection Wall

ولایت : لغمان

ولسوالی : فرغه بی

قریه : شهیدان

پروژه : دیوار محافظه کانال شهیدان

شماره	تفصیل امور	واحد	حجم	قیمت فیات تخمینی به افغانی	قیمت مجموعی تخمینی به افغانی	ملاحظه
1	کند تکاری برای تهدابها در زمین ریگ و جنگلار	متر مکعب	2234			
2	سنگ کاری با مصاله نسبت 1:4 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	1646.1			
3	سنگ کاری خشکه مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	23.3			
4	هنگاف کاری با مصاله نسبت 1:3	متر مربع	1431			
5	کانگریت سیخ دار (RCC) با قالب بندی مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	1.4			
6	کانگریت بدون سیخ (PCC) با قالب بندی مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	48.2			
7	پر کاری عقب دیوارها توسط مواد کدن کاری شده مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	731			
8	تخليه کردن آب از تهداب به اساس ضرورت در اسنای کار کردن	LS	1			
مجموع قیمت تخمینی به افغانی						

قرار شرح فوق جدول برآورد اول امور کاری پروژه ( دیوار محافظه کانال شهیدان ) ولسوالی فرغه بی ولایت لغمان غرض اجرآت بعدی ترتیب و تقدیم است.

انجمن انجیر برآورد :

عبدالرحمن انجیر دیباين :

محمد زمان انجیر برآورد :

۰۳۰۷۱۳۹۷



## دکرنی، ابولگونی او مالداری وزارت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

## د افغانستان اسلامي جمهوریت

*Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*

معدنیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آیینہ

**Province : Laghman**

**Duration : Six Months Calender days**

### **Granty : One Year**

## **Project : Shahedan Canal Protection Wall**

ولایت : لغمان

مدت پروردۀ : شش ماه تقویمی

گرنتی پروژہ: یک سال

## نام پروژہ : دیوار محافظت

نام پروژه : دیوار محافظتی کانال شهیدان

نام پروژه : بلوار مخصوصی ماد شهریان		شماره		
		ردیف		
ردیف	تشریفات	واحد	حجم	مدادهای روز
1	آمادگی ساخه			7
2	کند نکاری برای تهدابها در زمین ریگی و چغدار	متر مکعب	2234	120
3	سنگ کاری با مصاله نسبت 1:4 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	1646.1	120
4	سنگ کاری خشکه مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	23	2
5	هنگاف کاری با مصاله نسبت 1:3	متر مربع	1431.4	90
6	کانگریت سیخ دار (RCC) با قالب بندی مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	1.4	2
7	کانگریت بدون سیخ (PCC) با قالب بندی مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	48	60
8	پرکاری عقب بیوارها توسط مواد کندن کاری شده مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	731	90
9	تخالیه کردن آب از تهداب به اساس ضرورت در اسنای کارکردن	LS	1	
10	پاک کاری ساخه			7

انجینیر سالار (اکبر) :

عبدالرحمن انجنير دیزاین :

محمد زمان انچنبر او رد:

انجیر سارا

-3

~~03~~ 07 1397



د افغانستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  
*Islamic Republic of Afghanistan*  
*Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*




معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

آمریت انجیری

لست تجهیزات ساختمانی و پرسونل کلیدی پروژه (دیوار محافظوی کانال شهیدان) واقع: ولسوالی فرغه بی ولایت لغمان

شماره	تجهیزات	نوعیت تجهیزات	تعداد	ملاحظات
<b>بخش ماشینری</b>				
1	اسکواتور		1	
2	گریدر		1	
3	جیکبر		1	
4	بلدوزر		1	
5	ترک		2	
6	کامپرسور		0	
7	کانکریت میکسر		2	
8	جنراتور		1	
9	واپراتور		1	
10	واترپمپ		1	
<b>لست پرسونل کلیدی پروژه</b>				
11	منیجر پروژه		1	
12	انجینیر ساحه		1	
13	انجینیر سروی		1	



جمهوری اسلامی افغانستان  
شرطنامه معیاری تدارک امور ساختمانی کوچک  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  
ریاست تهییه و تدارکات

پروژه اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان  
آدرس اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه، چهارراهی کارتہ سخی کابل، افغانستان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/127/98

تعداد بخش ها (*LOTS*): ندارد  
کودبودجوى : AFG #: 390676

تاریخ صدور: 1398/03/04

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان  
MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

محتويات

مقدمه

قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان

قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی

قسمت سوم: فормه های داوطلبی

قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد

قسمت ششم: مشخصات

قسمت هفتم: نقشه ها

قسمت هشتم: بل احجام کاری

قسمت نهم: فرمه های قرارداد و تصمینات

- اعمار دیوار محافظتی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغمان  
MAIL/PD/NCB/W/127/98



۱۷۵۹

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی

### مقدمه

این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی طبق استناد مشابه معیاری داولطلبی مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک که قیمت تخمینی تدارکات الی (500) میلیون افغانی بوده و با استفاده از وجوده عامه<sup>۱</sup> تمویل می گردند در روش های تدارکات داولطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد.

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد.

با اتفاق این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجنباس منضمۀ متحدالمال شماره PPU/C024/1388 صادرۀ واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد.

ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء ۲ ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل می گردند از اسناد معیاری داولطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند.

نقل این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

اداره تدارکات ملی

ریاست پالیسی تدارکات

قصر مرمرین، کابل، افغانستان

[www.npa.gov.af](http://www.npa.gov.af)

<sup>۱</sup> وجوده عامه عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در ماده هشتم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوده بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات بولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.

۳۷۵

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

قسمت اول: دستورالعمل برای داوطلبان

الف. عمومیات	
1.1 اداره این شرطنامه را به منظور تدارک امور ساختمانی مندرج صفحه معلومات داوطلبی و قسمت ۵ (شرایط خاص قرارداد) صادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش های این داوطلبی به شمول نام و نمبر تشخیصیه هر بخش (Lot) و نوع قرارداد در صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد درج می گردد.	ماده ۱- ساحه داوطلبی
1.2 داوطلب برنده امور ساختمانی را به تاریخ مندرج صفحه معلومات داوطلبی و مندرجات شرایط خاص قرارداد تکمیل می نماید.	
1.3 در این شرطنامه:	
1- اصطلاح "کسی" به معنی انجام ارتباطات طور تحریری مانند فکس، ایمیل و تلکس همراه با استناد دریافتی توسط طرف مقابل می باشد؛	ماده 2- وجوده
2- در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛	
3- "روز" به معنی روز تقویمی می باشد.	
2.1 اداره، وجود کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل پیشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجود مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد امور ساختمانی که این شرطنامه به منظور آن صادر گردیده است به کار می گیرد.	ماده 2- وجوده
2.2 وجود عامله عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در ماده هشتم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوى و همچنان سایر وجود بودجوى به شمول کمک ها و قرضه های که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.	ماده 3- فساد و تقلب
3.1 اداره، داوطلب، اكمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:	
1- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.	
2- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.	
3- تبایی: عبارت از شناسنایی میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قرارداد نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.	
4- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قرارداد نامال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.	
5- ایجاد اخلاقی و موافع: عبارت از تحریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان	

۷۵

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی

	<p>تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.</p> <p>3.2 اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برندۀ که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتكب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخال و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می نماید.</p> <p>3.3 اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربطری ارجاع می نماید.</p> <p>3.4 اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.</p> <p>3.5 داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تغییش و بررسی حسابات، یادداشت‌ها و سایراستناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مقتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.</p>	
ماده 4 - داوطلب واجد شرایط	<p>1. داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعایت محدودیت‌های مندرج صفحه معلومات داوطلبی داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد.</p> <p>2. داوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد، داوطلب با یک یا بیشتر جوانب این داوطلبی تضاد منافع دارد اگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا طرف که طرح، مشخصات و سایر اسناد مربوط این تدارکات را ترتیب نموده و یا با شخص که منحیث مدیر پروژه تحت این داوطلبی پیشنهاد شده باشد ارتباط داشته باشد. داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واحد شرایط پنداشته می شود. شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و نظارت امور ساختمانی گردیده و همچنین شرکت‌های متعلق به آن در این داوطلبی غیر واحد شرایط پنداشته می شوند.</p> <p>3. اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده و تحت محرومیت از وب سایت اداره تدارکات ملی قبل دریافت می باشد.</p> <p>4. داوطلب مکلف است شواهد و مدارک ثبتی اهلیت خویش را مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی ارائه نماید.</p>	
ماده 5 - اهلیت داوطلب	<p>5.1 تمام داوطلبان شرح اولیه شیوه کاری پیشنهادی و جدول امور ساختمانی بشمول نقشه‌ها و چارت‌های مورد نیاز را در قسمت ۳ فرم‌های داوطلبی، ارائه می نمایند.</p> <p>5.2 در صورت انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، عقد قرارداد صرف با داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت صورت می گیرد. داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت معلومات تجدید شده در مورد اهلیت خویش و یا استمرار اهلیت ارزیابی شده را در روز تسلیمی آفر ارائه می نمایند. تجدید یا تأیید استمرار اهلیت در قسمت ۳ درجه میگردد.</p> <p>5.3 در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را بر علاوه اسناد مندرج اجزای ۳، ۴، ۵ و ۶ فقره (۲) حکم هفدهم طرز العمل تدارکات شامل قسمت ۳ می</p>	

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

نمایند. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد:

- 1- نقل اصلی اسناد که نشان دهنده وضیعت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجاری و نوع فعالیت داوطلب باشد؛
- 2- صلاحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛
- 3- ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در 5 سال گذشته؛
- 4- تجربه کاری با ماهیت و اندازه مشابه در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می‌توان برای معلومات بیشتر با وی تماس گرفت.
- 5- اقلام عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛
- 6- اهلیت و تجارب کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل تخصصی که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده می‌شود؛
- 7- گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش یا بیانیه مفاد و ضرر یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی در (5) سال گذشته؛
- 8- مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای این قرارداد (دسترسی به اعتبارات (قرضه) و سایر منابع مالی قابل دسترس)، که بدون شمولیت پیش برداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بستر از سایر تعهدات مالی داوطلب برای سایر قراردادها و آفرهای ارائه شده باشد.
- 9- معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا اختتام یافته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد.
- 10- معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی

5.4 در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی، طور دیگر تذکر رفته باشد:

- 1- آفر شامل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 این دستورالعمل برای هر شریک مشترک باشد؛
- 2- آفر، پنطوزور، الرازیث قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛
- 3- تمامی تصویر مشترک مسؤول تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می‌باشد؛
- 4- یکی از شرکا متعیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤول قبول مسؤولیت‌ها و پذیرش رهنمودها به نمایندگی از سایر شرکا می‌باشد؛
- 5- اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت می‌گیرد؛
- 6- نقل موافقنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است.

5.5 جهت واجد شرایط شناخته شدن برای اعطای قرارداد، داوطلب باید معیارهای اهلیت ذیل را دارا

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لعمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

۷۱۸

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

<p>باشد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد:</p> <p>1- حجم معاملات در سکتور ساختمانی در خلال مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛</p> <p>2- تجربه منحیت قراردادی اصلی در امور ساختمانی در حد اقل تعداد قرارداد های ساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در میعاد مندرج صفحه معلومات داوطلبی (بمنظور مطابقت با این معیار داوطلب باید حد اقل (70) فیصد امور ساختمانی را تکمیل نموده باشد) قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از (10) فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیت تجربه مد نظر گرفته شود؛</p> <p>3- یک پلان دسترسی (مالکیت و اجاره) به موقع تجهیزات مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛</p> <p>4- داشتن یک مدیر قرارداد با (5) سال تجربه کاری در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمول حد اقل (3) سال تجربه کاری منحیت مدیر؛</p> <p>5- دارایی های سیال و یا انواع اعتبارات (قرضه) که کمتر از مبلغ تذکر رفته در صفحه معلومات داوطلبی نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون شمولیت پیش برداخت قابل اجرا تحت این قرارداد باشد؛</p> <p>استمرار دعاوی یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته منجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلب شده می تواند.</p>	<p>5.6 برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز 1 بند 5 ماده 5 این دستورالعمل، ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا 100 فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حد اقل (25) فیصد و شریک اصلی حد اقل (40) فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد.</p>	<p>6.1 هر گاه داوطلب بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریک باشد منجر به رد تمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیت قراردادی فرعی و آفر بدیل در صورتیکه مجاز باشد پذیر این امر مستثنی است.</p>	<p>6- هر داوطلب یک آفر</p>
<p>7.1 داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم تموده و اداره مسؤولیت چنین مصارف را ندارد.</p>	<p>7- مصارف داوطلبی</p>	<p>8.1 داوطلب می تواند با قبول مسئولیت و خطرات مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده و معلومات لازم جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد امور ساختمانی را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب می باشد.</p>	<p>8- بازدید از ساحه</p>

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

ب. شرطنامه	
ماده ۹- مندرجات شرطنامه	<p>9.1 این شرطنامه شامل قسمت های ذیل و ضمایم صادره مطابق ماده ۱۱ این دستورالعمل می باشد:</p> <p>قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان</p> <p>قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی</p> <p>قسمت سوم: فرم های داوطلبی</p> <p>قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد</p> <p>قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد</p> <p>قسمت ششم: مشخصات</p> <p>قسمت هفتم: نقشه ها</p> <p>قسمت هشتم: بل احجام کاری<sup>۲</sup></p> <p>قسمت نهم: فرم های قرارداد و تصمیمات</p>
ماده ۱۰- توضیح شرطنامه	<p>10.1 داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبی مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حداقل (۷) روز در داوطلبی باز و (۴) روز در داوطلبی مقید قبل از میعاد تسليمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره در خلال مدت (۳) روز کاری در داوطلبی باز و (۲) روز کاری در داوطلبی مقید توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منع درخواست ارسال میگردد.</p> <p>10.2 به منظور توضیح و جواب به سوالات پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکر شده باشد اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در صفحه معلومات داوطلبی، دعوت نماید.</p> <p>10.3 از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری قبل از تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسليم نماید.</p> <p>10.4 گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سوالات و جوابات ارائه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده بعد از جلسه، درمدت بحد اکثر (۴) روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد. هر گونه تعدیل شرطنامه در پیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده ۱۱ این دستورالعمل <del>ضروری</del> میگردد.</p>
ماده ۱۱- تعديل شرطنامه	<p>11.1 اداره میتواند، در طول میعاد تسليمی آفرها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعديل نماید.</p> <p>11.2 ضمایم صادره جزء شرطنامه مختصوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده</p>

در قرارداد های بال المقاطع، بل احجام کاری<sup>۱</sup> چندفراز و جدول فعالیت درج گردد.  
اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لعمن

MAIL/PD/NCB/W/127/98

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی**

<p>11.3 اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با بند 2 ماده 21 این دستورالعمل تمدید نماید.</p>	ج. تهیه آفر ها
<p>12.1 تمام اسناد مربوط آفر به زبان که در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده ترتیب میگردد.</p>	ماده 12 - زبان آفر
<p>13.1 آفر ارائه شده شامل اسناد ذیل می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- تضمین آفر در مطابقت با ماده 17 این دستورالعمل؛</li> <li>2- بل احجام کاری<sup>4</sup> قیمت گذاری شده؛</li> <li>3- فورمه آفر داوطلبی؛</li> <li>4- اسناد و فورم معلومات اهلیت؛</li> <li>5- آفر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛ و</li> <li>6- سایر مواد مطالبه شده در صفحه معلومات داوطلبی.</li> </ul>	ماده 13 - اسناد شامل آفر
<p>14.1 قرارداد برای تمام امور ساختمانی مندرج بند 1 ماده 1 این دستورالعمل به اساس بل احجام کاری ارائه شده که توسط داوطلب ارائه می گردد می باشد.</p>	ماده 14 - قیم آفر
<p>14.2 داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقلام امور ساختمانی مندرج بل احجام کاری را ارائه نماید. اقلام که برای آنها نرخ و قیمت ارائه نشده باشد، قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده محسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقلامی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از (10) فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیر جوابگو محسوب میگردد. در صورت تصحیح، اغلاط خط زده شده، تصحیح شده امضا و تاریخ تصحیح درج گردد.</p>	
<p>14.3 تمام محصولات قابل پرداخت، مالیات، بشمول مالیات بر معاملات انتفاعی<sup>4</sup> (BRT) و سایر مکلفیت های مالی قابل پرداخت تحت این قرارداد 28 روز قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر، در قیمت ها، نرخ ها و قیمت مجموعی آفر شاپل گردد.</p>	
<p>14.4 در صورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد و احکام ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نرخ ها و قیمت های آفر در جریان اجرای قرارداد قابل تعديل میباشند. داوطلب معلومات لازم مندرج ماده 47 شرایط عمومی و خاص قرارداد را توان با آفر خویش ارائه می نماید.</p>	

<sup>4</sup> Business Receipt Tax

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>15.1 داوطلب باید نرخ فی واحد و قیمت های مندرج آفر<sup>۵</sup> را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طوری دیگر تذکر رفته باشد.</p> <p>15.2 منبع نرخ تبادله، نرخ فروش د افغانستان بانک در روز مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد.</p> <p>15.3 داوطلب مکلف است جزئیات اسعار خارجی لازم را در آفر ارائه نماید.</p> <p>16.1 آفر باید به مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی اعتبار داشته باشد. این مدت در داوطلبی های ملی نمی تواند بیشتر از (90) روز بعد از ختم میعاد تسیلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار آفر بیشتر از 120 روز بوده نمی تواند.</p> <p>در حالات استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید نماید. تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد. در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تعییرات وارد نماید، حالات مندرج ماده 17 این دستورالعمل از این امر مستثنی است. در صورت رد درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می گردد. در صورت در جریان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد.</p> <p>17.1 داوطلب مکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را منحیث جزء آفر خود تهیه نماید. آفر بدون تضمین آفر غیر جوابگو پندashته شده، رد میگردد.</p> <p>17.2 مقدار تضمین آفر در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده و می تواند به واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل تبدیل مطابق صفحه معلومات داوطلبی ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- به شکل ضمانت بانکی و پول نقد ارایه گردد.</li> <li>2- داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. هر گاه نهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسلامی افغانستان موقعیت داشته باشد، باید نهاد مالی مشابه در داخل جمهوری اسلامی افغانستان اجرای تضمین آفر را ضمانت نماید.</li> <li>3- تضمین آفر باید کاملا در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج قسمت 9 (فورم های قرارداد و تضمینات) و یا فورم های دیگری که قبل از تسیلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد، ترتیب گردد.</li> </ul> <p><del>لایحه صورت تطبیق هدایت بند 5 ماده 17 این دستورالعمل، با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت قابل پرداخت باشد.</del></p> <p>5- نسخه اصلی آن تسیلیم داده شود. کاپی ها قابل قبول نخواهد بود.</p> <p>6- میعاد اعتبار تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند 2 ماده 16 این دستورالعمل، حد</p>	<p>ماده 15- اسعار آفر و پرداخت</p> <p>ماده 16- میعاد اعتبار آفرها</p> <p>ماده 17- تضمین آفر و اظهار نامه تضمین آفر</p>
---	--

که قرارداد های یا پرداخت بالمقابل "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تغییر نماید.  
اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

<p>اقل (28) روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد.</p>	
<p>17.3 در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند ۱ ماده ۱۷ این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردد.</p>	
<p>17.4 تضمین آفر داوطلبان غیر موفق بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، به آنان مسترد میگردد.</p>	
<p>17.5 در حالات ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱-در صورت تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد بند ۲ ماده ۱۶ این دستورالعمل؛</li> <li>۲-در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباها حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛</li> <li>۳-در صورت اجتناب داوطلب از پذیرش اشتباها محاسبی در آفر در مطابقت با بند ۲ ماده ۲۸ این دستورالعمل؛</li> <li>۴-اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خلال مدت معینه؛</li> <li>۵-عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد نوسط داوطلب برنده؛</li> <li>۶-در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی.</li> </ul>	
<p>17.6 در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.</p>	
<p>18.1 آفر های بدیل صرف در صورتی قبل قبول خواهد بود که در صفحه معلومات داوطلبی از قبولی آن تذکر رفته باشد در صورت قبولی آفر بدیل طبق احکام بند ۱ و ۲ ماده ۱۸ این دستورالعمل اجرآت صورت میگیرد و پذیرش یکی از گزینه های ذیل در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- داوطلب می تواند آفر های بدیل را با آفر اصلی تسلیم نموده و اداره صرف در صورت که آفر اصلی ارائه شده دارای نازلترين قیمت باشد، آفر بدیل را ملاحظه می نماید.</li> </ul> <p style="text-align: right;">یا</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۲- داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی تسلیم نماید که در این صورت آفر های اصلی و آفر های بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردد.</li> </ul>	<p style="text-align: right;">ماده 18- آفر های بدیل</p>
<p>18.2 آفر های بدیل تمام معلومات لازم بشمول محاسبه دیزاین، مشخصات تختیکی، جزئیات قیمت ها، شیوه پیشنهادی، اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب و دیگر جزئیات مربوط جهت ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمایند.</p>	<p style="text-align: right;">ماده 19- شکل و امضاء آفر</p>
<p>19.1 داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده ۱۳ این دستورالعمل ترتیب و با عالمه کلمه "اصل" عالمه گذاری نماید. بر علاوه کایی های آفر با کلمه "کایی" عالمه گذاری شده و به</p>	

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>تعداد مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردد. در صورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.</p> <p>19.2 اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب (رئیس، معاون یا نماینده با صلاحیت) در مطابقت با جزء 1 بند 3 ماده 5 این دستورالعمل امضا و مهر گردد. تمام صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا گردد.</p> <p>19.3 هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف در صورتی قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه آفر را امضا نموده یا نماینده با صلاحیت داوطلب امضا شده باشد.</p> <p>19.4 هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصلاح اشتباهات داوطلب باشد. که در این صورت اصلاح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا می گردد.</p>	<p>5. تسلیمی آفرها</p> <p>ماده 20- تسلیمی، مهر و علامت گذاری آفر</p> <p>20.1 داوطلب می تواند آفر خویش را شخصاً یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت تذکر آن در صفحه معلومات داوطلبی، امکان پذیر می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر الکترونیکی، داوطلب از روش متذکر صفحه معلومات داوطلبی پیروی می نماید. داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شنیده گذاشته و بالای آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنویسد.</p> <p>20.2 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به صفحه معلومات داوطلبی باشد؛</li> <li>2- حاوی نام، نمبر تشخیصیه داوطلبی متذکر صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد باشد.</li> <li>3- حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور العمل.</li> </ul> <p>20.3 بر علاوه نیاز تشخیصیه مندرج بند 2 ماده 20 دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب باشد تا در صورت اعلام آفر نا وقت رسیده، آفر باز نشده مسترد گردد.</p> <p>20.4 هر صورتیکه پاکت بسته و علامه گذاری نشده باشد، اداره مسؤولیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب العجل را تندارد.</p> <p>ماده 21- معاد تسلیمی آفرها</p> <p>آنچه آفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج صفحه معلومات داوطلبی به آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردد.</p>
--	---

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

21.2 اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعديل طبق ماده 11 دستورالعمل برای داوطلبان، میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت تمامی حقوق و مکلفیت های اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.	
22.1 آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردد.	ماده 22- آفر های نا وقت رسیده
23.1 داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطلاعیه کتبی که توسط نماینده با صلاحیت داوطلب امضاء شده باشد و کایی صلاحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعديل و یا از آن انصراف نماید. اطلاعیه کتبی توان با آفر های تعویض، انصراف یا تعديل شده بوده و این اطلاعیه باید:	ماده 23- انصراف، تعویض و تعديل آفرها
1- در مطابقت با مواد 19 و 20 این دستورالعمل ارسال گردیده، بر علاوه پاکت های مربوط نیز با کلمات "انصراف"، "تعویض" یا "تعديل" نشانی شده باشد. 2- قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.	
23.2 تعویض یا تعديل آفر ها بعد از ضرب الاجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.	
23.3 هرگونه انصراف، تعویض و تعديل آفر ها در فاصله زمانی میان ضرب الاجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 17 دستورالعمل برای داوطلبی میگردد.	
23.4 داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی یا در اثر تعديل در مطابقت با این ماده دستورالعمل پیشنهاد می نماید.	
24.1 اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعديلات مطابق ماده 23 این دستورالعمل در محضر عام در محل، تاریخ و زمان که در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در صفحه معلومات داوطلبی درج گردد.	ماده 24- آفر گشایی و ارزیابی
24.2 در پیجلس آفر گشایی، رئیس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبیل آن، ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطلاعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند، را اعلام و بدون باز اظهار نامه تضمین آفر گشایی می نماید.	
24.3 از آنکه آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب، قیمت آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل (در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل)، هر گونه تخفیف، انصراف، تعویض، تعديل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند	

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

۱۶۱

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>قرائت می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 1 ماده 22 این دستور العمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مطابق ماده 23 این دستور العمل برای ارزیابی بیشتر مدنظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.</p>	
<p>24.4 اداره رویداد جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند 3 ماده 24 این دستور العمل تهیه می نماید.</p>	
<p>24.5 هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء و بمنظور مصوّبیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسب شفاف (اسکاشتیپ) می نماید.</p>	
<p>24.6 در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت خویش را چسب شفاف (شکاستیپ) ننموده باشند، هیئت آفر گشایی مکلف است آنها را نیز چسب شفاف (شکاستیپ) نماید.</p>	
<p>25.1 معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد الى زمان نشر اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 4 ماده 34 این دستور العمل محرم بوده، نباید افسه گردد. هر نوع تلاش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد. علی الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشایی الى عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر مورد مربوط به مراحل داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.</p>	ماده 25- محرومیت
<p>26.1 اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشكل کتبی مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباہات محاسبی را قبول نماید. هر نوع توضیح ارائه شده بدون درخواست اداره، قابل قبول نمی باشد.</p>	ماده 26- توضیح آفر ها
<p>27.1 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- معیارات واجد شرایط مطابق ماده 4 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛</li> <li>2- بطور مناسب امضاء گردیده است؛</li> <li>3- دارای تضمین آفر می باشد؛ و</li> <li>4- جوابگوی معیارات و شرایط شرطنامه می باشد.</li> </ul>	ماده 27- ارزیابی و تشخیص جوابگوی آفر ها
<p>27.2 آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمدۀ مطابق با معیارات، شرایط و مشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمدۀ پنداشته می شود که:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- نیازی نباشد قابل ملاحظه بالای حدود، کیفیت یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛</li> <li>2- نیازی نباشد با اسناد داوطلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داوطلب تحت این قرار داد را برخلاف شرطنامه محدود نماید؛</li> </ul>	

اعمار دیوار محافظتی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی**

<p>3- در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رفاقتی سایر داوطلبان گردد.</p> <p>27.3 آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و بعداً با اصلاح انحرافات، استثنائی یا قلم افتادگی جوابگو نمیگردد.</p> <p>27.4 هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترين نرخ یا با سایر داوطلبان صورت گرفته نمی تواند.</p> <p>27.5 داوطلب مسؤولیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در شرطنامه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تغییر قیمت یا تعديل آفر صورت گیرد.</p> <p>28.1 اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش از ارزیابی مالی جهت تصحیح اشتباها حسابی بررسی می نماید. تصحیح اشتباها محاسبه ای به شکل ذیل صورت میگیرد:</p> <p>1- هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود.</p> <p>2- در صورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد. مگر اینکه ازنظر اداره به صورت واضح کدام علامه اعشاری در قیمت فی واحد بینجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصلاح می گردد؛</p> <p>28.2 هرگاه داوطلب تصحیح اشتباها محاسبه آفر خویش را قبول نکند، آفر وی رد و تضمین آفر وی غیر قابل استداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 2 بند 5 ماده 17 این دستور العمل اجرا می گردد.</p> <p>29.1 آفر ها به واحد پولی افعانی مطابق بند 1 ماده 15 این دستور العمل ارزیابی میگردد، در صورتیکه، داوطلب نرخ مبادله دیگری را استفاده نموده باشد نخست قیمت آفر به واحد پولی افعانی با استفاده از نرخ مبادله مشخص شده مندرج آفر تبدیل و ارزیابی آفر ها صورت میگردد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر ذکر گردیده باشد.</p> <p>30.1 اداره آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تختنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تختنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد. هیئت ارزیابی می تواند پرسوه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلت ارزیابی شده را مورد ارزیابی تختنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.</p> <p>30.1 اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر را طور ذیل تعیین می نماید:</p> <p>1- تصحیح اشتباها محاسبه ای مطابق ماده 28 این دستور العمل؛</p>	<p><b>ماده 28 - تصحیح اشتباها</b></p> <p><b>ماده 29- اشعار در ارزیابی آفر</b></p> <p><b>ماده 30- ارزیابی و مقایسه آفر ها</b></p>
--	--

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>2- منهای هر گونه وجه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که بصورت رقابتی قیمت گذاری شده اند؛</p> <p>3- تطبیق یک تعديل مناسب برای هر گونه تفاوت‌ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود معقول قبلاً تعیین شده یا پیشنهادهای بدیل در مطابقت به ماده 18 این دستور العمل؛</p> <p>4- تطبیق تعديلات مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند 5 ماده 23 این دستور العمل؛</p>	
<p>30.2 حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می‌باشد. تفاوت‌ها، انحرافات و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره گردد، در ارزیابی مدنظر گرفته نمی‌شود.</p>	
<p>30.3 در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعديل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، مدنظر گرفته نمی‌شود.</p>	
<p>30.4 در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش هزینه ترکیب تمام بخش‌ها تطبیق می‌نماید.</p>	
<p>31.1 ترجیح تدارکات از منابع داخلی در روشنی حکم چهارم طرز العمل تدارکات تطبیق می‌گردد.</p>	ماده 31- ترجیح داخلی
<b>واعطاء قرارداد</b>	
<p>32.1 اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترين قیمت ارزیابی شده را ارایه نموده، اعطاء می‌نماید.</p>	ماده 32- معیارات اعطاء قرارداد
<p>33.1 علی الرغم ماده 32 این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفرها را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤولیت به داوطلب متأثر شده یا داوطلبان دارا می‌باشد مشروط بر اینکه دلایل رد آفرها یا فسخ مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور رسمی به اطلاع داوطلبان رسانیده شود.</p>	ماده 33- حق قبول هر آفر و رد یک یا تمام آفر ها
<p>34.1 اداره بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مینماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری آن کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می‌شود. اداره نامه قبولی را بعد از قبول آفر، پیش از تعیین میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می‌نماید. این نامه بیان کننده قیمت قرارداد مبوده که بود از اجرا، تکمیل، و مراقبت امور ساختمانی به قراردادی پرداخت میگردد.</p>	ماده 34- اطلاعیه اعطای و امضای موافقتنامه قرارداد
<p>34.2 اداره، قرارداد پیمان مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطای در طی میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می‌نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت (10) روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید.</p>	

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

<p>34.3 اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در وب سایت خویش، ویب سایت اداره تدارکات ملی و سایر ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، نشر می نماید:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛</li> <li>2- قیمت های خوانده شده در آفر گشایی؛</li> <li>3- نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛</li> <li>4- نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دلایل رد آن؛</li> <li>5- نام داوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خلاصه حدود قرارداد اعطا شده.</li> </ol>	
<p>34.4 بعد از نشر اطلاعیه عقد قرارداد، در صورتیکه داوطلبان غیر موفق دلایل عدم موفقیت آفر خویش را بصورت کتبی از اداره مطالبه نمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر دلایل عدم انتخاب آفر ارائه می نماید.</p>	
<p>35.1 داوطلب برنده مکلف است، در خلال مدت (10) روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فرم تضمین اجرا که شامل قسمت 8 (فورمه های قرارداد) یا سایر اشکال قابل قبول به اداره باشد به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده شده است، ارایه نماید.</p>	<p>ماده 35- تضمین اجراء</p>
<p>35.2 در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم در جمهوری اسلامی افغانستان یا بانک خارجی قبل قبول اداره که نمایندگی بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.</p>	
<p>35.3 در صورتیکه داوطلب برنده نتواند شرط بند 1 ماده 35 و بند 3 ماده 34 این دستور العمل را برآورده سازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد نمیگردد.</p>	
<p>35.4 اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کنی اطلاع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.</p>	
<p>36.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در شرایط عمومی قرارداد از آن تذکر رفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج صفحه معلومات داوطلبی باشد. فورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در فورمه های قرارداد و تضمین قسمت 9 این شرطنامه می باشد.</p>	<p>ماده 36- پیش پرداخت و تضمین پیش پرداخت</p>
<p>37.1 مرجع حل و فصل مذاکرات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد.</p>	<p>ماده 37- مرجع حل و فصل مذاکرات</p>
<p>38.1 هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرز العمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا شکایت داوطلبان</p>	<p>ماده 38- حق شکایت داوطلبان</p>

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

۳۴۳۷

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

گردد، می‌تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به کمیته بررسی اداری که محل و آدرس آن در صفحه معلومات داولی مشخص گردیده، ارسال نماید.	
---	--

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی فرغه بی ولایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

15

قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی

تعدیلات، ضمایم و ماده ها در دستورالعمل برای داوطلبان	
الف. عمومیات	
اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می باشد.	ماده 1 دستورالعمل برای داوطلبان
نام و شماره این داوطلبی اعمار دیوار محافظه کanal شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان می باشد.	
شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/127/98 نام و شماره بخش های شامل این داوطلبی عبارتند از: شامل بخش ها نیست.	
امور ساختمانی: می باشد.	
نوع قرارداد: قرارداد بالمقطع میباشد.	
تاریخ تکمیلی امور ساختمان از شروع کار 6 ماه تقویمی می باشد.	ماده 1.2 دستورالعمل برای داوطلبان
نام اداره تدارکاتی در بند 1 ماده 1 دستورالعمل برای داوطلبان درج گردیده است. پروژه اعمار دیوار محافظه کanal شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان می باشد.	ماده 1.1 دستورالعمل برای داوطلبان
داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند: <b>قابل تطبیق نیستند:</b>	ماده 4.1 دستورالعمل برای داوطلبان
لست شرکت های <b>محروم شده</b> و تحت پرسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد: {www.npa.gov.af}	ماده 4.3 دستورالعمل برای داوطلبان
در صورت تعديل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 دستورالعمل برای داوطلبان: قابل تعديل نیست	ماده 5.3 دستورالعمل برای داوطلبان
1- (نقل اصلی استناد که نشان دهنده وضعیت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجاری و نوع فعالیت داوطلب باشد؛ 2- صلاحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛	

6 در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد.

اعمار دیوار محافظه کanal شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

<p>3- ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در ۵ سال گذشته؛</p> <p>4- تجربه کاری با ماهیت و اندازه مشابه در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می‌توان برای معلومات بیشتر با وی تماس گرفت.</p> <p>5- اقلام عمدۀ تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛</p> <p>6- اهلیت و تجارب کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل تخصصی که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده می‌شود؛</p> <p>7- گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش یا بیانیه مفاد و ضرر یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی در (۵) سال گذشته؛</p> <p>8- مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای این قرارداد (دسترسی به اعتبارات (قرضه) و سایر منابع مالی قابل دسترس)، که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدادات مالی داوطلب برای سایر قراردادها و آفرهای ارائه شده باشد.</p> <p>9- معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا اختتام یافته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوا، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد.</p> <p><b>10- معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی )</b></p>	<p>ماده ۵.۳<sup>۷</sup> جزء 10 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>فیصدی مجاز و اکاری به قراردادی فرعی: قراردادی می‌تواند ای 20 فیصد قیمت مجموعی قرارداد به قراردادی فرعی واکنار نماید.</p>	<p>ماده 5.4 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>11- در صورت ورود تعديل در اهلیت لازم مطالبه شده از داوطلبان که مندرج بند 4 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان میباشد:</p> <p>12- آفر شامل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 این دستور العمل برای هر شریک مشترک باشد؛</p> <p>13- آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛</p> <p>14- تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤول تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛</p> <p>15- یکی از شرکا متحبّث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤول قبول مسؤولیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛</p> <p>16- اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد</p>	<p>ماده 5.4 دستورالعمل برای داوطلبان</p>

7 اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم پکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می‌گیرد.  
اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>17- نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است</p> <p>18- مجموع ارقام اهلیت شرکا 100 فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حداقل 25 فیصد و شریک اصلی حداقل 40 فیصد معیارهای اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می‌گردد</p> <p>19- تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.</p>			
در صورت تعديل معیارات اهلیت مندرج بند 5 ماده 5 دستورالعمل برای داوطلبان: قابل تعديل نمی باشد	ماده 5.5 دستورالعمل برای داوطلبان		
حداقل لازم حجم معاملات امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در یکی از پنج سال اخیر قابل تطبیق نمی باشد.	ماده 5.5 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان		
حداقل لازم تجربه مشابه منحیث قراردادی اصلی در امور ساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (5) سال اخیر حداقل یک یا دو پروژه مشابه به قابل تطبیق نمی باشد.	ماده 5.5 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان		
تجهیزات ضروری که توسط داوطلب تهیه میگردد طور ذیل می باشد.	ماده 5.5 جزء 3 دستورالعمل برای داوطلبان		
تعداد	واحد	تجهیزات	شماره
1	عراده	اسکوواتور	1
1	عراده	گریدر	2
1	پایه	جیکمبر	3
1	عراده	بلدوزر	4
2	پایه	ترک	5
0	پایه	کامپرسور	6
2	پایه	کانکریت میکسر	7
1	پایه	جنراتور	8
1	عراده	وایبراتور	9
1	عراده	واترپمپ	10

اumar دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>نوت: در صورت تجهیزات فوق الذکر ملکیت شخصی شرکت باشد اسناد خریداری و در صورت کرایه گیری قرار داد کرایه گیری که در آن: آدرس، آدرس الکترونیکی شماره تماس شرکت کرایه دهنده را توأم با آفر خویش ارایه نماید.</p>													
<p>داشتن یک مدیر پروژه با (5) سال تجربه کاری در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمول حداقل (3) سال تجربه کاری منحیت مدیر پروژه، انجینیر ساحه و انجینیر سروی باداشتن حداقل سه سال تجربه کاری.</p>	<p>ماده 5.5 جزء 4 دستورالعمل برای داوطلبان</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%; text-align: center;">1</td><td style="width: 25%; text-align: center;">منیجر پروژه</td><td style="width: 25%; text-align: center;">1</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">انجینیر ساحه</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr> <td></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">انجینیر سروی</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>		1	منیجر پروژه	1		1	انجینیر ساحه	2		1	انجینیر سروی	3
	1	منیجر پروژه	1										
	1	انجینیر ساحه	2										
	1	انجینیر سروی	3										
<p>مبلغ حداقل دارایی های سیال (نقدی) یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب 950,000 نهصد و پنجماهزار افغانی از تاریخ نشر اعلان الی روز آفر گشای در یکی از تاریخ ها در صورت حساب بانکی شرکت (ستمنت بانکی ارائه نماید.</p>	<p>ماده 5.5 جزء 5 دستورالعمل برای داوطلبان</p>												
<p>ب. مندرجات شرطنامه</p>													
<p>جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد:</p> <p><b>توجه: محمد الله "ساحل"</b>  <b>رئیس تهیه و تدارکات</b>          آدرس: ریاست تهیه و تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری - جمال مینه چهارراهی کارتہ سخی، کابل - افغانستان          مبایل: 0766647451  <u>Mohammdullah.sahil@mail.gov.af</u>          کلپی به:          میر محمد مونس "حسینی"          آمر تدارکات امور ساختمانی          ایمیل آدرس: <u>monis.hossaini@mail.gov.af</u>          مبایل: 0782024444</p>	<p>ماده 10.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>												
<p>نوت: طبق حکم 30 طرز العمل تدارکات، داوطلبان می توانند 10 روز تقویمی قبل از تسليمی</p>													

در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد.  
 اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی فرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

افرها، توضیحات خوش را طور کتبی ارائه کنند.	
جلسه قبل از داوطلبی: ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 1398/03/13 جلسه قبل از داوطلبی در اتاق جلسات آفر گشایی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت برگزار میگردد.	ماده 10.2 دستورالعمل برای داوطلبان
ج. تهیه آفرها	
آفر به یکی از زبان های دری یا پشتو ارائه میگردد.	ماده 12.1 دستورالعمل برای داوطلبان
داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارائه نماید:  (1) آفردر فورمه ایکه در قسمت سوم نشان داده شده است؛ (2) تضمین آفر، یا اظهارنامه تضمین آفر، در مطابقت با ماده 10 دستورالعمل برای داوطلبان، درصورت لزوم؛ (3) بیل قیمت گذاری شده احجام کار (4) فورمه ظرفیت کاری و اسناد؛ (5) فورمه معلومات اهلیت داوطلبان (6) جواز با اعتبار شرکت ساختمانی، توانایی مالی، احجام کاری، و هرنوع معلومات و مواد دیگری که لازم است توسط داوطلبان تکمیل، بطور دقیق خانه پری، بعد از مهر و امضاء در اوراق متنکره ارائه گردد. (7) تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحلال قرار نداشته. (8) تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع (9) تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی عدم محکومیت بالآخر تخلف در تجارت در خلال دو سال قبل از اشتراک داوطلبی. (10) تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موضوع و یا ویکی از کارمندان و مدیران مربوط و مطابق ماده 49 قانون تدارکات از داوطلبی محروم نگردیده است.	ماده 13 جزء 6 دستورالعمل برای داوطلبان
قیمت قرارداد قابل تعديل نیست.	ماده 14.4 دستورالعمل برای داوطلبان
اسعار واحد پول افغانی می باشد.	ماده 15.1 دستورالعمل برای داوطلبان
منبع نرخ تبادله اسعار /نرخ فروش داغستان بانک در روز آفر گشایی/ می باشد.	ماده 15.2 دستورالعمل برای داوطلبان
میعاد اعتبار آفر 90 نود روز می باشد.	ماده 16.1 دستورالعمل برای داوطلبان

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

<p>آفر شامل "تضمين آفر با استفاده از فورمه تضمين آفر شامل قسمت 9 فورمه های قرارداد و تضمینات صادر شده باشد". مبلغ تضمين آفر مبلغ 140,000 يك صد و چهل هزار افغانی به صورت ضمانت بانکی) می باشد.</p> <p>ضمانت بانکی باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد، یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبار می باشد.</p> <p><b>نوت :</b> تضمين آفر در نسخه اصلی تسليم داده شود، کاپی و سکن آن قابل قبول نیست.</p>	<p>ماده 17.2 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>آفر های بدیل "قابل قبول نیست".</p>	<p>ماده 18.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>تعداد کاپی های آفر که تسليم میگردد یک اصل کامل میباشد.</p>	<p>ماده 19.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p><b>ج. تسليمی آفرها</b></p>	
<p>ارائه آفرها بصورت الکترونیکی و پستی "قابل قبول نیست"</p>	<p>ماده 20.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>صرف به مقاصد ارائه آفر، آدرس اداره عبارت است از: تعمیر عقب منباع بشری، منزل دوم، اتاق جلسات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه کارتنه سخی، کابل، افغانستان</p>	<p>ماده 20.2 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>نام و نمبر تشخیصیه قرارداد در ماده 1.1 دستورالعمل برای داوطلبان در صفحه معلومات داوطلبی فوق ذکر شده است.</p>	<p>ماده 20.2 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>پاکت آفر حاوی هشدار اینکه قبل از ساعت 00:2 بعد از ظهر مورخ 25 جوزا سال 1398 باز نگردد.</p>	<p>ماده 20.2 جزء 3 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>ضرب الاجل برای تسليمی آفرها: ساعت 01:45 بعد از ظهر ، مورخ 25 جوزا سال 1398 می باشد. در صورتیکه این روز رخصتی عمومی بوده و یا رخصتی عمومی اعلام شود، ضرب الاجل برای تسليمی آفرها روز بعد در همین ساعت خواهد بود.</p>	<p>ماده 21.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

<p>داوطلبان می توانند قبل از ختم ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها با دادن یک اطلاعیه کتبی از آفرهای (اسناد داوطلبی) خود انصراف و یا آنرا تعویض و یا تعدیل نمایند.</p>	<p>ماده 23.3 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p><b>د. آفر گشایی و ارزیابی</b></p>	
<p>آفر گشایی در آدرس ذیل دایرخواهد شد:  <b>آدرس:</b> تعمیر عقب منباع بشری، منزل دوم، اتاق جلسات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه کارتنه سخی، کابل، افغانستان.  <b>تاریخ و زمان:</b> ساعت 20:00 بعد از ظهر 25 جوزا سال 1398 به وقت کابل در صورتیکه این روز رخصتی عمومی بوده و یا رخصتی عمومی اعلان شود، آفر گشایی روز بعد در همین ساعت تدویر میابد.</p>	<p>ماده 24.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>ترجیح تدارکات از منابع داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات تطبیق می گردد.          به تأسی از ماده هفتم قانون تدارکات، ادارات تدارکاتی مکاف اند، جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و تولیدات داخل، موارد حد اعظمی مقدار ترجیح تولیدات داخل را طور ذیل در پروسه های تدارکاتی خویش، عملی نمایند:          1. تولیدات داخلی در مقایسه تولیدات خارجی؛ (25) فیصد؛          2. شرکت های داخلی و شرکت های خارجی مقیم افغانستان در مقایسه شرکت های خارجی غیر مقیم (10) فیصد؛          3. شرکت های خارجی که شرکای داخلی (<i>Joint Venture</i>) دارند و یا متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می باشند، در مقایسه سایر شرکت های خارجی (5) فیصد          4. دواطیب داخلی زن در مقایسه با دواطیب داخلی و دواطیب خارجی مقیم افغانستان (5) فیصد</p>	<p>ماده 31.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p><b>هـ اعطای عقد قرارداد</b></p>	
<p>تضمين اجرای قابل قبول اداره، تضمین بانکی می باشد.          {تضمين بانکی مطابق قسمت 9 فورمه های قرارداد و غير مشروط می باشد. تضمین اجرا (5) فیصد قیمت قرارداد می باشد.</p>	<p>ماده 35.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>پیش پرداخت ( ۱۰ فیصد مجموع قیمت قرارداد) در بدل تضمین پیش پرداخت</p>	<p>ماده 36.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>اعتراضات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:  <b>محمد الله "ساحل"</b>  <b>رئیس تهیه و تدارکات</b>  <b>ریاست تهیه و تدارکات منزل اول، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه، چهارراهی کارتنه سخی</b>          در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خلال مدت (7) روز و یا عدم قناعت داوطلب معتبرض به پاسخ اداره، داوطلب می تواند درخواست های تجدید نظر را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد.</p>	<p>ماده 38.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

قسمت سوم: فورمه ها

فورمه های داوطلبی

عنوان فورمه شماره فورمه

فورمه تسليمی آفر

01/ فورمه امور ساختمانی کوچک

فورمه معلومات اهلیت داوطلب

02/ فورمه امور ساختمانی کوچک

فورمه نامه قبولی آفر

03/ فورمه امور ساختمانی کوچک

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی فرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

فورمه تسلیمی آفر

فورمه امور ساختمانی کوچک/01

داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر خویش تسلیم می نماید.

اداره / وزارت زراعت، آبیاری و مالداری /

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/127/98

عنوان تدارکات: اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهار مینماییم اینکه:

ما شرطنامه را دقیق مطالعه کردیم و هیچ ملاحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: /شماره و تاریخ صدور ضمیمه در صورت لزوم درج گردد/، نداشته و پیشنهاد اجرای /عنوان و نماینده شخصیه قرارداد درج گردد/ در مطابقت به شرایط عمومی قرارداد به

قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفيقات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از: /قیمت مجموعی آفر یه حروف و ارقام متنگر مبالغ مختلف و اسعارهای مربوطه درج گردد/ می باشد.

۱. تخفيقات پیشنهاد شده: در صورتیکه آفر ما قبول شود، تخفيقات ذیل قبل اجرا خواهد بود:

(1) قیمت مجموعی تخفيقات به حروف: .....

(2) قیمت مجموعی تخفيقات به ارقام: ..... /هر تخفیف پیشنهاد شده و اقلام مشخص شده میں احجام کار را که قابل اجرا است، مبالغ مختلف آن مشخص کنید/ :

ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ /مبلغ و تفصیلی بهتر قام و حروف درج گردد/ را منحیت پیش پرداخت درخواست می نماییم.

ما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترين قیمت ارائه شده و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست.

ما بدینوسیله تصدیق می داریم، که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد.

آفر ما برای میعاد مشخص در بند ۱ ماده ۱۶ دستورالعمل برای داوطلبان، سر از تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند ۱ ماده ۲۱ دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن بالای ما الزامي و قابل قبول بوده میتواند؛

هرگاه آفرما قبول شود، نماینده میباشد که تضمین اجراء را در مطابقت با بند ۱ ماده ۳۵ دستورالعمل برای داوطلبان ، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نماییم.

ما بشمول هر قراردادی فرعی: یا اكمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل برای داوطلبان می باشیم.

ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل برای داوطلبان، نداریم.

ما بشمول قراردادیان فرعی یا اكمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به بند های ۳ و ۴ ماده ۴ دستورالعمل برای داوطلبان، محروم شناخته نشده ایم.

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معياري تدارکات امور ساختماني کوچک - اداره تدارکات ملي

نام: (نام شخص درج گردید)

وظيفه: (وظيفه درج گردید)

امضاء:

تاریخ:

اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

フォرم معلومات اهلیت داوطلب

فورمه امور ساختمانی کوچک/02

این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده ۵ دستور العمل برای داوطلبان استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلب می تواند در جدول های موجود ردیف ها و ستون های اضافی علاوه و صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف معلومات تجدید شده را درج نماید.

I. داوطلب یا داوطلب مشترک (JV)

1.1 حالت حقوقی داوطلب: **{یک کلیه سند حالت حقوقی ضمیمه گردید}**

محل ثبت: **{محل ثبت درج گردید}**

آدرس تجاری: **{محل اصلی تجارت درج گردید}**

صلاحیت نامه امضا کننده آفر: **{یک کلیه صلاحیت نامه ضمیمه گردید}**

1.2 حجم معاملات ساختمانی اجرا شده در جریان **{تعداد مطابق به جزء ۱ بند ۵ ماده ۵ صفحه معلومات داوطلبی درج گردید}** سال گذشته، به مبلغ **{مبلغ به واحد پول اقتصادی درج گردید}** می باشد.

1.3 تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منجیث قراردادی اصلی در جریان **{تعداد مطابق به جزء ۲ بند ۵ ماده ۵ صفحه معلومات داوطلبی درج گردید}** سال گذشته: **{جدول زیر خانه پری گردید، در صورت لزوم ردیف خلاصه گردید}** می باشد.

ارزش مجموعی قرارداد	ن عیت امور ساختمان تکمیل شده و سال تکمیل آن	نام طرف قرارداد و شخص اثباتی	نام پرس و کشور
<b>{معلومات درج گردید}</b>	<b>{معلومات درج گردید}</b>	<b>{معلومات درج گردید}</b>	<b>{معلومات درج گردید}</b>

1.4 تجهیزات عمده پیشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان **{جهت تکمیل جدول ذیل به جزء ۳ بند ۵ ماده ۵ دستور العمل داوطلبان صریحه گردیده و تمام معلومات در حواست تله درج این جدول گردید. در صورت لزوم ردیف اضافی علاوه گردید}** می باشد.

شرط‌نامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

نام تجهیزات	تشریح تجهیزات بشمول (تاریخ ساخت و مدت کارایی)	حال تجهیزات (جدید، خوب، کهنه، و تعداد قابل دس رس)	ملکیت، کرایه، و یا خرید با ذکر طرف های مقابل کریه و خرید
{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

۱.۵ اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد / جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها در صورت ضرورت، تکمیل گردد. معلومات سیوگرافیک ضممه گردیده و نسخه جزء ۴ بند ۵ ماده ۵ دستور العمل برای داوطلبان و بند ۱ ماده ۹ شرایط عمومی قرارداد، مراجعته گردد، می باشد.

وظیفه	نام	تعداد سالهای تجربه کاری (عمومی)	سالهای تجربه کاری در این وظیفه
وظیفه	نام	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

۱.۶ قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط: / جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها در صورت ضرورت، و تبیز با مراجعته به ماده ۷ شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد، می باشند.

وظیفه	نام	تعداد سالهای تجربه کاری (عمومی)	سالهای تجربه کاری در این ظیفه
وظیفه	نام	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

۱.۷ گزارش تفتیش / تعداد به ارقام و حروف درج گردد، سال گذشته، بیانس شیت و بیانیه مقاد و ضرر تائید شده توسط مفتش مستقل / لست و کابی ها / شعبه گردید.

۱.۸ شواهد دسترسی به منابع مالی: جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت: دارایی سیال (نقدي)، دسترسی به انواع اعتبارات (قرضه) و سایر اسناد منابع مالی / قدرتمندی و کابی های اسناد حماقی ضممه گردید، می باشد. داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای سایر قراردادها و اقرهای ارائه شده را نیز ارائه نماید.

۱.۹ بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس گرفته می شود:

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

مالی

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

{نام، آدرس، شماره تلفن و فکس بانک درج گردد}

1.10 معلومات در مور دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب: {حول ذیل با اختیار نمودن و دستیافت در صورت ضرورت، تکمیل گردد}

طرف های دیگر	دلیل منازعه	مبلغ من زعده
{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

1.11 پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده: {فهرست ترتیب گردید}

توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنامه: {فهرست ترتیب گردید}

### 2 شرکت مشترک (JV)

2.1 معلومات مندرج فهرست 1.1 الى 1.10 فوق برای هر شریک شرکت مشترک ارائه گردد.

2.2 معلومات مندرج 1.11 برای شرکت مشترک ارائه گردد.

2.3 صلاحیت نامه که صلاحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.

2.4 موافقنامه شرکای شرکت مشترک که بالای تمام شرکا الزامیت قانونی داشته باشد و نشان دهنده موارد ذیل باشد ضمیمه گردد:

(۱) تمام شرکا بصورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤول می باشند.

(۲) یکی از شرکا منحیت شریک اصلی نامیده شده و مسؤول قبول مسؤولیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد:

(۳) تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد.

### 3 نیازمندیهای اضافی

3.1 داوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی را ارائه نمایند.

نام: {نام شخص درج گردید}  
 وظیفه: {وظیفه درج گردید}  
 امضاء: \_\_\_\_\_  
 تاریخ: \_\_\_\_\_

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

فورم نامه قبولی آفر<sup>۹</sup>

فورمه امور ساختمانی کوچک/03

شماره: / شماره صدور این نامه را درج نمایید/ تاریخ: / تاریخ صدور این نامه را درج نمایید/

از: / نام اداره تدارکاتی را درج نمایید/

آدرس: / آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید/

به: / نام داوطلب برندۀ و شماره حواله صالحیت وی را ذکر نمایید/

آدرس: / آدرس داوطلب برندۀ را درج نمایید/

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ / تاریخ را به ترتیب روزه ماه و سال نمایید، شما برای تدارک / قائم بروزه را قرارداد را نمایید، به قیمت قطعی مجموعی مبلغ / مبلغ اتفاق و حروف نمایید، طوریکه در مطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسليم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

مشخصات تدارکات / قرارداد: / نام و مشخصات حمل تدارکات / قرارداد را درج نمایید/
شماره تشخیصیه تدارکات: / شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید/
قیمت مجموعی قرارداد: / قیمت مجموعی قرارداد می باشد ارقام و حروف درج نمایید/
نوعیت تضمین اجرای قرارداد: / نوعیت تضمین اجرایی قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را نمایید/
مقدار تضمین اجرای قرارداد: / مقدار تضمین اجرایی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید/
زمان عقد قرارداد: / تاریخ و ساعت عقد قرارداد را نمایید/
مکان عقد قرارداد: / محل عقد قرارداد را نمایید/

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص:

وظیفه:

امضاء و تاریخ ۱۰

<sup>۹</sup> طبق فقره (۱) حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات، اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت امر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برندۀ ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برندۀ ارسال می شود.

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

شرطنامه معیاری قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد.

این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تعییرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با بالمقطع نیز استفاده میگردد.

الف: عمومیات	
	ماده ۱- تعریفات
۱- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:	
۱- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند.	
۲- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده ۴۴ شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.	
۳- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند ۱ ماده ۵۵ شرایط عمومی قرارداد.	
۴- قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند ۲ ماده ۳ شرایط عمومی قرارداد می باشد.	
۵- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.	
۶- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.	
۷- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیلات بعدی واردہ مطابق قرارداد می باشد.	
۸- روز: روز تقویمی می باشند.	
۹- مژد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیضی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مقادیر پرداخت میگردد.	
۱۰- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.	
۱۱- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقnamه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد.	
۱۲- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند ۱ ماده ۳۵ شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.	
۱۳- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد.	
۱۴- اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.	

<sup>۱۰</sup> این نامه، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضا نموده است، امضا شود. این نامه منجیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد.

اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

15-تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت مؤقت در ساحه کار فراهم میگردد.

16-قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.

17-تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسريع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.

18-مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.

19-تاسیسات: منظمات امور ساختمانی که دارایی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد.

20-مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسؤولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.

21-SCC: به معنی شرایط خاص قرارداد است.

22-ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.

23-گزارش بررسی ساحه: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

24-مشخصات: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات واردہ یا تائید شده توسط مدیر پروژه می باشد.

25-تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد.

26-قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.

27-ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.

28-تعديل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.

29-امور ساختمانی: شامل اعممار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد. مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکور یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می نماید.</p>	<b>ماده 2- تفسیر</b>
<p>2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.</p>	<b>ماده 2- تفسیر</b>
<p>2.3 استناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- موافقنامه؛</li> <li>2- نامه قبولی آفر؛</li> <li>3- آفر قراردادی؛</li> <li>4- شرایط خاص قرارداد؛</li> <li>5- شرایط عمومی قرارداد؛</li> <li>6- مشخصات تخیکی؛</li> <li>7- نقشه ها؛</li> <li>8- بل احجام کاری؛ و</li> <li>9- سایر استناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.</li> </ul>	<b>ماده 2- تفسیر</b>
<p>3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.</p>	<b>ماده 3- زبان و قانون قرارداد</b>
<p>4.1 مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.</p>	<b>ماده 4- تصامیم مدیر بروژه</b>
<p>5.1 مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.</p>	<b>ماده 5- واگذاری</b>
<p>6.1 هر گونه ارتباط برقرار شده میان طرفها باید بصورت کتی بوده و هر گونه ابلاغیه صرف در صورت سنتیمی قابل اجرا می باشد.</p>	<b>ماده 6- ارتباطات</b>
<p>7.1 قراردادی باید اداره را کتاباً در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبلاً در آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسؤولیت های کامل کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.</p>	<b>ماده 7- عقد قرارداد های فرعی</b>
<p>7.2 در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی</p>	

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.</p>	
<p>8.1 قراردادی ساحه کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.</p>	<p>ماده 8- سایر قراردادی ها</p>
<p>9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تأثید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل با بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.</p>	<p>ماده 9- کارمندان</p>
<p>9.2 مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در چربان (7) روز، اطمینان میدهد.</p>	
<p>10.2 اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.</p>	<p>ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی</p>
<p>11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:</p> <p>1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:</p> <p>(1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا پذیر امور ساختمان باشد؛ یا</p> <p>(2) غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی</p> <p>2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.</p>	<p>ماده 11- خطرات مربوط اداره</p>
<p>11.2 خطر زبان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زبان و خساره از زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشند:</p> <p>1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛</p> <p>2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا</p>	

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.	
12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خسarde به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤولیت قراردادی می باشد.	ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی
13.1 قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد:	ماده 13- بیمه
1- زیان یا خسarde به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام؛	
2- زیان یا خسarde تجهیزات؛	
3- زیان یا خسarde ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و	
4- صدمه شخصی یا مرگ.	
13.2 قراردادی، پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جرمان خسarde قابل پرداخت می باشد.	
13.3 در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدين منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.	
13.4 هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.	
13.5 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.	
14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.	ماده 14- گزارش تحقیق ساحه
15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.	ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد
16.1 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخریکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.	ماده 16- قراردادی
17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.	ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان
18.1 قراردادی مشخصات تخریکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تأیید ارائه می نماید.	ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروژه
18.2 قراردادی مستول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.	
18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های مؤقت را متاثر نمی سازد.	

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.</p> <p>18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروژه تأیید گرددند.</p> <p>19.1 قراردادی مسؤول اینمی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.</p> <p>20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارایی های فرهنگی و تاریخی می رساند.</p> <p>21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تأخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.</p> <p>22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معروفی گردیده، می دهد.</p> <p>23.1 قراردادی تمام دستایر مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.</p> <p>23.2 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یادداشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واحد شرایط بودن می گردد.</p> <p>24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد.</p> <p>24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.</p>	<p><b>ماده 19- اینمی</b></p> <p><b>ماده 20- اکتساف</b></p> <p><b>ماده 21- ملکیت ساحه</b></p> <p><b>ماده 22- دسترسی به ساحه</b></p> <p><b>ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی</b></p> <p><b>ماده 24- منازعه</b></p> <p><b>ماده 25- پلان کاری</b></p>
<p>25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های امور ساختمانی را جهت تأییدی به مدیر پروژه ارائه نماید.</p> <p>25.2 پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بdst است آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بdst است آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلیل فعالیت ها باشد.</p> <p>25.3 قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی متعطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطالتی پرداخت آن ادامه می یابد.</p> <p>25.4 تائید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.</p> <p>26.1 مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در</p>	<p><b>ماده 25- پلان کاری</b></p>

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرط‌نامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

	تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.	تخمینی تکمیل
26.2	مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.	
27.1	در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پشنهداد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پشنهداد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و توسط اداره و قراردادی تأیید میگردد.	ماده 27- تسریع
27.2	پشنهداد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.	
28.1	مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.	ماده 28- تأخیرسفارش شده توسط مدیر پروژه
29.1	اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند 1 ماده 32 می باشد.	ماده 29- جلسات مدیریت
29.2	مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کابی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.	
30.1	قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.	ماده 30- هشدار زود هنگام
30.1	قراردادی مادیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پشنهداد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذی خل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.	
	ج. کنترول کیفیت	
31.1	مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤولیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و بر ملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است، بررسی می نماید.	ماده 31- تشخیص نواقص
32.1	در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تختنیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.	ماده 32- آزمایش
33.1	مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص	ماده 33- تصحیح

اعمار دیوار محافظه‌کار شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی فرغه بی ولایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می‌سازد. میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.</p> <p>33.2 قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسط مدیر پروژه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می‌نماید.</p> <p>34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع می‌گردد.</p> <p><b>د. کنترول مصارف</b></p> <p>35.1 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.</p> <p>35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.</p> <p>36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می‌نماید.</p> <p>37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می‌گردد.</p> <p>38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می‌نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می‌نماید.</p> <p>38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبل ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می‌شود.</p> <p>38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نیاشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می‌نماید.</p> <p>38.4 در صورتیکه به نسبت استجاعیت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می‌شود.</p>	<p>نواقص</p> <p>ماده 34- نواقص تصحیح نا شده</p> <p>ماده 35- بل احجام کاری<sup>۱۱</sup></p> <p>ماده 36- تغییر مقدار<sup>۱۲</sup></p> <p>ماده 37- اضافه کاری و کم کاری</p> <p>ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها</p>
--	--

<sup>۱۱</sup>در قرارداد با پرداخت بالامقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند ۱ ماده 37 شرایط عمومی قرارداد با بند ۲ ماده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:

بند ۱ ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خوبی را در جریان ۱۴ روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می‌نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.

بند ۲ ماده 37 در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می‌نماید.

<sup>۱۲</sup>در قرارداد با پرداخت بالامقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند ۱ ماده 38 شرایط عمومی قرارداد با بند ۱ ماده 38 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:

بند ۱ ماده 38 تعديل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی‌نماید.

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی

<p>38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.</p> <p>39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری<sup>۱۳</sup>، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خوبیش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.</p> <p>40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.</p> <p>40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.</p> <p>40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.</p> <p>40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری<sup>۱۴</sup> تکمیل شده می باشد.</p> <p>40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حداثه قابل جبران می باشد.</p> <p>40.6 مدیر پروژه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.</p> <p>41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرما می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.</p> <p>41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.</p> <p>41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.</p> <p>42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند ۱ ماده ۲۱ شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده است.</li> <li>۲- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متأثر می سازد؛</li> <li>۳- مدیر پروژه دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تخریکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛</li> <li>۴- مدیر پروژه دستور بر ملاساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، نواقص ثبت نمی گردد؛</li> <li>۵- پمدیر پروژه بدون کدام دلایل موجہ، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛</li> <li>۶- شرایط در ساحه نظور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس مبنای فرستاده شده به داوطلبان (بشمل گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛</li> <li>۷- مدیر پروژه دستور حل وضیعت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به</li> </ol>	<p>ماده 39- تخمین جریان پول نقد</p> <p>ماده 40- تصدیقنامه پرداخت ها</p> <p>ماده 41- پرداخت ها</p> <p>ماده 42- وقایع قابل جبران</p>
---	--

<sup>13</sup> در قرارداد با پرداخت بالقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد<sup>۱۴</sup> در قرارداد با پرداخت بالقطع، این پارagraf شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول فعالیت می باشد" /

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>دلالی اینمی یا سایر دلایل لازم باشد؛</p> <p>8- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛</p> <p>9- تأخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره</p> <p>10- تأخیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛</p> <p>11- تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلایل نا معقول از جانب مدیر پروژه؛</p>	<p>42.2 در صورت وقوع حادثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد. مدیر پروژه تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.</p> <p>42.3 در صورت ورود خسارت به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.</p>
<p>43.1 مدیر پروژه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی(BRT)، و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسليمه آفرها و آخرين تاریخ تصدیق تکمیلی، تعديل می نماید. این تعديل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبل از قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.</p>	<p>ماده 43- مالیه</p>
<p>44.1 در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.</p> <p>45.1 تعديل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.</p>	<p>ماده 44- اسعار</p> <p>ماده 45- تعديل قیم</p>
<p>46.1 اداره الی ختم تمام کار، قسمتی از پول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.</p>	<p>ماده 46- تأمیمات</p>
<p>46.2 تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرفتی، و رانتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.</p>	
<p>47.1 جریمه تأخیر به نرخ فی روز مندرج شرایط خاص قرارداد برای روز های تأخیر محاسبه میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتاد طرز العمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جریمه تأخیر تأثیری بر مسؤولیت های قراردادی ندارد.</p>	<p>ماده 47- جریمه</p> <p>تأخر</p>
<p>47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تأخیر، مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تأخیر توسط قراردادی را با تعديل تصدیق نامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.</p>	
<p>48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مكافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روزهای که پرداخت مكافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است)-<b>شرط خاص قرارداد</b>، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرآور نرسیده است تصدیق می نماید.</p>	<p>ماده 48- مكافات</p>
<p>49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به</p>	<p>ماده 49- پیش</p>

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکتانه وضع نمیگردد.</p>	پرداخت
<p>49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت ثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کاپی های اتوایس ها یا دیگر اسناد را به مدیر پروژه ارائه می نماید.</p>	-
<p>49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعديل قیم، حادثه قابل جبران، مكافات، یا جرمیه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.</p>	-
<p>50.1 داوطلب برندۀ در مدت 10 روز بعد از ریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیق‌نامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.</p>	ماده 50 - تضمینات
<p>51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.</p>	ماده 51 - مزد کار
<p>51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فورمه های تأیید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمۀ تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.</p>	-
<p>51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورمۀ های امضاء شده، صورت میگیرد.</p>	-
<p>52.1 قراردادی بمصرف خود، مسؤولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.</p>	ماده 52 - مصارف ترمیم
<b>ج. اختتام قرارداد</b>	
<p>53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیق‌نامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیق‌نامه را صادر می نماید.</p>	ماده 53 - تکمیل
<p>54.1 اداره دیر چریان (7) روز بعد از صدور تصدیق‌نامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.</p>	ماده 54 - تسلیمی
<p>55.1 قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیق‌نامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در چریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروژه در چریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروژه تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و</p>	ماده 55 - حساب نهایی

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.	
56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید.	ماده 56- رهنمود عملیاتی و مراقبت
56.2 در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده شرایط خاص قرارداد از جانب قراردادی یا عدم تأییدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.	

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی فرغه یی ولايت لغمان  
MAIL/PD/NCB/W/127/98

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی**

<p>57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.</p> <p>57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروره تائید نگردیده باشد؛</li> <li>2- مدیر پروره دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصراف از این دستور صورت نگرفته باشد؛</li> <li>3- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی</li> <li>4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروره به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروره، نوافض را رفع نماید؛</li> <li>5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و</li> <li>6- در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.</li> </ol> <p>57.3 علرغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.</p> <p>57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.</p> <p>58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبایی، اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد.</p> <p>58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبایی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد.</p>	<p>ماده 58- فساد و تقلب</p>
--	-----------------------------

اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>58.3 اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:</p> <p>6- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هر چیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر<sup>15</sup> (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.</p> <p>7- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.</p> <p>8- تباني: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر<sup>16</sup> داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.</p> <p>9- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.</p> <p>10- ایجاد اخال و موافع: عبارت از تحریب، تزویر، تغییر یا کتمان استاد و اظهارات نادرست در پرسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.</p> <p>اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تباني، اجبار یا ایجاد اخال و موافع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.</p> <p>اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تباني، اجبار و اخال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.</p> <p>اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.</p> <p>داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.</p> <p>58.4 هیچ نوع فیس، مكافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پرسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهاییکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.</p>	<p>ماده 59- پرداخت بمحض فسخ</p>
<p>59.1 درصورت فسخ قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروره تصدیقnamه ارزش کار انجام شده را بعد از تفرقی بیش پرداخت پرداخت شده ای تاریخ صدور تصدیقnamه و فیصدی قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل ناشنیده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می نماید. جرمیه تأخیر اضافی قابل تطبیق نباشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تعاویز لین قرض قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد.</p> <p>59.2 درصورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد.</p>	

<sup>15</sup> به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مربوط به پرسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.

<sup>16</sup> این شرکت کننده های پرسه تدارکات (بیش از مقامات دولتی) که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پرسه تدارکات را داشته اند، اطلاق میگردد.

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

<p>مدیر پروژه تصدیق نامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفریق پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور تصدیق نامه را صادر می نماید.</p>	
60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.	ماده 60- ملکیت
61.1 در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره یا قراردادی متأثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیق نامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیق نامه و کار ها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیق نامه انجام می یابد، صورت می گیرد.	ماده 61- عدم امکان تطبیق قرارداد
<p><b>62.1 حل منازعه بطور دوستانه:</b> 1- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خوب شرآ جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند.</p> <p><b>64.1 مرجع حل و فصل منازعات:</b></p> <p>2- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتسی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مر جع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد.</p> <p><b>64.2 حکمیت:</b></p> <p>3- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (28) روز از تصمیم خوب شدن مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.</p>	ماده 62- حل منازعه

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی

قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

اداره این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه پری مینماید. معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند)	
تعديلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد	مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسائل عمومی	
میعاد رفع نواقص بعد از پرسه تسلیم دهی و تسلیم گیری موقت مدت یکسال تقویمی میباشد.	جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری	جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تعیین شده تکمیل کاربرای تمام امور ساختمانی مربوط 6 ماه تقویمی میباشد.	جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه یکتن از انجینیران ریاست آبیاری میباشد میباشد.	جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
محل (ساحه) کار قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان .	جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.	جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
امور ساختمانی اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان	جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی

تکمیل قسمی عبارت است از: ضرورت نمی باشد.	بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد
1- موافقنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات تخفیفی؛ 7- نقشه ها؛ 8- بل احجام کاری؛	جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد
زبان قرارداد : یکی از زبان های رسمی کشور میباشد.	بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد
قانون نافذ بر این قرارداد قانون تدارکات عامه افغانستان می باشد می باشد.	
سقف قرار داد فرعی برای این قرار داد بسیت (20) فیصد میباشد قراردادی نمی تواند بدون موافقه قبلی اداره الی سقف فوق الذکر تعین شده قرارداد را به دست دوم یا به قراردادی فرعی و گذار نماید در صورت بروز چنین حالت برخورد قانونی صورت می گیرد.	بند 2 ماده هفت شرایط عمومی قرارداد
جدول کاری قراردادیان دیگر: قابل تطبیق نیست.	بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی فرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>کارمندان کلیدی یک مدیر قرارداد یعنی انженر با ۵ سال تجربه در اجرای قراردادهای امور ساختمانی که دارای ماهیت و حجم معادل و مشابه، به شمول اینکه به حیث مدیر پروژه برای مدت حداقل سه سال تجربه داشته باشد یک انженر ساحه.</p> <table border="1" data-bbox="185 444 1164 1006"> <thead> <tr> <th>رشته تحصیلی</th><th>تجربه عمومی کار (سال)</th><th>درجه تحصیل</th><th>تعداد</th><th>نام بست</th><th>شماره</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>سیول</td><td>5</td><td>لیسانس</td><td>1</td><td>مدیر پروژه یا امیر پروژه جهت تنظیم امورات ساختمانی در ساحه تطبیق پروژه</td><td>1</td></tr> <tr> <td>رشته های ساختمانی</td><td>3</td><td>لیسانس</td><td>1</td><td>انженر ساحه</td><td>2</td></tr> <tr> <td>سروى</td><td>3</td><td>لیسانس</td><td>1</td><td>انженر سروى</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	رشته تحصیلی	تجربه عمومی کار (سال)	درجه تحصیل	تعداد	نام بست	شماره	سیول	5	لیسانس	1	مدیر پروژه یا امیر پروژه جهت تنظیم امورات ساختمانی در ساحه تطبیق پروژه	1	رشته های ساختمانی	3	لیسانس	1	انженر ساحه	2	سروى	3	لیسانس	1	انженر سروى	3	<p>بند 1 ماده 9 شرطیط عمومی قرارداد</p>
رشته تحصیلی	تجربه عمومی کار (سال)	درجه تحصیل	تعداد	نام بست	شماره																				
سیول	5	لیسانس	1	مدیر پروژه یا امیر پروژه جهت تنظیم امورات ساختمانی در ساحه تطبیق پروژه	1																				
رشته های ساختمانی	3	لیسانس	1	انженر ساحه	2																				
سروى	3	لیسانس	1	انженر سروى	3																				
<p>مبلغ حداقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: (تهیه بیمه از وجایب و مکلفت داوطلبان میباشد و شامل موارد ذیل می باشد).</p> <p>1- برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد (افغانی) 2- برای زیان یا خساره به تجهیزات قیمت تعویضی آن (تجهیزات مربوطه) برداخته میشود. 3- برای زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات (افغانی) 4- مرگ یا خساره به کارمندان: (1) کارمندان قراردادی (2) افراد دیگر (0) افغانی</p> <p>بیمه مطابق ماده 13 شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق است</p>	<p>بند 1 ماده 13 شرطیط عمومی قرارداد</p>																								
<p>گزارشات بررسی ساحه (کتابچه ژورنال و راپور های یومیه انженر مراقبت کننده) می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 14 شرطیط عمومی قرارداد</p>																								
<p>مدیر پروژه به پرسش های قراردادی توضیحات ارائه می نماید</p>	<p>بند 1 ماده 15 شرطیط عمومی قرارداد</p>																								

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه می باشد.	بند 1 بند 21 شرایط عمومی قرارداد
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد {مرکز حل و فصل منازعات تجاری افغانستان میباشد. محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.	ماهه 62 شرایط عمومی قرارداد
ب. کنترول زمان	
قراردادی پلان کاری امور ساختمانی را در جریان 10 روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تأثید، ارائه مینماید.	بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 روز میباشد.  در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، پرداخت مبلغ 30,000 افغانی صورت نمیگیرد..	بند 3 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
تمدید معیاد قرارداد:  هرگاه قرارداد در معیاد از قبل تعیین شده تکمیل شده نتواند وقراردادی در قبال تأخیر معیاد قرارداد مسؤول نباشد، مدیر پروژه می تواند قبل از ختم معیاد قرارداد با ذکر دلایل موجه تمدید معیاد قرارداد را برای مدت مشخص آن پشنهداد نماید.  هر نوع تمدید معیاد قرارداد قبل از ختم معیاد قرارداد که در توافقنامه قرارداد ذکر شده مطابق به طرز العمل تدارکات صورت میگیرد. تمدید معیاد بعد از ختم قرارداد قابل اجرا نیست. تمدید معیاد قرارداد قبل از ختم قرارداد توسط جانبین قرارداد (اداره و قراردادی) بصورت کتبی امضا گردد.	بند 1 ماده 26 شرایط عمومی قرارداد
ج. کنترول کیفیت	
قراردادی مکلف است، حسب هدایت کتبی مدیر پروژه آزمایشات و تست های لازم را انجام دهد. صارف تمام آزمایشات و تست ها (Quality Control Tests) به دوش قراردادی می باشد	بند 1 ماده 32 شرایط عمومی قرارداد

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>میعاد تصحیح نواقص(28) روز تقویمی بعد از هدایت انجینیر مراقبت کننده می باشد.</p>	بند 1 ماده 33 شرایط عمومی قرارداد
۵. کنترول مصرف	
<p>قراردادی مکلف است تا هر نوع تغیرات در احجام کاری را قبل از انجام آن به مدیر پروژه بطور کتبی اطلاع داده و مدیر پروژه را مطلع سازد.</p> <p>در صورت موجودیت اضافه کاری، قبل از انجام آن در ساحه مدیر پروژه مکلف است تا موضوع را با ذکر دلایل موجه به آمر اعطای پیشنهاد نموده و تعديل احجام (اضافه کاری) مطابق به طرز العمل تدارکات صورت گیرد.</p> <p>بل احجام تجدید شده که شامل (اضافه کاری داخل و یا خارج آفر) باشد همراه با تعديل قیمت قرارداد توسط طرفین قرارداد (اداره و قراردادی) قبل از انجام کار امضا گردد.</p> <p>تعديل قرارداد شامل (اضافه کاری، تمدید میعاد) در خلال میعاد قرارداد و قبل از انجام کار صورت گیرد، در غیر آن بعد از انجام کار و یا ختم میعاد قرارداد قابل پرداخت و مجزا نبود و مکلفیت به دوش قراردادی می باشد.</p> <p>مدیر پروژه نمی تواند هیچ نوع تعديل (افزایش یا کاهش در قیمت قرارداد) به طور خو سرانه اجرا نماید.</p>	بند 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد
▪ پرداخت های به اساس پیشرفت فزیکی کار صورت میگیرد. ▪ برای انجام پرداخت ها اسناد ذیل نیاز می باشد: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ صورت جساب (انوایس) شرکت قراردادی</li><li>▪ بل احجام کار از احجام کار انجام شده</li><li>▪ اندازه گیری کار انجام شده</li><li>▪ راپور تست های کنترول و کفیت کار (Quality Control Tests)</li><li>▪ تصدیق مدیر پروژه از کار انجام شده</li><li>▪ تصدیق مراقبت کننده از کار انجام شده</li></ul>	

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>پرداخت ها در پیش پرداخت مجزا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.</p> <p>1. پرداخت بعد از تکمیل کار نظر به فیصی دارد از ارائه گزارش از جانب فرمایش گیرنده و تصدیق نماینده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخته می شود.</p> <p>2. بول فرمایش گیرنده در چهار قسط پرداخته می شود که در قسط اول 25 فیصی بعد از 25 فیصی تکمیل کار، در قسط دوم 25 فیصی بعد از 50 فیصی تکمیل کار، در قسط سوم 25 فیصی بعد از 75 فیصی تکمیل کار، و در قسط چهارم 25 فیصی بعد از 100 فیصی تکمیل کار پرداخته می شود.</p> <p>پرداخت های فوق در جریان کار قرار فوق در مقابل گزارشات پیشرفت کار انجام شده بعد از تصدیق مراقبت کننده از جانب فرمایش دهنده صورت می گیرد.</p>	بند 1 ماده 41 شرایط عمومی قرارداد
<p>قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعديل نیست" و معلومات ذیل در مورد ضرایب "قابل تطبیق نیست"</p> <p>ضرایب تعديل قیم قرارذیل میباشند:</p> <p>برای واحد پول افغانی:</p> <p>ضریب A: فیصی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>به واحد پول { واحد پولی درج گردد}:</p> <p>ضریب A: فیصی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد پول افغانی {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد پولی بین المللی مشخص شده {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد}</p> <p>شاخص 1 اسعار به استثنای واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی {شاخص درج گردد} میباشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد}</p>	بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد
<p>فیصی تنااسب پرداخت های تامینات 10٪ ده فیصی میباشد.</p> <p>تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم ميعاد گرنی، ورانتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد</p>	بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>اندازه جریمه تاخیر (0.05) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غایبت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 57 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد، درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>پیش پرداخت الی (10٪) قیمت قرارداد بوده) در مقابل تضمین بانکی غیرمشروط پرداخت میگردد. معیاد اعتبار تضمین پیش پرداخت الی ختم معیاد قرارداد می باشد، پیش پرداخت 30 روز بعد از امضا قرارداد و ارائه تضمین پیش پرداخت صورت گرفته می تواند.</p> <p>۱. پیش پرداخت مطابق به شرایط خاص قرارداد الی 30 فیصد صورت گرفته می تواند.</p> <p>۲. تضمین پیش پرداخت دواطلب مطابق پیشرفت فزیکی کار آزاد ساخته می شود.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 30 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 3 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 20 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 2 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 10 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 1 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>اداره این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در حالات خاص حسب لزوم دید و حکم آمر اعطا، برابر با پیشرفت فزیکی کار مقدار تضمین پیش پرداخت را آزاد سازد.</p>	<p>بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>مبلغ تضمین اجرا {پنج(5) فیصد مجموع قرارداد میباشد.</p> <p>تضمين اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط.</p>	<p>بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>هـ ختم قرارداد</p>	

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

بند 1 ماده 56 شرطنامه عمومی قرارداد	ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.
بند 2 ماده 56 شرطنامه عمومی قرارداد	در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 56 شرطنامه عمومی قرارداد، مبلغ (30000) از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید
جز 6 بند 2 ماده 57 شرطنامه عمومی قرارداد	حد اکثر تأخیر 100 صد روز میباشد. تعداد روز ها باید در مطابقت به بند 1 ماده 49 جرمیه تأخیر شرطنامه خاص قرارداد می باشد.
بند 1 ماده 59 شرطنامه عمومی قرارداد	فیضی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کار باقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در میعاد اعتبار قرارداد اولی فرامه و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

قسمت ششم: مشخصات تختنیکی و شرایط اجرا

**پادداشت ها در مورد مشخصات عمومی**

{ این پادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تختنیکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در اسناد نهایی شامل نمی باشند }

مشخصات تختنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان میباشد. در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تختنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، مواد خام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف باخاطر اطمینان اقتصادی، منصرمیت و منصفانه بودن که سبب ارائه آفر جوابگو و تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد.

مشخصات تختنیکی بیانگر اینکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخرین یا جدیدترین مدلها فعالی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح و دیزاین مواد باشد، مگر اینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.

مشخصات تختنیکی از پروژه های مشابه قابل استفاده میباشد. اکثر مشخصات تختنیکی که برای اجرای قرارداد امور ساختمانی مناسب باشد، از جانب اداره یا انجینیر تحریر میگردد. مشخصات تختنیکی معیاری با کاربرد فرآگیر تمام سکتورها وجود ندارد، اما اصول و عرف پا بر جا موجود در این اسناد منعکس گردیده است.

معیاری سازی مشخصات تختنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتورهای دولتی چون شاهراه ها، بنادر، قطار آهن، مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگردد. مشخصات تختنیکی عمومی شامل طرز کار، مواد و تجهیزات که معمولاً در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد. هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تختنیکی عمومی باشد. مشخصات تختنیکی عمومی مشخصات اند که توسط وزارت های سکتوری انهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی استاندرد (ISO) صادر شده باشد.

توجه داشت که مشخصات تختنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تختنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین المللی میبن این باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تختنیکی بوده و مشخصات تختنیکی معادل یا بالاتر از معیارات ذکر شده، قابل قبول میباشد. جهد تطبیق، ماده نمونی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تختنیکی درج گردد.

**معادل بودن معیارها و کودها**

در صورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرين ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و کود ها از نهاد های جمهوری اسلامی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا بالاتر از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل پیشنهاد شده را بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان (28) روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم می نماید. در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های مشخص شده اسناد داوطلبی را برآورده نماید.

### قسمت ششم: مشخصات و شرایط اجراء

قسمت هفتم نقشه ها

ضم میباشد

#### یادداشت ها و نقشه ها

الリスト نقشه ها درج گردید

نقشه های واقعی پسندی بلدن ساخته به این روشی با در دوسته حد اگانه ضمیمه شود.

نقشه ها اداری تاریخی شماره و نسخه تجدید نشانه میباشد.

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

قسمت هشتم بل احجام کار<sup>۱۷</sup>

یادداشت ها درمورد بل احجام کار

ضم میباشد

این یادداشت صرف معلومات برای ترتیب بل احجام کار به اداره بوده و در استناد نهایی شامل نمیگردد.

اهداف

اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

- ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهیه آفر بشکل مشمر و درست از جانب داوطلب میگردد؛
- ارائه بل احجام کار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختمان اجرا شده در صورت عقد قرارداد.

برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقلام در بل احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امور ساختمان با تفکیک بخش ها یا امور ساختمان با ماهیت مشابه که در ساحت مختلف، شرایط مختلف انجام و سبب بررسی مصارف از جهات مختلف میگردد، صورت گیرد.

با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتواي بل احجام کار باید تا حد ممکن ساده و خلاصه باشد.

جدول مزد کار

جدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پیش بینی نشده بیرون از بل احجام کار بیشتر باشد. جهت بررسی واقعی بودن نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذیل میباشد:

- لست بخش های مختلف نیروی کار، مواد و تاسیسات امور ساختمان که به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت ها درج میگردد، بازیانیه شرایط پرداخت امور ساختمان به قراردادی
- مقدار ایمنی برای هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد.

مبالغ احتمالی

یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فریکی (افزایش مقدار) در بل احجام کار شامل میگردد.

همچنان هزینه احتمالی برای افزایش ممکن قیمت منحیت مبلغ احتمالی در بل احجام کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد.

شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از درخواست دورانی برای نیاز های آینده میگردد.

درصورت استفاده مبلغ احتمالی (Contingency Allowance) روش استفاده و مقام با صلاحیت منظور کننده آن که معمولاً مدیر پروژه میباشد، در شرایط خاص قرارداد ذکر میگردد.



۱۷) در قرارداد های بالمقابل، بل احجام کار صرف جهت ارائه معلومات بوده و الزام آور نمیباشد. برای معلومات ترتیب میباشد و وابسته به قرارداد.

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

### تصحیح اشتباهات محاسبوی

هرگاه اشتباہ محاسبوی توسط داوطلب در قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی صورت گرفته باشد، داوطلب می‌تواند قبل از تسلیمی آفر آنرا تصحیح و هر تصحیح توسط شخص با صلاحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردد. بل احجام کار توازن با بیانیه ذکر مقدار مجموعی اصلاحات واردہ در بل احجام کار قیمت گذاری شده، ارائه می‌گردد.

اداره یادداشت ذیل را در هر بل احجام کار ذکر می‌نماید:

این بل احجام کار در برگیرنده (شماره به ارقام و حروف درج گردد) اصلاحات محاسبوی بوده و توسط شخص با صلاحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردیده است.

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی فرغه بی و لایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

### قسمت نهم - فورمه های قرارداد و تضمین

فورمه ها	عنوان فورمه ها	فهرست
فورمه امور ساختمان کوچک/05	تضمین آفر: تضمین بانکی	
فورمه امور ساختمان کوچک/06	اظهار نامه تضمین آفر	
فورمه امور ساختمان کوچک/07	تضمین اجرا (غیر مشروط)	
فورمه امور ساختمان کوچک/08	تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی	
فورمه امور ساختمان کوچک/09	موافقت نامه قرارداد	

الف) فورمه های نمونیوی قابل خیول تضمین آفر اجرا و پیش پرداخت از ائمه گردیده است. دادوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت را در این پروسه حاصل پری نمی نمایند تنها دادوطلب بزنده این دو فورمه را از ائمه می نمایند.

اعمار دیوار محافظوی کanal شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تضمين آفر: تضمين بانکي

فورمه امور ساختمان کوچک/05

بانک: **{نام و آدرس بانک درج گردد}**

ذینفع: **{نام و آدرس اداره ذینفع گردد}**

تاریخ: **{روز، ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}**

شماره تضمين بانکي آفر/**{شماره درج گردد}**

اطلاع يافتيم که **{نام مکمل داوطلب درج گردد}**, منبعد به نام "داوطلب" آفر خود که به تاریخ **{تاریخ درج گردد}**, برای اجرای **{نام قرارداد درج گردد}**, تحت اعلان تدارکات شماره **{شماره اعلان تدارکات درج گردد}**, به شما ارائه نموده است.

برعلاوه می دانيم که مطابق شرایط شما، آفر باید همراه با تضمين آفر ارائه گردد.

بر اساس درخواست داوطلب، ما **{نام بانک درج گردد}**، بدینوسيله به صورت قطعی تعهد ميسپاريم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی **{مبلغ به حروف و رقم درج گردد}** را بعد از دریافت اولین تقاضاي تحريري شما در صورت که داوطلب مرتكب اعمال ذيل گردیده باشد، پردازيم:

- (1) تغيير يا انصراف از آفر در ميعاد اعتبار آفر و بعد از انقضاي مدت معينه تسليمي آفر؛
- (2) انکار داوطلب از پذيرش تصحيح اشتباهات حسابي در جدول قيمت هاي ارائه شده در آفر؛
- (3) اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پيشنهاد از طرف داوطلب برنده؛
- (4) فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛
- (5) در صورت محروميت داوطلب به دليل تخطي در اين داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم اين قانون.

اين ضمانت در حالات ذيل فاقد اعتبارخواهد شد:

(6) درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی هاي قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضمين

آخر طبق دستورالعمل برای داوطلبان؛ يا

(7) درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض (1) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ يا (2) 28 روز بعد از ختم ميعاد اعتبار آفر به شمول ميعاد تمديد مدت اعتبار آفر **{تاریخ حسم آفر درج گردد}**،

در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت اين تضمين باید توسط ما قبل از ميعاد فوق دریافت شده باشد.

اين تضمين تابع مقرره منتشره شماره 785 آطيق بيجارت بين الملل ميباشد.

امضا: **{امضاي مستول مربوط درج گردد}**

مهر: **{مهر گردد}**

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قريه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

اظهار نامه تضمین آفر

فورمه امور ساختمان کوچک/06

{شماره اعلان تدارکات درج گردید}:

شماره اعلان تدارکات:

{شماره داوطلبی درج گردید}:

شماره شرطنامه داوطلبی:

{در صورتیکه این آفر بدیل باشد، شماره تصحیحی آن درج گردد}:

شماره آفر بدیل:

{روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}:

تاریخ:

به: {نام مکمل اداره درج گردید}

ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد.

ما می پذیریم که در صورت نقض و جایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت {سالانه سال درج گردید} سر از {تاریخ درج گردید} محروم گردیم. و جایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:

1- ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛

2- تغییر یا انصراف در میعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛

3- انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباہات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛

4- اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛

5- فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده.

این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برند شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برند و یا 28 روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد.

امضا: {امضای شخصی که صلاحیت امضای این اظهار نامه را دارد}

دارای صلاحیت امضای این اظهار نامه از جلو: {نام داوطلب درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال درج گردید} در

مهر: {ماه گردید}

{یادداشت: در صورت تحریک مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرک کا آفر را ارائه گردد}

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تضمين اجرا بانکی (غير مشروط)

فورمه امور ساختمان کوچک ۰۷

بانک: نام و آدرس بانک درج گردد

ذینفع: نام و آدرس اداره درج گردد

تاریخ: روز، ماه و سال تسلیمی افر درج گردد

شماره تضمين بانکی آفر شماره درج گردد

ریه اسناد درخواست داوطلب برایه بانک این فورمه را مطابق هفتمود اراده خانه یزدی می نماید

اطلاع حاصل نمودیم که نام تکمیل قراردادی درج گردد، که منبعد بنام "قراردادی" یاد می شود، قرارداد شماره شماره قرارداد درج گردد، مؤخر روز، ماه و سال درج گردد، را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور انجام نام قرارداد و توضیه تخصیص امور ساختمانی درج گردد، عقد می نماید.

علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمين اجراء نیز لازم می باشد.

به درخواست قراردادی، ما تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ <sup>نمایه</sup> به حروف و ارقام درج گردد، را بمجرد دریافت اولین تقاضای کننده نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دلایل و زمینه های ارسال تقاضا از جانب شما، پیردازیم.

این تضمين (28) روز بعد از تسلیمی تصدیقnamه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ روز، ماه و سال درج گردد، هر کدام که اول صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمين باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود.

این تضمين تابع مقرره منتشره شماره ۷۸۵ اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقره ۲ ماده ۲۰ (الف) آن میباشد.

رامضا، نام و وظیفه نماینده با صلاحیت بانک و اكمال کننده درج گردد

تمهر بانک

تمهر اعمال کننده

<sup>۱۸</sup> تضمين کننده (بانک) مبلغ که بیانگر فیضی قیمت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج مینماید

<sup>۱۹</sup> این تاریخ (28) روز بعد از تاریخ تضمینی تکمیل میباشد، اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید این تضمين را از بانک بصورت کننده قبل از ختم اعتبار تضمين اجرا درخواست نماید، جهت تهیه این تضمين، اداره باید داشت زیر را در قسمت آخر پارagraf این فورمه درج مینماید: "تضمين کننده (بانک) به یک تمدید زمان برای مدت (6) ماه یا (1) سال در مقابل درخواست کننی اداره قبل از ختم اعتبار تضمين، موافقه مینماید"

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تضمين پيش پرداخت: تضمين بانکي

### فورمه امور ساختمان کوچک 08

برای اسناد درخواست دادوطلب برگشته، بانک این فورمه را مطابق رسیده خانه برقی می نماید.

بانک: نام و آدرس بانک درج گردد.

ذينفع: نام و آدرس اداره درج گردد.

تاریخ: روز، ماه و سال تسلیمه افراد درج گردد.

شماره تضمين بانکي آفر شماره درج گردد.

ما نام قانوني و آدرس بانک درج گردد، اطلاع حاصل نموديم که نام و آدرس قراردادي درج گردد، که منبعد بنام "قراردادي" ياد مي شود، قرارداد شماره شماره قرارداد درج گردد، مؤرخ روز، ماه و سال درج گردد، را که منبعد بنام قرارداد ياد مي شود با اداره محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد، عقد نماید.

علاوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرایط اين قرارداد، پيش پرداخت در مقابل تضمين پيش پرداخت صورت ميگيرد.

به درخواست قراردادي، تعهد مي نمایيم که بدون چون و چرا مبلغ مبلغ به حروف و رقم درج گردد، را بمجرد دریافت اولين تقاضاي کتسی شما که نشان دهنده تحطی قراردادي ناشی از استفاده پيش پرداخت برای اهداف غير از مصارف تجهيز صورت گرفته باشد، به شما پردازيم.

اين يك شرطی است برای تهیه هر نوع مطالبه و پرداخت تحت اين ضمانت طوريکه پيش پرداخت متذکره فوق باید توسط قراردادي به حساب نمبرش دریافت شده باشد شماره و محل حساب درج گردد.

مبلغ اين تضمين بصورت تدریجي به اندازه باز پرداخت پيش پرداخت توسط قراردادي که در کاپي بيانیه موقت یا تصدیقنامه پرداخت از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، کم ميگردد. اين تضمين بمجرد دریافت کاپي تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه (80) فيصد قيمت قرارداد برای پرداخت تصدق گردیده، يا به تاریخ روز، ماه و سال درج گردد، قادر اعتبار ميگردد.

اين تضمين تابع مقره منتشره شماره 785 اطاق تجارت بين الملل، ميباشد.

رامضا نهاینده با صلاحیت اخذ گردد.

{مهر بانک}

<sup>20</sup> اين تاریخ (28) روز بعد از تاریخ تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعادن تکمیل امور ساختمان، تمدید این تضمين را از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمين اجرا درخواست نماید. جیت تهیه اين تضمين، اداره يادداشت زير را در قسمت آخر پاراگراف اين فورمه درج مينماید: "تضمين کنند (بانک) به يك تمدید زمان برای مدت که نباید بيشتر از (6) ماه با (1) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمين، موافقه مينماید".

اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

فورمه موافقتنامه قرارداد

فورمه امور ساختمانی کوچک/09

{در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصلاح اشتباهات محاسبی مطابق ماده 28 دستور العمل برای داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پرسه ارزیابی مطابق بند 3 ماده 16 دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده 18 دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده 27 دستور العمل برای داوطلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.}

این موافقتنامه به تاریخ {سال، ماه و روز درج گردید} میان {نام و آدرس اداره درج گردید} و {نام و آدرس داوطلب برنده درج گردید} عقد گردیده است.

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجرآت در قرارداد {نام و نیمسیر تشخیصیه قرارداد درج گردید} پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

مهر در حضور {راهنامه پری گردید}

امضا، مهر، و تسلیم گردید {راهنامه پری گردید}

در حضور {راهنامه پری گردید}

امضا الزام آور اداره: {امضا توسط نماینده با صلاحیت اداره}

امضا الزام آور قراردادی: {امضا توسط نماینده با صلاحیت قراردادی}

اعمار دیوار محافظی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

امضا الزام آور قراردادی: /امضا توسط نجایتله با صلاحیت قراردادی

## فورمه معیاری برای دعوتنامه داوطلبی

### دعوت به داوطلبی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

باکود نمبر MAIL/PD/NCB/W/127/98

1. این دعوتنامه برای داوطلبی به تعقیب پلان عمومی تدارکاتی سالانه توسط ریاست تهیه و تدارکات برای سال 1397 ترتیب شده است.

2. ریاست تهیه و تدارکات از تمام داوطلبان دارای اهلیت و واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا آفرهای سربسته خویش را برای اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان ارائه نمایند.

میعاد تحويل و تکمیل امور ساختمانی 6 ماه تقویمی میباشد.

3. پروسه داوطلبی از طریق داوطلبی باز ملی طبق قانون تدارکات عامه و متعدد المالها و برای تمام داوطلبان از منابع و کشورهای واجد شرایط طوریکه در شرطنامه تعریف شده است، راه اندازی خواهد شد.

4. داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتوانند معلومات بیشتر را از میر محمد مونس "حسینی" شماره تیلفون 0782024444، ایمیل: monis.hossaini@mail.gov.af و برای دریافت شرطنامه به آمریت امور ساختمانی ریاست تهیه و تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مراجعه نمایند.

5. شرایط اهلیت شامل (به قسمت های ذکر شده در شرایط برای داوطلبان، مراجعه گردد). یک حد ترجیح برای قراردادها و شرکت های مشترک قابل اجراء نخواهد بود.

6. یک مجموعه مکمل شرطنامه به دری توسط داوطلبان با ارائه یک درخواست تحریری همراي جواز شرکت به آدرس ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

7. آفرها باید به آدرس ذیل به ساعت 1:45 بعد از ظهر به وقت کابل مورخ 25 جوزا سال 1398 تحويل داده شود. داوطلبی الکترونیکی مجاز نیست. آفرهای ناوقت رسیده رد خواهد شد. آفرها طور طبیعی در حضور داشت داوطلبان یا نماینده های آنها که خواهان حضور فزیکی تعمیر عقب ساختمان منابع بشری، منزل نوم، وزارت زراغت، آبیاری و مالداری، جمال مینه، چهاراهی کارتنه سخی، کابل، افغانستان، 00:20 بعد از ظهر به وقت کابل 25 جوزا سال 1398 گشوده خواهد شد.

8. تمام آفرها باید همراه با یک تضمین آفر (تضمين بانکی) مبلغ (140,000) افغانی باشد.

9. آدرس به منظور تسلیمی آفر عبارت است: ریاست تهیه و تدارکات، وزارت زراغت، آبیاری و مالداری، جمال مینه، چهاراهی کارتنه سخی، کابل، افغانستان

10. هرنوع معلومات شامل در این دعوت به داوطلبی در صورت تفاوت با احکام دستور العمل برای داوطلبان قسمت 1 شرطنامه جایگزین شده میتواند.

اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98

دست آوردهای سه سال وزارت

کتابخانه دیجیتالی وزارت

دست آوردهای سه ساله حکومت وحدت ملی

بانک معلوماتی قیم محصولات زراعتی

قوانين، مقررهای، اساسنامه‌ها، و طرز العمل‌های

زراعتی

بیشتر

facebook

Ministry of  
Agriculture,  
Irrigation and  
(Livestock (MAIL

صفحه 1 از 189

... 189 188 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قبل

توپیتر

Tweets by MAIL\_AF

معوقیت‌های وزارت زراعت

ازدواجیت‌های ده گانه

نمایندگان

آبیاری

فعالیت‌های وزارت زراعت

آخرین اخبار و تحولات

داوطلبی‌ها

سازمان

خبر و اعلانات

کشاورزی

اعلانات کاربرانی

1397

بیانیه‌نامه


1397

e-Government of Afghanistan  
All rights reserved.

mail.gov.af/fa/tender

GENEVA CONFERENCE  
AFGHANISTAN

27 - 28 November 2010



۱۶۰



Islamic Republic of Afghanistan  
Administrative Office of the President  
National Procurement Authority

| جستجو | سوالها و جوابهای تدارکات | کمک و رهنمای | بیوندها | ارتباط با ما | دارکارهای نهادهای | صفحه اصلی | English

وضعیت کاربری  
Welcome, MNasim.Mail.  
[Logout](#)

### داوطلبی ها

در صورتی که حجم فایل برای آپلود از 10MB زیادتر میباشد، شما میتوانید که یک فایل پی دی اف را آپلود کنید که از پوزر تقاضا میکند تا با اوردن یک CD فایلهای مربوطه را از اداره شما تسلیم بگیرد.

Reload	Filter	لطفاً انتخاب کنید...
		دری
		13558 ID
		تدارکات امور ساختمانی نویجه تدارکات
		داوطلبی باز شیوه تدارکات
		نمبر پودجه منظور شده شماره قرارداد
		AFG/390676 MAIL/PD/NCB/W/127/98
		اعمار دیوار فلزی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان و سوالی قریه بی و لایت لفمان تشرییع
		تاریخ اختتام داوطلبی (ضرب العجل) 25/3/1398 اسناد داوطلبی
		Uploads/MAIL.39/~ /BiddingOpportunities/13558 /BidDocuments/BidDocument.pdf
		توضیح تعدیلات
		Uploads/MAIL.39/~ /BiddingOpportunities/13558 /NoticeOfTender/NoticeOfTender.pdf اعلام داوطلبی
		آرشیو English
		اعمار دیوار فلزی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان و سوالی قریه بی و لایت لفمان Description
		Download Info
		Download Info Download Details
<a href="#">Delete</a>	<a href="#">New</a>	<a href="#">Edit</a>
476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 ...		

- مسیریابی در وبسایت
- صفحه اصلی ابزارهای نهادهای
- تدارکات
- معلومات مدیریتی تدارکات
- پلان تدارکات
- نظرات تدارکات
- معلومات روزمره تدارکات
- داوطلبی ها
- ثبت شرکت های قراردادی
- قراردادهای اعطا شده
- آرشیو معلومات
- جت همای کارشناس
- گزارشات
- گزارشات پلن تدارکات
- گزارشات نظرات تدارکاتی
- گزارش قراردادهای اعطا شده
- تغیر کلمه عبوری

### Online Users




تاریخ: ۱۳۹۸ / ۰۳ / ۰۴  
شماره: ۲۱۱

آدرس: کابل، کارنه سه، سرک شورا  
ایمیل: dailyetilaatroz@gmail.com  
شماره تماس: ۹۳ (۰) ۷۹۷۴۳۵۷۷۷  
وبسایت: www.etilaatroz.com

به وزارت: محترم زراعت ج.ا! امریت عمومی ندارکات امور ساختمانی  
ادرس:  
شماره تماس:


جمع کل	مبلغ	تعداد	شرح
AFN 4,000.00	4000	1	نشراعلان داوطلبی پرسه داوطلبی اعمار دیوار فظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قریه ولايت لغمان به تاریخ ۴ جوزا ۹۸.
AFN 4,000.00			نام حساب: روزنامه اطلاعات روز نمبر حساب: (۰۰۳۸۰۱۱۰۰۵۲۳۱۴۲) نام بانک: عزیزی بانک
جمع کل به حروف: چهار هزار افغانی			روزنامه اطلاعات روز به شما به عنوان همسکار انتخاب می‌کند.

رأسمه عالی  
مدیر مالی و اداری





**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**



معینیت مالی واداری  
ریاست تهیه و تدارکات  
آمریت تدارکات امور ساختمانی  
مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۸/۳/۶

شماره ( ۶۱ )

به روزنامه محترم اطلاعات روز!  
لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشعه آنرا از دارائی وزارت محاسبه نمائید.  
« دعوت به داوطلبی روش باز داخلی »

**شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/127/98**

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار دیوار فظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قریه بی ولایت لغمان اشتراک نموده شرطname مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af (بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطname و طبق قانون و طرز العمل تدارکات بانک جهانی طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 25 جوزا 1398 ساعت 1:45 بعد از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی (140,000) یک صد و چهل هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 2:00 بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات تدویر میگردد.


بالحرام  
محمد اللہ تعالیٰ  
رئیس تهیه و تدارکات

کاهی به:  
مدیریت پلان جهت نشر در ویب سایت وزارت  
دوستی مربوطه

آدرس: جمال مینه، چهارراه کارتنه سخی کابل-افغانستان، تلفون: +93 (0) 202500315، آدرس انترنت: [www.mail.gov.af](http://www.mail.gov.af)



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**



معینیت مالی واداری  
ریاست تهیه و تدارکات  
آمریت تدارکات امور ساختمانی  
مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۸/۷/۱

شماره ( ۶۱۱ )

به روزنامه محترم اطلاعات روز!  
لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشعه آنرا از دارایی وزارت محاسبه نمائید.  
« دعوت به داوطلبی روش باز داخلی »

**شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/127/98**

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار دیوار فظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قریه بی ولایت لغمان اشتراک نموده شرط‌نامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af (بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرط‌نامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات بانک جهانی طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 25 جوزا 1398 ساعت 1:45 بعد از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمين آفر بصورت تضمین خط بانکی (140,000) یک صد و چهل هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 2:00 بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات تدویر میگردد.

بالحکام  
محمد الله بن‌احل  
رئیس تهیه و تدارکات

کلی به:  
مدیریت پلان جهت نشر در ویب سایت وزارت  
دوسیه مربوطه



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock



د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت

معینیت مالی و اداری

ریاست تهییه و تدارکات

گزارش ارزیابی آفر

۹

پیشنهاد برای اعطاء قرارداد

نام پروژه: اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولایت  
لغمان

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/W/127/98



نمبر تشخیص بودجه: AFG-390676

ترتیب کننده گزارش: هیئت ارزیابی

سال: 1398 ه، ش

4013

اعمار دیوار محافظه کیانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان MAIL/PD/NCB/W/127/98  
فورم معیاری خلاصه معلومات داوطلبی

فورم (۵ - ۲)

معلومات عمومی پروژه	
اعمار دیوار محافظه کیانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان	اسم پروژه
MAIL/PD/NCB/W/127/98	شماره داوطلبی
ساختمانی	نوعیت تدارکات
4,475,841.00 افغانی	قیمت تخمینی
داوطلبی باز داخلی	روش تدارکات
بالمقطع	نوع قرارداد
AFG-390676	نوع و کود بودجه
ارزیابی قبلی اهلیت (در صورتیکه انجام یافته باشد)	
ارزیابی قبلی نشده	تاریخ اعلان
نخیر	تعداد داوطلبان ارزیابی شده
نخیر	تعداد داوطلبان موفق
اعلان و آفر گشایی	
1398/03/04 برای مدت 22 روز.	تاریخ و مدت اعلان
روزنامه اطلاعات روز، سایت وزارت زراعت و سایت تدارکات ملی	نام نشریه ها داخلی و بین المللی (در صورت لزوم) که اعلان در آنها نشر گردیده
1398/03/13 ساعت 10:00 AM (شرکتها اشتراک ننموده است)	تاریخ جلسه قبیل از داوطلبی (در صورت لزوم)
1398/03/25 ساعت 01:45 بعد از ظهر	تاریخ و زمان ضرب الاجل تسليیمی آفر ها
ندارد	تمدید ميعاد ضرب الاجل تسليیمی آفر ها (در صورت لزوم)
شش	تعداد آفر های دریافت شده
شش	تعداد آفر های باز شده
ندارد	تعداد آفر های مسترد شده
ارزیابی آفرها	
1398/03/26	تاریخ آغاز ارزیابی
1398/04/23	تاریخ ختم ارزیابی، ذارت ها
ندارد	تعداد آفر های غیر جوابگو
شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل	نام داوطلب برنده
3,652,030.00 افغانی	قیمت آفر داوطلب برنده

یاداشت: از این فرم در مرحله ارزیابی استفاده میگردد.

## فورمه های معیاری ارزیابی آفر

## پوشش معیاری

## راپور ارزیابی آفر و

## پیشنهاد برای عقد قرارداد

مایان هیئت ارزیابی آفرها که به اساس فورم (۱-۵) حکم شماره ۱۸۱۵ مقدمه ۲۱/۰۳/۱۳۹۸ مؤخر از روزات وزارت زراعت آبیاری و مالداری، جهت ارزیابی آفرهای ارائه شده پروژه اعمار دیوار محافظه کیان شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان، ضرورت ریاست آبیاری، دارای کد نمبر ۹۸/۱۲۷/MAIL/PD/NCB/W توظیف گردیدیم، گزارش ارزیابی خویش را طور ذیل ارائه میداریم:

برویت جدول ثبت توزیع شرطنامه، به تعداد (۱۴) شرکت ساختمانی استناد داوطلبی را از ریاست تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری و به تعداد (۴۹) شرکت را از سایت اداره تدارکات ملی اخذ و در روز آفر گشایی در محل تعین شده مندرج شرطنامه به تعداد (۶) شرکت اشتراک نموده اند که قرار ذیل میباشد:

شماره	اسم داوطلب	نمبر جواز	قيمت خوانده شده در زمان آفرکشائي به افغانی	ملاحظات
1	شرکت ساختمانی صیاد ساحل	D-02-257	3,865,800.00	
2	شرکت ساختمانی، انجینیری و سرکسازی ایسر لطیفی	D-31612	6,441,730.00	
3	شرکت ساختمانی شوکت رحمانی	58233	4,112,937.00	
4	شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل	34684	3,762,030.00	۲۰۰,۰۰۰.۰۰ تخفیف
5	شرکت ساختمانی حیدر زمری	D-79935	3,834,460.00	
6	شرکت ساختمانی اعتماد میهن	D-82971	4,989,700.00	

## فورم معیاری ارزیابی ابتدایی آفر ها

فورم (د-3)

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم پروژه: اعمار دیوار محافظه کیان شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لنمان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/127/98

ردیف	اسم داوطلب	جواز فعالیت معتبر دارد؟ (بلی / نخیر)	آیا داوطلب شامل لیست داوطلبان و قراردادیان محروم شده اداره تدارکات ملی نمی باشد؟ (بلی / نخیر)	آیا داوطلب شامل لیست داوطلبان و قراردادیان محروم شده اداره تدارکات ملی نمی باشد؟ (بلی / نخیر)	آیا آفر به شکل درست آن مطابق مندرجات شرطname تسلیم گردیده است؟ (بلی / نخیر)	آیا آفر برای حداقل مدت لازم شده مطابق شکل، مندرج شرطname میعاد و مبلغ مندرج شرطname می باشد؟ (بلی / نخیر)	آیا آفر ارائه شده بدون مغایرت یا انحراف عمده با شرایط شرطname تحويل گردیده است (حکم 51 طرز العمل)؟ (بلی / نخیر)	آیا آفر شامل مرحله ارزیابی مالی و مقایسه می گردد؟ (بلی / نخیر)
1	شرکت ساختمانی صیاد ساحل	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
2	شرکت ساختمانی، انجینیری و سرکسازی ایسر لطیفی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
3	شرکت ساختمانی شوکت رحمانی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
4	شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
5	شرکت ساختمانی حیدر زمری	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی

در صورتیکه جواز داوطلب ختم گردیده باشد و داوطلب اصولاً دال بر تحت دوران بودن تمدید جواز فعالیت خویش را از مرجع صادر کننده آن ارائه ننماید، جواز قوت تمدید شده پند اشته می شود. لیکن قبل از تمدیدی جواز پروردگار به آن اعطای شده نمیتواند.


بلی	شرکت ساختمانی اعتماد میهن	6							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------------	---

نام و امضاء هیئت

نام و امضاء هیئت

نام و امضاء هیئت

یاداشت: حسب هدایت فقره (2) حکم چهل و چهارم طرز العمل تدارکات در صورتی که جواب برای سوال مربوط به یک یا بیشتر معیارها نخیر باشد، داطلب به مرحله بعدی ارزیابی راه نمیباید.



60011

## فورم معیاری تبادله نرخ اسعار آفر

(4-۵) فورم

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم پروژه: اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/127/98

واحد پولی مورد استفاده در ارزیابی آفر ها: افغانی

ملاحظات	مجموع (ه) مبلغ به واحد پولی مندرج شرطنامه	مبلغ ارائه شده به واحد پولی مندرج شرطنامه (ج*)	نرخ تبادله به واحد پولی مندرج شرطنامه	مبالغ به هر یک از واحد های پولی ارائه شده در آفر	اسم داوطلب	شماره
	و	ه	د	ج	ب	الف
		--	--	--		
		--	--	--		
		--	--	--		
		--	--	--		
		--	--	--		
		--	--	--		
		--	--	--		
		--	--	--		
		--	--	--		

شهرت و امضای هیئت ارزیابی:

نام و امضای هیئت

نام و امضای هیئت

نام و امضای هیئت

یاداشت: این فورم صورت که داوطلب قیمت آفر خویش را به واحد های پولی متفاوت از واحد پولی مندرج شرطنامه ارائه نموده باشد قابل استفاده می باشد. نقل سند تثییث نرخ تبادله اسعار که توسط مرجع ذیصلاح صادر گردیده باشد ضمیمه گردد.

قابل تطبیق نیست

فورم معیاری محاسبه ترجیح داخلی

(۵-د) فورم

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم پروژه: اumar دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/127/98

شماره	اسم داوطلب	قيمت ارزیابی شده آفر <sup>۳</sup>	لست اقلام که شامل تطبیق ترجیح میگردد <sup>۲</sup>		قيمت	اسم	مقدار ترجیح	قيمت آفر بعد از تطبیق ترجیح
			نام	میگردد				
الف	ب	ج	۵	۵	ط = (ج - ه)	ه	ز	مقدار ترجیح
1	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--

قابل تطبیق نیست



از این ستون در صورت استفاده میگردد که یک و یا بیشتر اقلام آفر داوطلب مشمول تطبیق ترجیح گردد.

<sup>۳</sup>قيمت ارزیابی شده آفر از فورم (د-6) نقل میگردد.

## فورم معیاری ارزیابی مالی و مقایسه آفرها

فورم (۶-۵)

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم پروژه: اumar دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/127/98

درجه بندی آفرها	مقدار ترجیح داخلی	قیمت ارزیابی شده ۴	مبلغ تخفیف غیر مشروط		قیمت اصلاح شده آفر	مبلغ احتیاطی Professio nal Sum	مقدار اشتباہات محاسبوی	قیمت قرائت شده در روز آفر گشایی (به واحد پولی مندرج شرطنامه)	اسم داوطلب	شماره
			مبلغ	فیصدی						
(۱) (۱)	(۲) (۲)	(۳) (۳) : و - ط	(۴) (۴)	(۵) (۵)	(۶) (۶) : (ج) + / - هـ	(۷) (۷) : (هـ)	(۸) (۸) : (د)	(۹) (۹) : (ج)	(۱۰) (۱۰) : (ب)	(۱۱) (۱۱) : (الف)
اول	ندارد	۳,۶۵۲,۰۳۰.۰۰ افغانی	۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۵.۱۹%	۳,۸۵۲,۰۳۰.۰۰	ندارد	۹۰,۰۰۰.۰۰	۳,۷۶۲,۰۳۰.۰۰	شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل	۱
دوم	ندارد	۳,۸۶۵,۸۰۰.۰۰ افغانی	ندارد	ندارد	۳,۸۶۵,۸۰۰.۰۰	ندارد	-	۳,۸۶۵,۸۰۰.۰۰	شرکت ساختمانی صیاد ساحل	۲
سوم	ندارد	۴,۱۱۲,۹۳۷.۰۰ افغانی	ندارد	ندارد	۴,۱۱۲,۹۳۷.۰۰	ندارد	-	۴,۱۱۲,۹۳۷.۰۰	شرکت ساختمانی شوکت رحمانی	۳
چهارم	ندارد	۴,۱۳۴,۴۶۰.۰۰ افغانی	ندارد	ندارد	۴,۱۳۴,۴۶۰.۰۰	ندارد	۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۳,۸۳۴,۴۶۰.۰۰	شرکت ساختمانی حديد زمرى	۴
پنجم	ندارد	۴,۹۸۹,۷۰۰.۰۰ افغانی	ندارد	ندارد	۴,۹۸۹,۷۰۰.۰۰	ندارد	-	۴,۹۸۹,۷۰۰.۰۰	شرکت ساختمانی اعتماد میهن	۵
ششم	ندارد	۶,۴۴۱,۷۳۰.۰۰ افغانی	ندارد	ندارد	۶,۴۴۱,۷۳۰.۰۰	ندارد	-	۶,۴۴۱,۷۳۰.۰۰	شرکت ساختمانی، انجینیری و سرکسازی ایسر لطیفی	۶

شهرت و امضای هیئت ارزیابی:

نام و امضای هیئت

نام و امضای هیئت

Name and signature of the appraisal committee members:  
Name and signature of the appraisal committee members:  
Name and signature of the appraisal committee members:

۴ ارقام این ستون در صورت لزوم به فورم (۶-۵) بمنظور محاسبه ترجیح داخلی انتقال میگردد.

یاداشت: حسب هدایت حکم چهل و ششم طرز العمل تدارکات هیئت ارزیابی آفر دارای نازلترين قيمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات شرایط و مشخصات تختنیکی مندرج شرطname جهت تشخیص جوابگو بودن آن، ارزیابی مینماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قيمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قيمت نازلت ارزیابی شده را مورد ارزیابی تختنیکی و در صورت نزوم ارزیابی مفصل قرار میدهد.

#### تضمين آفر:

- تضمين آفر (ضمانت بانکي) شماره 1652/1600/2019 BG NO. 10010/2019-Jun-15 مورخ 1,800.00 دالر امریکایی معادل 143,513.46 افغانی بر اساس نرخ تبادله دالر به افغانی د افغانستان بانک در روز آفرگشایی میباشد و به تاریخ 14-Oct-2019 میعاد اعتبار آن اختتم میباشد، توسط د افغانستان اسلامی بانک صادر گردیده، ارائه نموده است. طی ایمیل مورخ 18-Jun-2019 از بانک متذکره خواهان معلومات گردیدیم، که در جواب بانک متذکره از طریق ایمیل مورخ 18-Jun-2019 خویش، از صحت بودن آن اطمینان داده است. (کاپی تضمين آفر و ایمیل بانک ضمیمه راپور هذا میباشد).

شرکت متذکره معلومات ذیل را دارایی نقدی خویش ارایه نموده است.

#### دارایی نقدی:

- شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل منحیث نشان دهنده دارایی نقدی صورت حساب بانکی ذیل را ضم آفر خویش ارایه نموده است: صورت حساب بانکی شماره 04202200000329 که حاوی مبلغ 12,076.00 دالر امریکایی معادل 962,815.85 افغانی بر اساس نرخ تبادله دالر به افغانی د افغانستان بانک در روز آفرگشایی (Jun-15-2019 مطابق 25 جوزا 1398) میباشد، توسط د افغانستان اسلامی بانک صادر گردیده، ارائه نموده است. طی استعلام شماره 1398/03/28 مورخ 459 طالب معلومات گردیدیم، که در جواب بانک متذکر از صحت بودن آن اطمینان داده است. (استعلام ریاست تدارکات و صورت حساب بانکی شرکت متذکره ضمیمه راپور هذا میباشد).

#### در رابطه به تجربه مشابه و حجم سالانه:

مطابق حکم پنجم بند چهارم طرز العمل تدارکات افغانستان اداره مکلف است جهت فراهم سازی اشتراک تشبیثات کوچک درصورت که امور ساختمانی از لحاظ تختنیکی پیچیده نبوده نرخ تخمینی آن از حدود ده میلیون افغانی تجاوز ننماید در شرطname ها، معیار تجربه کاری مشابه و حجم معاملات سالانه را از داوطلبان مد نظر نگیرند.



سید علی‌محمد  
وزیر

سید علی‌محمد  
وزیر

## فورم معیاری ارزیابی تخفیکی

فورم (د-7)

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم پروژه: اعمار دیوار محافظه کیان شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/127/98


ردیف	معیارات مندرج شرطname	اسم داوطلب شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل	مقدار ارائه شده در آفر	معیار را تکمیل نموده؟	نوعیت اسناد ارائه شده توسط داوطلب	توضیح هیئت ارزیابی (دلایل تکمیل یا عدم تکمیل معیارات)
						بلی / نخیر
1	تجربه مشابه	قابل تطبیق نیست	قابل تطبیق نیست	قابل تطبیق نیست	قابل تطبیق نیست	مطابق حکم پنجم بند چهارم طرز العمل تدارکات افغانستان اداره مکلف است جهت فراهم سازی اشتراک تشبات کوچک در صورت که امور ساختمانی از لحاظ تخفیکی پیجیده نبوده نرخ تخمینی آن از حد ده میلیون افغانی تجاوز ننماید در شرطname های معیار تجربه کاری مشابه حجم معاملات سالانه را از داوطلبان مد نظر نگیرند.
2	حجم معاملات سالانه	قابل تطبیق نیست	قابل تطبیق نیست	قابل تطبیق نیست	قابل تطبیق نیست	مطابق حکم پنجم بند چهارم طرز العمل تدارکات افغانستان اداره مکلف است جهت فراهم سازی اشتراک تشبات کوچک در صورت که امور ساختمانی از لحاظ تخفیکی پیجیده نبوده نرخ تخمینی آن از حد ده میلیون افغانی تجاوز ننماید در شرطname های معیار تجربه کاری مشابه حجم معاملات سالانه را از داوطلبان مد نظر نگیرند.
3	توانمندی مالی	مبلغ حداقل دارائی های سیال (نقدي) یا انواع اعتبارات (قرضه)،	شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل مبلغ 12,076.00	بلی	بانک استیمنت	طبق شرطname معیار را تکمیل نموده است.

			دالر امریکایی معادل 962,815.85) افغانی بر اساس نرخ تبادله دالر به افغانی د افغانستان بانک در روز Jun-15-2019 آفرگشایی) مورخ 25 جوواز 1398 (در مطابق حساب شرکت موجود است.	خلاص سایر تعهدات داوطلب 950,000.00 افغانی از تاریخ نشر اعلان الی روز آفرگشایی یکی از تاریخ ها در صورت حساب شرکت (ستیمنت بانکی) ارائه نماید.		
در شرطنامه ذکر نگردیده	لازم نیست	بلی	لازم نیست	لازم نیست	تجربه عمومی (در صورت لزوم)	4
طبق شرطنامه معیار را تکمیل نموده است.	کاپی اسناد خریداری تجهیزات	بلی	کاپی اسناد خریداری تجهیزات	یک عراده اسکوواتور، یک عراده گریدر، یک پایه جیکمبر، یک عراده بلدوزر، دو عراده ترک، دو پایه کانکریت میکسر، یک پایه جنراتور، یک عراده واپراتور و یک واتر پمپ	تجهیزات (در صورت لزوم)	5
طبق پیشتر ظلمه معیار را تکمیل نموده است.	سی وی و کاپی اسناد تحصیلی کارمندان	بلی	سی وی و کاپی اسناد تحصیلی کارمندان	داشتن یک مدیر پروژه با (5) سال تجربه کاری در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمول حد اقل (3) سال تجربه کاری منحیث مدیر پروژه و انженر ساحه و انженر سروی با داشتن حد اقل (3) سال تجربه کاری.	کارمندان کلیدی (در صورت لزوم)	6
طبق استعلام شماره 461 مورخ 28-03-1398 جهت تصفیه مالیاتی برای سال مالی ۱۳۹۷ به ریاست مالیه دهنده گان متوسط ارسال نمودیم، ریاست محترم جواب خویش را چنین ارائه نموده: (محترما! شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل دارندنه هویت مالیاتی نمبر ۹۰۰۳۴۸۲۷۱۹ نهاد متذکره اظهارنامه مالیاتی فعالیت سال مالی ۱۳۹۷ خویش را به این اداره ارائه نموده است. مکتوب تصفیه ابتدایی مالیات نهاد متذکره بالا ذر	کاپی گزارش ربموارد شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل سال ۱۳۹۷	بلی	یک نقل از اوراق ثبت و راجستر مالیه، سند تصدیق از تصفیه حساب مالیات آخرین دوره یا گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش یا بیانیه مفاد و ضرر یا اظهارنامه تصفیه مالیاتی در (5) سال گذشته	سایر موارد طبق شرطنامه	7	


مکتوب نمبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸/۸۱۰۹ از این اداره صادر گردیده است. فوقاً معلومات ارایه گردید تا اجرات بعدی که در نظر است مرعی گردد.)					
---	--	--	--	--	--

بناءً آفرارائه شده شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل تمام معیارات مندرج شرط‌نامه را تکمیل نموده است که استعلام‌های صادر شده همراه با جواب‌های آن از مراجع مربوطهضم گزارش  
هذا می‌باشد.


نام و امضاء هیئت




نام و امضاء هیئت



شهرت و امضای هیئت ارزیابی:  
نام و امضاهیئت



یاداشت: هیئت ارزیابی بعد از ارزیابی تکنیکی طبق حکم چهل و ششم طرزالعمل تدارکات باید تشخیص دهد که ضرورت به ارزیابی مفصل طبق حکم چهل و هفتم طرزالعمل میباشد یا خیر.



فورم (ه - 1)

معلومات عمومی پروژه		
اسم پروژه و شماره داوطلبی آن	اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان MAIL/PD/NCB/W/127/98	
قیمت تخمینی پروژه	4,475,841.00 افغانی	
قیمت سایر آفر ها ( درصورتیکه آفر برنده از نظر قیمت در رتبه اول نباشد )	موجود نیست	
تعداد آفر های غیر جوابگو	ندارد	
آفر دارای نازلترين قيمت ارزيبابي شده و جوابگوي کلي برای اعطای قرارداد		
اسم داوطلب / شركت	شرکت ساختماني و سركسازي الیاس فضل	
آدرس داوطلب / شركت	جاده نادر پښتون، مارکيت اوريما، مرکز کابل، کابل	
فيصدى تفاوت ميان قيمت تخميني و قيمت پيشنهادي شده برای اعطای قرارداد	18.41% فيصد پائينتر از قيمت تخميني	
قيمت آفر پيشنهاد شده برای اعطای قرارداد	3,652,030.00 افغانی	
خلاصه بررسی هیئت ارزیابی:		
به اساس بررسی و ارزیابی آفرهای ارائه شده برای پروژه اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان؛ ضرورت ریاست آبیاری، دارای کد نمبر 1398/03/04 MAIL/PD/NCB/W/127/98 به داوطلبی سپرده شده به تعداد 14 شرکت استناد داوطلبی پروژه را از ریاست تهیه و تدارکات و به تعداد 49 شرکت استناد داوطلبی پروژه را از سایت اداره تدارکات ملی اخذ و بتاریخ 25/03/1398 مجلس آفرگشایی دایر گردیده، که به تعداد 6 شرکت اشتراک نموده و آفرهای خوبیش را ارزیابی نموده است؛ که در نتیجه ارزیابی ابتدایی شش شرکت توانستند تا با تکمیل نمودن معیارات ارزیابی ابتدایی به مراحل ارزیابی بعدی راه یابند.		
شرکت ساختماني و سركسازي الیاس فضل دارنده جواز نمبر 34684 وزارت تجارت و صنایع، با ارایه قيمت 3,652,030.00 افغانی (سه ميليون و شش صد پنجاه و دو هزار و سی افغانی) که نظر به قيمت تخميني انجنيري 18.41% پائينتر است، از لحاظ قيمت در رديف اول قرار دارد که بعد از ارزیابی آفر، آفر داوطلب جوابگو و واجد شرایط شناخته شد.		
اینک گزارش هیئت ارزیابی به مقام محترم وزارت تقدیم است، در زمینه هر آنطوریکه لازم دانند هدایت خواهد فرمود.		
شهرت و امضای هیئت ارزیابی:		
انجنيير عبد الحليم شاهين	انجنيير ذبيح الله يابرخيل	
شهرت آمر اعطای مربوط		
داوطلبی مجدد	فسخ	منظور
وظیفه: سرپايس است معینیت مالی و اداری		اسم: انجنيير محمد طاهر ايوب
تاریخ:		امضاء:

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم پروژه: اعمار دیوار محافظتی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/127/98

شماره	تفصیلات	تعداد ورق	ملاحظات
1	تعهد نامه سه عضو هیئت ارزیابی	یک ورق	
2	سه ورق اظهارنامه تضاد منافع هئیت ارزیابی	سه ورق	



## اظهارنامه تضاد منافع

این اظهارنامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف است، در مواردیکه تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره ۱ (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضادمنافع طورمستقیم یا غیرمستقیم» : «ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره ۱ آن چنین حکم میکند تضاد منافع : حالتی است که موظفين تدارکات به شمول آمراعطاء به : «که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین تعریف شده است.

نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذینفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد . اقارب به این مقصد عبارت از اولاد، پدر، پدرکلان، مادر، مادرکلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولادهای ایشان تا درجه دوم، والدین همسر- و خواهر و برادر آن، همسر. پسر یا شوهر دختر، میباشد بنا بر این، تصدیق میدارم؛ اینجانب در پروسه تدارکاتی اعمار دیوار محافظوی کanal شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان، کوئنمبر 127/98/MAIL/PD/NCB/W به صفت هئیت ارزیابی تعین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آنی را ندارم:

مواد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام: زیده (زیده) و تخلص: بابر حسن شماره تماس: ۰۷۸۷۷۰۰۹۶۶ ولد: سید حسن

وظیفه: اداره: نزدیکی از زاده امضاء و تاریخ:

23/05/1398

## اظهارنامه تضاد منافع

این اظهارنامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف اند، در مواردیکه تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره ۱ (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضادمنافع طورمستقیم یا غیرمستقیم : « ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره ۱ آن چنین حکم میکند تضاد منافع : حالتی است که موظفين تدارکات به شمول آمراعطاء به : » که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین تعریف شده است.


نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذینفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد . اقارب به این مقصد عبارت از اولاد، پدر، پدرکلان، مادر، مادرکلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولادهای ایشان تا درجه دوم، والدین همسر- و خواهر و برادران، همسر، پسر یا شوهر دختر، میباشد بنا بر این، تصدیق میدارم؛ اینجانب در پروسه تدارکاتی اعمار دیوار محافظی کanal شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان، کوئنمبر ۹۸/W/127/NCB/PD/MAIL به صفت هئیت ارزیابی تعین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آثی راندارم:

مواد فوک راطور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام: فرید ابراهیم و تخلص: ساده شماره تماس: ۰۷۷۵۷۰۹۱۲۵ ولد: سید ابراهیم

وظیفه: عضو هیئت مدیره اداره: وزارت امور اقتصادی و تجارت امضاعوتاریخ:

۱۳۹۸/۶/۲۴



۳۹۹۷

## اظهارنامه تضاد منافع


این اظهارنامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف است، در مواردیکه تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره ۱ (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضادمنافع طورمستقیم یا غیرمستقیم : « ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره ۱ آن چنین حکم میکند تضاد منافع : حالتی است که موظفين تدارکات به شمول آمراعطاء به : « که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین تعریف شده است.

نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذینفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد . اقارب به این مقصود عبارت از اولاد، پدر، پدرکلان، مادر، مادرکلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولادهای ایشان تا درجه دوم، والدین همسر و خواهر و برادران، همسر. پسر یا شوهر دختر، میباشد بنا بر این، تصدیق میدارم؛ اینجانب در پروسه تدارکاتی اعمار دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان، کوئنمبر ۹۸/۱۲۷/W/NCB/PD/MAIL به صفت هئیت ارزیابی تعین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آنی را ندارم:

موارد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام: عکس احمد  
و تخلص: عکس  
شماره تماس: ۰۷۷۵۷۶۷۶۷  
ولد: ۱۳۹۷



وظیفه: رئیس اداره

اداره: رئیس اداره

امضاء و تاریخ:

1398/11/23

۳۹۷

**Consumable, Packing Material/Lebaling**

**پروژه اعمار دیوار محافظی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغمان**


<b>Bid No.</b>	<b>Bidder's Name</b>	<b>City(Country, if not Afghanistan)</b>	<b>License No.</b>	<b>Total Bid Price as read out (AFN)</b>	<b>Modifications or Comments\$1</b>
1	شرکت ساختمانی صیاد ساحل	Jalalabad	D-02-257	3,865,800.00	No
2	شرکت ساختمانی، انженیری و سرکسازی ایسر لطیفی	Kabul	D-31612	6,441,730.00	No
3	شرکت ساختمانی شوکت رحمانی	Kabul	58233	4,112,937.00	No
4	شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل	Kabul	34684	3,762,030.00	200,000.00
5	شرکت ساختمانی حديد زمرى	Kabul	D-79935	3,834,460.00	No
6	شرکت ساختمانی اعتماد میهن	Kabul	D-82971	4,989,700.00	No



۳۹۹۶

Bid No.	Bidder's Name	Eligibility (Registered with)	Verification		Bid Security			Completeness of Bids#1	Substantial Responsiveness*	Bid Accepted for detailed examination
			Bid Signed by (name & Design.)	Submission of essential documents	Bank	Amount (Req. 140,000.00 AFN)	Validity Dt (Req.10-Oct-19)			
1	شرکت ساختمانی صداد ساحل	MCI	Said Alam Khan	Yes	Azizi Bank	140,000.00	11-Dec-19	Yes	Yes	Yes
2	شرکت ساختمانی، انجینیری و سرکسازی ایسر طیفی	MCI	Ab Khaliq	Yes	Ghazanfar Bank	140,000.00	13-Oct-19	Yes	Yes	Yes
3	شرکت ساختمانی شوکت رحمانی	MCI	Qariburrahman	Yes	Azizi Bank	1,820 USD	11-Dec-09	Yes	Yes	Yes
4	شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل	MCI	Haji Abdulhadi	Yes	IBA	1,800 USD	14-Oct-19	Yes	Yes	Yes
5	شرکت ساختمانی حبید زمری	MCI	Eng. M Dawood	Yes	Azizi Bank	140,000.00	12-Dec-19	Yes	Yes	Yes
6	شرکت ساختمانی اعتماد میهن	MCI	M Nazeer Sediqi	Yes	AUB	140,000.00	10-Dec-19	Yes	Yes	Yes
No of Bids accepted										6

#1 Whether the bidder has quoted for all items of BOQ as per our requirement? (Yes/No) ; #2 Whether the bidder has quote as per our technical and commercial requirements? (Yes/No) #2 Power of Attorney attached with the bid



3995

Consumable/Packing Material/Lebalng				Estimate No.	شركة ساختمانی صياد ساحل	شركة ساختمانی، انجینيرى و سرکسازى ايسر طيفي	شركة ساختمانى شوكت مان	شركة ساختمانى و سرکسازى ايلاس فضل	شركة ساختمانى حديد زمرى	شركة ساختمانى اعتماد ميهن		
S.No	Code	Unit	Total Quantity		Unit Cost	Total Cost	Unit Cost	Total Cost	Unit Cost	Total Cost	Unit Cost	Total Cost
1	کندن کاری برای تهدابها در زمین ریگ و جفلدار	متر مکعب	2,234.00	4,475,841.00	100.00	223,400.00	300.00	670,200.00	135.00	301,590.00	200.00	446,800.00
2	سنگ کاری با مصاله نسبت 1:4 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	1,646.10		1,900.00	3,127,590.00	2,800.00	4,609,080.00	2,079.00	3,422,241.90	1,800.00	2,962,980.00
3	سنگ کاری خشکه مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	23.30		1,000.00	23,300.00	2,000.00	46,600.00	999.00	23,276.70	1,200.00	27,960.00
4	هنگاف کاری با مصاله نسبت 1:3	متر مربع	1,431.00		110.00	157,410.00	300.00	429,300.00	40.50	57,955.50	50.00	71,550.00
5	کانکریت سیخ دار (RCC) با قالب بندی مکمل با تركیب نسبت 1:1.5:3 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	1.40		9,500.00	13,300.00	13,000.00	18,200.00	9,099.00	12,738.60	11,000.00	15,400.00
6	کانکریت بدون سیخ (PCC) با قالب بندی مکمل با تركیب نسبت 1:1.5:3 مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	48.20		3,000.00	144,600.00	8,000.00	385,600.00	3,699.00	178,291.80	3,200.00	154,240.00
7	برکاری عقب دیوارها توسط مواد کندن کاری شده مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	731.00		200.00	146,200.00	250.00	182,750.00	67.50	49,342.50	100.00	73,100.00
8	تخليه کردن آب از تهداب به اساس ضرورت در استای کردن	LS	1.00		30,000.00	30,000.00	100,000.00	100,000.00	67,500.00	67,500.00	100,000.00	60,000.00
<b>Total</b>					<b>3,865,800.00</b>		<b>6,441,730.00</b>		<b>4,112,937.00</b>		<b>3,852,030.00</b>	
<b>Read Out Price</b>					<b>3,865,800.00</b>		<b>6,441,730.00</b>		<b>4,112,937.00</b>		<b>3,762,030.00</b>	
<b>Difference</b>					<b>0</b>		<b>-</b>		<b>0</b>		<b>90000</b>	
<b>Discount</b>					0%		0%		0%		5.19%	
<b>Discount amount</b>					-		-		-		200,000.00	
<b>Total evaluated price after Discount</b>					<b>3,865,800.00</b>		<b>6,441,730.00</b>		<b>4,112,937.00</b>		<b>3,652,030.00</b>	
					-610041.00		1965889.00		(362,904.00)		(823,811.00)	
					-0.14		0.44		-0.081080628		-0.184057253	
					-13.63		43.92		-8.11		-18.41	
					2		6		3		1	
											4	
											5	

۱۳

Consumable, Packing Material/Lebaling

Bid Srl	Name of Contractor	Total Bid Price as read out (AFN)	Corrections	Total Corrected Bid Price (AFN)	Unconditional Discounts		Corrected/ Discounted Bid Price	Ranking.
					Percent	Amount		
1	شركة ساختمانی و سرکسازی الياس فضل	3,762,030.00	(90,000.00)	3,852,030.00	5.19	200,000.00	3,652,030.00	1
2	شركة ساختمانی صداد ساحل	3,865,800.00	-	3,865,800.00	0.0%	-	3,865,800.00	2
3	شركة ساختمانی شوكت رحماني	4,112,937.00	-	4,112,937.00	0.0%	-	4,112,937.00	3
4	شركة ساختمانی حديد زمرى	3,834,460.00	(300,000.00)	4,134,460.00	0.0%	-	4,134,460.00	4
5	شركة ساختمانی اعتماد ميهن	4,989,700.00	-	4,989,700.00	0.0%	-	4,989,700.00	5
6	شركة ساختمانی، انجیری و سرکسازی ایسر لطفی	6,441,730.00	-	6,441,730.00	0.0%	-	6,441,730.00	6

Prepared By:

Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

٣٩٩٣

## ahad mohibi

---

**From:** ahad mohibi <ahad.mohibi@mail.gov.af>  
**Sent:** Sunday, July 28, 2019 11:41 AM  
**To:** 'monis.hossaini@mail.gov.af'  
**Cc:** 'mukhtar.omaryar@mail.gov.af'; 'Hameedullah Samim'; 'qurban.sarvari@mail.gov.af'  
**Subject:** Notification of Award of Contract for Project, MAIL/PD/NCB/W/127/98  
**Attachments:** اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار محافظوی شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی فرغه بی ولایت لغمان.pdf

On behalf of Procurement Directorate, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Dear Bidders,

As per your participation in the bidding for "MAIL/PD/NCB/W/127/98", please find the enclosed, Notification of award of Contract for your further information and acknowledgement.

Regards,

 Abdul Ahad Mohibi

Procurement Specialist

Works Unit/Procurement Directorate



اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه اعمار دیوار محافظوی شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه‌یی ولايت لغمان

mail-admin



#### تاریخ نشر

۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۵/۶

#### تاریخ ختم

۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۵/۱۳

Location لغمان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد  
بدین وسیله به تأسی از فقره (۴) ماده چهل و هشتم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تدبیر و تدارکات وزارت زراعت ایجادی و مدارای در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار دیوار محافظوی شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه‌یی ولايت لغمان را به تحریک ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل دارنده جواز نمبر (۳۴۸۴) به قیمت مجموعی سه میلیون و شش صد و پنجاه و دو هزار و سی (۳۰۰۳۴۵۲) افغانی اعطاء نمود.

اشخاص حقوقی و حکمی، افراد مجاز و موقوفه اعزامی از اعضا در زمینه ناشته باشد، می‌توانند احتجاج خواهند کرد از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توانند با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت ایجادی و مدارای واقع جمال بیمه ناخیمه می‌شون، کابل، مطابق احکام اسلام پنجمان قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نیست و می‌تواند متعارف فرقه‌الثغر و ضی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

۱۱۰



Islamic Republic of Afghanistan  
Administrative Office of the President  
National Procurement Authority

| جستجو | ارتباط با ما | سوالات و جوابهای تدارکات | بیووندها | دارندگان میراث، تدارکات | صفحه اصلی | دخول شدن به سیستم برای اعضاء | English

وضعیت کاربری

Welcome, MNasim.mail.

[Logout](#)

مسیریابی در وبسایت

صفحه اصلی ابزارهای نهادهای

دارندگان

معلومات میراث، تدارکات

بلان تدارکات

نظارت تدارکات

معلومات روزمره تدارکات

داوطلبی ها

ثبت شرکت های فرادری

قراردادهای اعطای شده

ترشیح معلومات

جت هرآن کارشناس

کارشناس

گزارشات بلان تدارکات

گزارشات نظارت تدارکات

گزارش فرادرادهای اعطای

شده

گزارش مذکوسی تدارکات


تغیر کلمه عبوری

**Online Users**

**قراردادهای اعطای شده**

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد قراردادهای اعطای شده را وارد نمایید.

Reload	Filter	لطفاً انتخاب کنید...
		لری
		نمبر تشفیصیه 6658
		عنوان پروره در Irrigation and water reservoir project
		بنوایه منظور شده
		شماره قرارداد MAIL/PD/NCB/W/127/98
		نوعیت تدارکات شناختی امور ساختمانی
		شروع قرارداد اعصار دیوار فلزی کامل شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قره بی ولایت لغمان
		تاریخ امضای 23.05.1398
		قرارداد
		قیمت قرارداد به 0 دلار
		قیمت قرارداد به 3652030 افغانی
		اعطا شده به شرکت ساختهای و سرکسازی الیش فضل
		تاریخ تکمیل 23.11.1398
		قرارداد
		ارشیو
		English
		Budget Reference Title
		پروژه آبیاری و ذخیره آب
		اصلاح عیه تکمیلی اعضا قرارداد پیومنته به تأسیی از قرارداد (2) مدد چهل و موم قلنون
		تدارکات به افلایع عموم رسانیده می شود. که ریاست کشور و تدارکات وزارت زر اشت
		آبیاری و مکاری در پیش از قرارداد پروژه اعضا دیوار حفاظتی شهیدان واقع قریه
		شهیدان ولسوالی قره بی ولایت لغمان را به شرکت ساختهای و سرکسازی الیش فضل
		شارکت خواز نیم (341684) به قیمت مجموعی 3652030 افغانی (سنه میلادی و مشتر
		صد و پیصد و دو هزار و سی افغانی) اعضا میباشند. این افراد حقیقی و حکمی که هرگونه
		اعضاض در زمینه دائمیه پیشند. میتوانند اعضا این خواص را از تاریخ شروع این اعلان الی
		7 روز تدبیسی مورخ کنیت شواد بازگشایی برای رسیدت تدارکات وزارت زر اشت. آبیاری
		و مکاری واقع جمله دائمیه سود. کل افغانستان مطابق احکام سند پیغامده قانون
		که این اعلان شرکت این اصلاح عیه به عنوان عقد قرارداد نیواد و این تکمیل معاد فوق التأکر
		و می باشد. این اصلاح عیه قرارداد متعلق تحویل داد.
		Description
	AM 12:00:00 8/14/2019	Contract Award Date
	شرکت ساختهای و سرکسازی الیش فضل	Awarded To
	AM 12:00:00 2/12/2020	Contract Complete Date
Delete	New	Edit
170 169 168 167 166 165 164 163 162 161		



4018



۱۳۹۸ / ۰۵ / ۰۶ تاریخ  
۲۶۴ شماره

آدرس: کابل، کارتہ سہ، سرک شورا  
ایمیل: dailyetilaatroz@gmail.com  
شماره تماس: +۹۳ (۰) ۷۹۷۴۳۵۷۷۷  
ویبسایت: www.etilaatroz.com

به وزارت: محترم ذراحت ج.!! مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی

ادرس:

شماره تماس:

شرح	تعداد	مبلغ	جمع کل
نشراعلان اطلاعیه اعطای تصمیم فرارداد فرارداد پروژه اعمار دیوار محافظی شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی فرغه بی ولایت لغمان را به شرکت ساختمانی ورسکسازی الیاس فضل دارنده جواز نمبر (۳۴۶۸۴) به قیمت مجموعی ۳۶۵۲،۰۰۰۰۰ افغانی (سه میلیون و شش صد و پنجاه و دو هزار و سی افغانی). ششم اسد ۹۸	۱	4000	AFN 4,000.00
جمع کل به حروف: چهار هزار افغانی.			AFN 4,000.00

نام حساب : روزنامه اطلاعات روز  
نمبر حساب : (۰۰۳۸۰۱۱۰۰۵۲۳۱۴۲)  
نام بانک: عزیزی بانک

روزنامه اطلاعات روز به شماره عنوان پیشکار افغانی می کند.

راضیه علمی


مدیر

مالی

اداری



دکرهنی، اوپولگولو اومالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: کاک ۱۳۹۸

شماره: (۵۸۶)

به روز نامه محترم اطلاعات روز!

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشعه آنرا از دارای وزارت  
محاسبه نماید.

#### اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه  
و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار دیوار محافظوی شهیدان واقع قریه شهیدان  
و لسوالی قرغه بی ولایت لغمان را به شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل دارنده جواز نمبر (34684) به  
قیمت مجموعی 3652,030.00- افغانی (سه میلیون و شش صد و پنجاه و دو هزار و سی افغانی) اعطاء نماید.  
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این  
اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال  
مینه ناحیه سوم ، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبودم و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد  
نخواهد شد.

با احترام  
محمد الله "ساحل"  
رئیس تهیه و تدارکات





دکرهنى، ابوبلگول اوامالدارى وزارت  
وزارت زراعت، آبياري و مالدارى

دافتغانستان اسلامي جمهوريت  
جمهوري اسلامي افغانستان

Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock



معينيت مالي و اداري

رياست تهيه و تداركات

آمریت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۲۵

شماره: ( ۶۸۸ )

به روز نامه محترم اطلاعات روز!

لطفاً متن ذيل را يکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشعه آنرا از دارائی وزارت  
محاسبه نمایند.

### اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه  
و تدارکات وزارت زراعت، آبياري و مالدارى در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار دیوار محافظه شهیدان واقع قریه شهیدان  
و لسوالی قرغه بی ولایت لغمان را به شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل دارنده جواز نمبر (34684) به  
قيمت مجموعی 3652,030.00 - افغانی (سه ميليون و شش صد و پنجاه و دو هزار و سی افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این  
اعلان الى 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبياري و مالدارى واقع جمال  
مینه ناحیه سوم ، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجم اعلی قانون تدارکات ارائه نمایند.


این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الى تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد  
نخواهد شد.

با احترام  
محمد الله "ساحل"  
رئيس تهیه و تدارکات



آدرس: جلال مینه، جهاز امنی کلرته سخی کابل-افغانستان، تلفون: +93 (0) 202500315، آدرس اینترنت: [www.mail.gov.af](http://www.mail.gov.af) صفحه ۱

۱۳۹۸/۵/۲۵



دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  
ریاست تهییه و تدارکات

قرارداد

پروژه اعمار دیوار محافظتی کanal شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی فرغه یی ولایت لغمان  
میان  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

و

شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/W /127/98

بودجه: کود انکشافی AFG-390676

تاریخ: ۱۳۹۸/۰/۲

7064  
4086

## فورمه موافقتنامه قرارداد

این موافقتنامه در ماه اسد سال 1398 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل دارنده جواز نمبر 34684، نمبر تشخیصی (9003482719) ایمیل آدرس SHER.ELYAS786@GMAIL.COM، شماره تماس 0775709070 واقع جاده نادر پشتون مارکت اوریا، مرکز کابل عقد گردیده است.

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجرآت در قرارداد پروژه اعمار پخته کاری دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان که در پروژه انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارای کود نمبر AFG-390676 به قیمت مجموعی 3,652,030.00- افغانی (سه میلیون و شش صد و پنجاه دو هزار و سی افغانی) پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و نخست از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

فرمایش دهنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری) (شیرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل)

عبدالهادی "رفیعی"

سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

( محل امضاء و مهر)

موقف: الیاس سرکساز

اسم: عامل احرق

( محل امضاء و مهر)

2  
4063

## شرایط خاص قرارداد

مواد شرایط عمومی قرارداد	تعدادیات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
<b>الف: مسایل عمومی</b>	
جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	میعاد رفع نواقص بعد از تاریخ تکمیل مدت یکسال میباشد.
جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	اداره وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.
جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی 6 ماه تقویمی می باشد.
جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	مدیر پژوهه: یکتن از انجینیران وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.
جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	ساحه کار امور ساختمانی واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه ای ولايت لغمان میباشد.
جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ آغاز کار امور ساختمانی: بعد از تاریخ صدور مكتوب آغاز کار می باشد.
جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	امور ساختمانی شامل اعمار دیوار محافظه کاری شهیدان میباشد.
بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	تکمیل قسمت وار بقابل تطبیق نیست.

<p>اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد و شامل قرارداد می باشند.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- موافقتنامه؛</li> <li>2- نامه قبولی آفر؛</li> <li>3- آفر قراردادی؛</li> <li>4- شرایط خاص قرارداد؛</li> <li>5- شرایط عمومی قرارداد؛</li> <li>6- مشخصات تخفیفی؛</li> <li>7- نقشه ها؛</li> <li>8- بل احجام کاری؛</li> </ul>	<p>جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>زبان قرارداد یکی از زبان های رسمی کشور میباشد. زبان قرارداد همان زبان آفر میباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>قانون نافذ بر این قرارداد قوانین جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.</p>	
<p>جدول فعالیت های قراردادی دیگر قابل تطبیق نمیباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>کارمندان کلیدی یک مدیر قرارداد یعنی انجیر با 5 سال تجربه در اجرای قراردادهای امور ساختمانی که دارای ماهیت و حجم معادل و مشابه، به شمول اینکه به حیث مدیر پروژه برای مدت حداقل سه سال تجربه داشته باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>مبلغ حداقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: (تهیه بیمه از وجایب ومکلفیت داوطلبان میباشد و شامل موارد ذیل می باشد).</p> <p>برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد ( ) افغانی</p> <p>برای زیان پا خساره به تجهیزات همیلت تعویضی آن (تجهیزات مربوطه) پرداخته میشود.</p> <p>برای زیان پا خساوه به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات ( ) افغانی</p> <p>مرگ یا خستگی به کارمندان:</p> <p>کارمندان قراردادی از ( ) افغانی در هر رویداد</p> <p>افراد دیگر ( ) افغانی</p> <p>بیمه مطابق ماده 13 شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق است</p>	<p>بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد</p>

(1) گزارشات بررسی ساحه نظر بر تقاضا داوطلبان ارایه خواهد گردید.	بند 1 ماده 14 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات ارائه می نماید	بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست اداری می باشد.	بند 1 بند 21 شرایط عمومی قرارداد
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد (مرکز حل و فصل منازعات تجاری افغانستان) میباشد. محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.	ماده 62 شرایط عمومی قرارداد
<b>ب. کنترول زمان</b>	
قراردادی پلان کاری امورساختمانی را در جریان 10 روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تأیید، ارائه مینماید.	بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 سی روز میباشد.	بند 3 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، پرداخت 30,000 الی ارائه پلان کاری تجدید شده معطل قرار می گیرد.	
<b>ج. کنترول کیفیت</b>	

<p>میعاد رفع نواقص (یک سال) میباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 33 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>1. پرداخت بعد از تکمیل کار نظر به فیصدی بعد از ارائه گزارش از جانب فرمایش گیرنده و تصدیق نماینده وزارت زرارت، آبیاری و مالداری پرداخته میشود.</p> <p>2. پول فرمایش گیرنده در چهار قسط پرداخته میشود که در قسط اول 25 فیصد بعد از 25 فیصد تکمیل کار، در قسط دوم 25 فیصد بعد از 50 فیصد تکمیل کار، در قسط سوم 25 فیصد بعد از 75 فیصد تکمیل کار، و در قسط چهارم 25 فیصد بعد از 100 فیصد تکمیل کار پرداخته میشود.</p> <p>پرداخت های بعدی در جریان کار قرار فوق در مقابل گزارشات پیشرفت کار انجام شده بعد از تصدیق مراقبت کننده از جانب فرمایش دهنده صورت میگیرد.</p>	<p>بند 1 ماده 41 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p><b>د. کنترول مصرف</b></p>	
<p>قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعديل نیست" و معلومات ذیل در مورد ضرایب "قابل تطبیق نیست"</p> <p>ضرایب تعديل قیم قرارذیل میباشند:</p> <p>برای واحد پول /افغانی:</p> <p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>به واحد پول { واحد پولی درج گردد} :</p> <p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد پول افغانی، {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد پولی بین المللی مشخص شده {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد او/از جانب اداره تأیید میگردد}</p> <p>شاخص I / اسعار به استثنای واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی {شاخص درج گردد} میباشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد}</p>	<p>بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد</p>

بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد	فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 10٪ ده فیصد میباشد. تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورانسی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد
بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد	اندازه جریمه تاخیر (0.05) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 57 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد، درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.
بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد	انعام برای انجام تمام امور ساختمان : نظر به لزوم دید فرمایش دهنده.
بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد	پیش پرداخت صفر فیصد و پیش از صفر پرداخت میگردد. لازم نیست
بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد	مبلغ تضمین اجرا (پنجم 5) فیصد مجموع قرارداد میباشد. تضمين اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط.
<b>هـ ختم قرارداد</b>	
بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.
بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	ذیل حکایت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد مبلغ 20000 از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید.
جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد	حداکثر تاخیر 100 روز میباشد. تعداد روز ها باید در مطابقت به بند 1 ماده 49 جریمه تاخیر شرایط خاص قرارداد می باشد.

<p>فیضی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی</p> <p>مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کارباقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در میعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.</p>	<p>بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد</p>
--	--

#### قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

شرط عمومی قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد.

این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تعغیرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با بالملقطع نیز استفاده میگردد.

##### الف: عمومیات

###### ماده 1- تعریفات

1- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:

1- **بل احجام کار:** احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند.

2- **حوادث قابل جبران:** حوادث که در ماده 44 شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.

3- **تاریخ تکمیل:** تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند 1 ماده 55 شرایط عمومی قرارداد.

4- **قرارداد:** موافقنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند 2 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد می باشد.

5- **قراردادی:** شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.

6- **آفر قراردادی:** آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.

7- **قیمت قرارداد:** قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعديلات بعدی وارد مطابق قرارداد می باشد.

8- **روز:** روز تقویمی می باشد.

9- **مزد کار:** کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیضی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد.

10- **نواقص:** قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.

**11-سنند تصدیق رفع نواقص:** تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد.

**12-میعاد رفع نواقص:** میعاد قبل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند 1 ماده 35 شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.

**13-نقشه ها:** در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد.

**14-اداره:** طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.

**15-تجهیزات:** ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگرددند.

**16-قیمت ابتدایی قرارداد:** قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.

**17-تاریخ تخمینی تکمیل:** تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسريع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.

**18-مواد خام:** تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.

**19-تاسیسات:** منضمات امور ساختمانی که دارای عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد.

**20-مدیر پروژه:** شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسؤولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.

**SCC-21:** به معنی شرایط خاص قرارداد است.

**22-ساحه کار:** ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.

**23-گزارش بررسی ساحه:** شامل شرط‌نامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد توضیعت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

**24-مشخصات:** مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات واردہ یا تأیید شده توسط مدیر پروژه می باشد.

**25-تاریخ آغاز کار:** تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد.

**26-قراردادی فرعی:** شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.

**27- ساختمان های مؤقت:** ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده

توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.

**28- تعديل:** امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.

**29- امور ساختمانی:** شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت،

آماده ساختن ساحه، حفريات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن

(برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن)

است که مطابق مندرج قرارداد. انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی

از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.

**2.1** بمنظور تفسیر **شرايط عمومي قرارداد**، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار  
برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکور یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید.  
عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت  
مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پروژه به پرسش ها در مورد **شرايط عمومي قرارداد**،  
وضاحت ارائه می نماید.

ماده 2- تفسیر

**2.2** در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در **شرايط خاص قرارداد**،  
اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل  
به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل  
برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.

**2.3** اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردند:

1- موافقتنامه؛

2- نامه قبولی آفر؛

3- آفر قراردادی؛

4- شرایط خاص قرارداد؛

5- شرایط عمومی قرارداد؛

6- مشخصات تخفیکی؛

7- نقشه ها؛

8- **هل انجام کاری و**

9- **سیابر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.**

ماده 3- زبان و قانون  
قرارداد

**3.1** زبان و قانون نافذ بر قرارداد در **شرايط خاص قرارداد** بیان گردیده است.

ماده 4- تصاميم مدیر  
پروژه

**4.1** مدیر پروژه تأمیندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می  
نماید. مگر اینکه طور دیگری در **شرايط خاص قرارداد** تذکر رفته باشد.

ماده 5- واجداری

**5.1** مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص  
دیگری، محول یا مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.

6.1 هر گونه ارتباط برقرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هر گونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد.	ماده 6- ارتباطات
7.1 قراردادی باید اداره را کتبیاً در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبل از آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. و اگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسؤولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.	ماده 7- عقد قرارداد های فرعی
7.2 در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی و اگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.	
8.1 قراردادی ساحه کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قراردادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.	ماده 8- سایر قراردادی ها
9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پژوهه تأثید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پژوهه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.	ماده 9- کارمندان
9.2 مدیر پژوهه می تواند ذرخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.	
10.2 اذاره و قراردادی هر گدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشد.	ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی
11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:	ماده 11- خطرات مربوط اداره
1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از: (1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا پذیر امور ساختمان باشد؛ یا	

(2) غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی

2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که ساقه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.

11.2 خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد:

1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛

2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا

3- فعالیت های قراردادی در ساقه بعد از تاریخ تکمیل.

12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤولیت قراردادی می باشد.

ماده 12- خطرات  
مربوط به قراردادی

13.1 قراردادی مکلف است یوشن بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد:

ماده 13- بیمه

1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛

2- زیان یا خساره تجهیزات؛

3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قراردادی و

4- صدمه شخصی یا مرگ.

13.2 قراردادی پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.

13.3 در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.

13.4 هرگونه تغییر در شرایط پالیسی بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.

13.5 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.

ماده 14- گزارش تحقیق ساحه	14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج <b>شرایط خاص قرارداد</b> و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.
ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد	15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد <b>شرایط خاص قرارداد</b> ، توضیحات ارائه می نماید.
ماده 16- قراردادی	16.1 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخریکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.
ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان	17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.
ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروژه	18.1 قراردادی مشخصات تخریکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تأیید ارائه می نماید.
	18.2 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های مؤقت را متاثر نمی سازد.
	18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های مؤقت را متاثر نمی سازد.
	18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.
ماده 19- اینمنی	18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروژه تأیید گرددند.
ماده 20- اکتشاف	19.1 قراردادی مسئول اینمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.
ماده 21- ملکیت ساحه	20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه <b>موضوع زایه اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ</b> طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.
ماده 22- دسترسی به ساحه	21.1 اداره تمام ساحجه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ <b>مندرج شرایط خاص قرارداد</b> در اختیار قراردادی قرار ندهد، تأخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.
ماده 23- دستور، تفتيش و بررسی	22.1 قراردادی <b>اجازه دسترسی</b> ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد.
	23.1 قراردادی تمام دستایر مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.
	23.2 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی

	حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واحد شرایط بودن می گردد.	
24.1	در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم ، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد.	ماده 24- منازعه
24.2	مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.	
<b>ب. کنترول زمان</b>		
25.1	قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج <b>شرایط خاص قرارداد</b> ، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های امواساختمانی را جهت تأییدی به مدیر پروژه ارائه نماید.	ماده 25- پلان کاری
25.2	پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلیل فعالیت ها باشد.	
25.3	قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده <b>شرایط خاص قرارداد</b> ، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج <b>شرایط خاص قرارداد</b> از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.	
25.4	تأیید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و اagues قبل جبران می باشد.	
26.1	مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قبل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.	ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل
26.2	مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قبل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموضع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مدنظر گرفته نمیشود.	
27.1	در طور تپکه اداره خواهانی تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و توسط اداره و قراردادی تائید میگردد.	ماده 27- تسریع
27.2	پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.	
28.1	مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.	ماده 28- تأخیر سفارش شده توسط مدیر پروژه
29.1	اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند 1	ماده 29- جلسات مدیرت

ماده 32 می باشد.

29.2 مدیر پروره اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کاپی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروره تعیین می گردد.

30.1 قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروره را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمينی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروره ارائه می نماید.

30.1 قراردادی با مدیر پروره در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط نوسط اشخاص ذی دخل و جهت انجام دستور مدیر پروره، همکاری می نماید.

ماده 30- هشدار زود هنگام

### ج. کنترول کیفیت

31.1 مدیر پروره کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤولیت قراردادی ندارد. مدیر پروره دستور جستجو و بر ملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروره دارای نواقص است، بررسی می نماید.

ماده 31- تشخیص نواقص

32.1 در صورت دستور مدیر پروره جهت انجام آزمایش که در مشخصات تختیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.

ماده 32- آزمایش

33.1 مدیر پروره قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از ميعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. ميعاد رفع نواقص الى تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.

ماده 33- تصحیح نواقص

33.2 قراردادی هر نوافض اطلاع داده شده توسط مدیر پروره را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می نماید.

ماده 34- نواقص تصحیح نا شده

34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروره، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروره مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع نماید.

### د. کنترول مصارف

35.1 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط

ماده 35- بل احجام

کاری <sup>۱</sup>	قراردادی اجرا میگردد، می باشد.
ماده 36- تغییر مقدار <sup>۲</sup>	35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمن انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.
ماده 37- اضافه کاری و کم کاری <sup>۳</sup>	36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.
ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها	37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.
ماده 39- تخمین	38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.
ماده 40- تصدیقنامه پرداخت ها	38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبل ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.
ماده 41- بول نقد	38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.
ماده 42- تصدیقنامه پرداخت ها	38.4 در صورتیکه به نسبت استجعالت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می شود.
ماده 43- ارزش اموال	38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.
ماده 44- تصدیقنامه پرداخت ها	39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری <sup>۴</sup> ، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.
ماده 45- تصدیقنامه پرداخت ها	40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمن انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.
ماده 46- تصدیقنامه پرداخت ها	40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.
ماده 47- ارزش اموال	40.3 ارزش اموال ساختمن انجام شده توانسته مدیر پروژه تشخیص میگردد.
ماده 48- ارزش اموال	40.4 ارزش اموال ساختمن انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری <sup>۵</sup> تکمیل شده می باشد.

<sup>۱</sup>در قرارداد با پرداخت بالامقطع بل احجام کاری حذف و بجا آن جدول فعالیت و بند ۱ ماده 37 شرایط عمومی قرارداد با بند ۲ ماده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:

بند ۱ ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را در جریان ۱۴ روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.

بند ۲ ماده 37 در صورت موارد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.

<sup>2</sup>در قرارداد با پرداخت بالامقطع بل احجام کاری حذف و بجا آن جدول فعالیت و ماده 38 شرایط عمومی قرارداد با بند ۱ ماده 38 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:

بند ۱ ماده 38 تعدل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید

<sup>3</sup>در قرارداد با پرداخت بالامقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد

	40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد.	
	40.6 مدیر پرژوهه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.	
ماده 41- پرداخت ها	41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرماً می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گرد.	
	41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.	
	41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.	
ماده 42- وقایع قابل جبران	42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد: 1- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند 1 ماده 21 شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده است. 2- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متاثر می سازد؛ 3- مدیر پرژوهه دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تخریکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛ 4- مدیر پرژوهه دستور بر ملاساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، نواقص ثبت نمی گردد؛ 5- مدیر پرژوهه بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛ 6- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشملوں گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛ 7- مدیر پرژوهه دستور حل وضیعت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل ایمنی یا سایر دلایل لازم باشد؛ 8- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتشی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که تأثیر پیش بینی یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛ 9- تأخیر در پرداخت پیش بینی از اداره توسط اداره 10- تأثیر خطای مربوط اداره به قراردادی؛ 11- تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلایل نا معقول از جانب مدیر پرژوهه؛	
	42.2 در صورت وقوع حاده قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد. مدیر پرژوهه تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.	
	42.3 در صورت ورود خسarde به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.	

<sup>4</sup> در قرارداد با پرداخت بالملقطع، این پاراگراف شکل زیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول فعالیت می باشد".

ماده 43- مالیه

43.1 مدیر پروره قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بنشمول مالیه بر معاملات انتفاعی (BRT)، و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسليمه آفرها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعديل می نماید. این تعديل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبلاً در قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.

ماده 44- اسعار

44.1 در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.

ماده 45- تعديل قیم

45.1 تعديل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در **شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.**

ماده 46- تأمینات

46.1 اداره الى ختم تمام کار، قسمتی از پول هر پرداخت را که در **شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.**

ماده 47- جریمه تاخیر

47.1 جریمه تاخیر به نرخ فی روز مندرج **شرایط خاص قرارداد** برای روز های تاخیر محاسبه میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تاخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتاد طرز العمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فيصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 **شرایط عمومی قرارداد** فسخ میگردد. پرداخت جریمه تاخیر تاثیری بر مسؤولیت های قراردادی ندارد.

ماده 48- مكافات

47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تاخیر، مدیر پروره هرگونه اضافه پرداخت جریمه تاخیر توسط قراردادی را با تعديل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.

ماده 49- پیش پرداخت

48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مكافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مكافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروره **صورت گرفته است**) **شرایط خاص قرارداد**، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروره کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرانرسیده است تصدیق می نماید.

49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ ~~و اسکیوال معادل~~ پیش پرداخته به مبلغ و تاریخ مندرج **شرایط خاص قرارداد**، به قراردادی پرداخت ~~می تمهیل~~<sup>می تمهیل</sup> پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اداره باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکثنه وضع نمیگردد.

49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کاپی های انوایس ها یا دیگر اسناد را به مدیر پروره ارائه می نماید.

49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز

پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعدیل قیم، حادثه قابل جبران، مکافات، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.

50.1 داوطلب برنده در مدت 10 روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.	ماده 50- تضمینات
51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروره انجام یافته باشد، استفاده می گردد.	ماده 51 - مزد کار
51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قبل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فормه های تأیید شده توسط مدیر پروره ثبت می نماید. هر فورم تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروره تصدیق و امضاء می گردد.	
51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورم های امضاء شده، صورت میگیرد.	
52.1 قراردادی بمصرف خود، مسؤولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.	ماده 52- مصارف ترمیم
ح. اختتام قرارداد	
53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروره درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروره بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید.	ماده 53- تکمیل
54.1 اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساقه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.	ماده 54- تسلیمی
55.1 قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروره ارائه می نماید. مدیر پروره تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را نز جریان (56) روز، که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر این، مدیر پروره در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودی لازم را صادر می نماید در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروره تصمیم دارد مبلغ قبل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.	ماده 55- حساب نهایی
56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید.	ماده 56- رهنمود عملیاتی و مراقبت
56.2 در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده شرایط خاص قرارداد از جانب قراردادی یا عدم تأییدی آن از جانب مدیر پروره، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.	

ماده 57- فسخ قرارداد

57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.

57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:

1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تأیید نگردیده باشد؛

2- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز اصراف از این دستور صورت نگرفته باشد؛

3- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی

4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛

5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و

6- در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.

57.3 علرغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.

57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.

ماده 58- فساد و تقلب

58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد.

58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد.

58.3 اداره، داوطلبی، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:

1- فساد: غایرت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرجیز با ارزشیکه به صورت غیرنحوی کارکردهای جانب دیگر<sup>۵</sup> (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.

2- تقلب: ارتکاب هرگونه قیوچاری به شمول کتمان حقایق که عمدآ و یا سهوآ به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.

3- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قرارداد نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

4- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

<sup>5</sup> به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.

<sup>6</sup> به شرکت کننده های پروسه تدارکات (بشمل مقامات دولتی) که قصد سازش با کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند، اطلاق میگردد

۵- ایجاد اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برزنه ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربخط ارجاع می نماید.

اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتيش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.



58.4 هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهاییکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.

59.1 در صورت فسخ قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروژه تصديقنامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفرقی پیش پرداخت پرداخت شده الی تاریخ صدور تصديقنامه و فيصدى قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل نашده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می نماید. جریمه تأخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محاسب می گردد.	ماده 59- پرداخت بمحض فسخ
59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصديقنامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفرقی پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور تصديقنامه را صادر می نماید.	
60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.	ماده 60- ملکیت
61.1 در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره یا قراردادی متأثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصديقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصديقنامه و کار ها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصديقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد.	ماده 61- عدم امکان تطبیق قرارداد
<p><u>62.1 حل منازعه بطور دوستانه:</u></p> <p>1- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند.</p>	ماده 62- حل منازعه
<p><u>64.1 مرجع حل و فصل منازعات:</u></p> <p>2- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مرجع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد.</p>	
<p><u>64.2 حکمیت:</u></p> <p>3- در صورت عدم قناعت هر چهاری از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (28) روز از تهمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.</p>	



فورمه تسلیمی آفر

فورمه امور ساختمانی کوچک/01

داوطلب این فورمه را خانه پری ۽ همراه با آفر خویش تسلیم می نماید.

## اداره؛ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/127/98

عنوان تدارکات: اعماد دیوار محافظه کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی و لایت لغمان مایان که در زیر این فرم امضا نموده ایم، اظهار مینماییم اینکه:

ما شرطنامه را دقیق مطالعه کردیم و هیچ ملاحظه‌یی در قسمت آن شامل شمایله شماره: گشتماره و تاریخ صدور شمایله در صورت نزدیک درج گردید، نداشته و پیشنهاد اجرای عینوان و نمایر شناختی قرارداد در مطابقت به شرایط عمومی قرارداد به

قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هر گونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از: قیمت مجموعی آفر یه خروف و از قائم سانکر مبالغ مختلف و اسعارهای مربوطه در ج گردیده باشد.

(١) شانه خواهی داشت و تخفیفات راه حکم فریدن را در آن می‌دانست.

(2) قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام.....

قابل احرا است، با حوشیت آن مشخص کنید:

ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ **هزار و سیصد** به ارقام و حروف درج شده را منحیت پیش پرداخت درخواست می نمائیم.

ما میدانیم که اداره مکلف به قبولي آفر دارای نازلترين قيمت ازaine شده و يا هر آفر دريافت شده ديگر نیست.

ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفتو تر مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد.

هرگاه آفرماق بیان شود، ما تعهد می‌سپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با بند ۱ ماده ۳۵ دستورالعمل برای داوطلبان، بخاطر اجرای موقع قرارداد فراهم می‌نماییم؛

ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اكمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند ۱ ماده ۴ دستور العمل برای دادوطلبان می باشیم.

اما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند 2 ماده 4 دستور العمل برای داوطلبان، نداریم.

ما بشمول قراردادیان پرداختی داروطنابان، محروم شناخته نشده ایم.  
4 دستورالعملین پرداختی داروطنابان، محروم شناخته نشده ایم.

اعمار دینه از محافظتی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه یی ولايت لغمان

MAIL/PD/NCB/W/127/98



دیلکتسنستان اسلامي جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان  
Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock



معینت فیباری و منفع طبیعی

ریاست ابیاری

امربیت انجیری

Province : Laghman

District : Qarghayi

Village : Shahedan

Project : Shahedan Canal Protection Wall

ولایت : لغمان

لوسوالی : قرغه بی

قریه : شهدان

پروردہ : دیوار محافظوی کاټل شهدان


شماره	تفصیل امور	ملاحظہ	قیمت مجموعی	قیمت فیلات	تخمینی به افغانی	تخمینی به افغانی	حجم	واحد
1	کند تکاری برای تهدابها در زمین ریگی و چندر						2234	متر مکعب
2	سنگ کاری با مصالله نسبت 1:4 مطابق به مشخصات نقشه						1646.1	متر مکعب
3	سنگ کاری خشکه مطابق به مشخصات نقشه						23.3	متر مکعب
4	هنگاف کاری با مصالله نسبت 1:3						1431	متر مربع
5	کانگریت سیخ دار (RCC) با قالب بندی مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3 مطابق با مشخصات نقشه						1.4	متر مکعب
6	کانگریت بون سیخ (PCC) با قالب بندی مکمل با ترکیب نسبت 1:1.5:3 مطابق با مشخصات نقشه						48.2	متر مکعب
7	پرکاری عقب دیوارها توسط مواد کندن کاری شده مطابق به مشخصات نقشه						731	متر مکعب
8	تخلیه کردن آب از تهداب به اساس ضرورت در اسنای کارکرد						1	LS
مجموع قیمت تخمینی به افغانی								
سیمیون هفتاد و سی سو هزار روپیه								

قرار شرح فرق جدول برآورد اول امور کاری پروردہ ( دیوار محافظوی کاټل شهدان ) ولوسوالی قرغه بی و لایت لغمان غرض اجر ایت بعدی ترتیب و تقدیم است.

محمد زمان انجیر پراورد :

عبدالرحمن انجیر لیزان :

الخطیر مسالا (اکبر) :



4041

جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت تجارت و صنایع  
ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری


د افغانستان اسلامي جمهوریت  
د داګستاني او صنایعو وزارت  
د مرکزی ثبت او فکری مالکیت لوی ریاست

Reg #: 108497  
License #: 34684

**Islamic Republic of Afghanistan**  
**Ministry of Commerce and Industries**  
Directorate General of Central Business Registry & Intellectual Property

د ثیت نمبر: ۱۰۸۹۹۷  
د جواز نمبر: ۳۴۶۸۴

تکمیر شناسی مالیہ / TIN  
9003482719



جواز تثبت  
Business License

ثبت اتفاقی: فضل الحق هوٹک ولد عبدالهادی  
عنوان تجاري: سالمتمانی و سرکسازی الیاس فضل  
Illyas Fazal Construction & Road Building


نصدیق کیوی دا جواز چې لوم نې پورته یاد شوي دي د افغانستان د نالدہ قوانینو پر پنسټ ثبت او صادر شو.

صدقیق میگردد این جواز که نام آن بر فوق ذکر میباشد، در مطابقت با قوانین تافله افغانستان ثبت و صادر گردیده است.

**It is certified that this license with mentioned name, is registered and issued in accordance with and subject to the effective laws of Afghanistan.**


**درس تعداد:** پهلاو نسل پشتون مارکھت اوږیا، مرکز کابل، کابل

طارق احمد سرفراز



نمبر مسلسل: ٠٤٣٥

4039



# ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

**MAIL**

IRRIGATION DIRECTORATE

Engineering Department

Project name: (Shahedan Canal Protection Wall )

Province: Laghman

District :qarghayi

Village: Shahedan

Kabul,Afghanistan

15-9-2018

24,6, 1397

# INDEX SHEET

4038

SHEET No.	DRAWING TITLES	REMARKS
1	INDEX SHEET	
2	GENERAL REQUIREMENT OF MATERIALS	
3	SITE PLAN	
4	Plan of Canal protection walls	
5	Section A-A to F-F	
6	Section G-G to L-L	
7	Section M-M to R-R	
8	Location of costruction on Section-A,B,C,D	
9	Location of costruction on Section-E,K,L,M	
10	Location of costruction on Section-F,G,N,O	
11	Location of costruction on Section-H,I,P,Q	
12	plan of superpsage      Section 1-1      Section 2-2	
13	PROPOSED PROTECTED STONE PICHTING WITH WALL	
14	Section 3-3	
15	Section C-C	



4/07

## GENERAL REQUIREMENT FOR THE CONSTRUCTION OF IRRIGATION STRUCTURES

### GENERAL NOTES:

#### SURVEYING:

BENCH MARKS COORDINATES TABLE				
Point #	Northing	Easting	Elevation	Description
370	3819724.61	591495.43	711.27	BM1
371	3819730.46	591518.02	711.24	BM2

#### Hydraulic Data:

The Hydraulic design usually involves a general procedure that is essentially the same for each case. Some of the basic components inherent in the design of any hydraulic structure include data: surveys of existing characteristics, estimates of future characteristics, engineering design criteria, discharge estimates, structure requirements and constraints and receiving facilities.

#### 1. River hydraulic Data:

- $Q_{max} = 0$  cumecs
- $V_{max} = 0$  m/s. River slope = 0, MWL=0 GLB=0

- 2: canal hydraulic Data  
 $V_{max} = 0.68$  m/s  
 $Q_{max} = 0.46$  m/s  
canal slope=.0012  
common area =220 hectar


#### GENERAL Specifications:

1. All elevations given in Meter, are based on the local benchmarks as shown on the site plan.
2. All dimensions are in Centimeter unless otherwise shown.
3. All Masonry Cutoff Wall should be with mortar 1:4.
4. Bitumen should be used in all construction joints.
5. All Plain Cement concrete should be 1:2:4(M 150) or as specified.
6. Provide construction joint for stone masonry wall at 15-20m.
7. Shuttering can be removed after 16-24 hours.
- Side of beams,walls,columns : 16-24 hours.
- Forms from beneath the slabs(spanning up to 6m) 14 days
- Forms from beneath the slabs(spanning above 6m) 28days
- Height and length of retaining wall should be adjusted to site condition.
- During the cold weather, concreting should be stop or the contractor has to consider the cold weather concreting procedure.
- Weight per unit volume of concrete W=2400 kgf/m<sup>3</sup>
- Concrete design based on a compressive strength of fc =200 kg/cm<sup>2</sup> or as specified.
- The Max slump should be between 5-7.5 cm.
- Mixer machine and vibrator must be used in all RCC casting.
- Stone pitching shall comprise 300 mm size stones minimum, and packing stone of 100 mm size minimum for wedging and to fill gaps under the pitching stone.
- Stone masonry work with mortar, mortar ratio cement : sand ( 1:4 )
- Construction joints shall be located where show non the Drawings or permitted by the Supervisor.
- All mortar for pointing 1:3 , stone masonry 1:4 and RCC 1:1.5:3 (M:200)
- Placing and/or finishing concrete at night shall be with adequate lighting and by written permission of the Supervisor.
- Minimum clear cover to main reinforcement bar :
- a) for RCC elements :
  - bottom bar: 5 cm
  - Side bar: 5 cm
- b) Members permanently exposed to water/soil: 7.5 cm
- All exposed surfaces to water of stone masonry should be pointed.
- Location of the structure, setting out and elevations to be confirmed by the Engineer before construction.
- The contractor shall construct and maintain all necessary channels, diversions and other temporary works necessary to ensure that irrigation water supplies are not interrupted during construction works.
- Site engineer should check all design and existing elevations and adjust the structure according to the site because the river bed is changing season by season and the bed is scoured.

#### Abbreviations :-



- R.B = River Bed
- MWL = Maximum Water Level
- RCL =River Center line
- EWL= Existing Water Level
- TP.Wall= Top of Wall
- B.C= Bed of Canal
- C.C= Center of canal
- Tp.C= Top of Canal

25-26

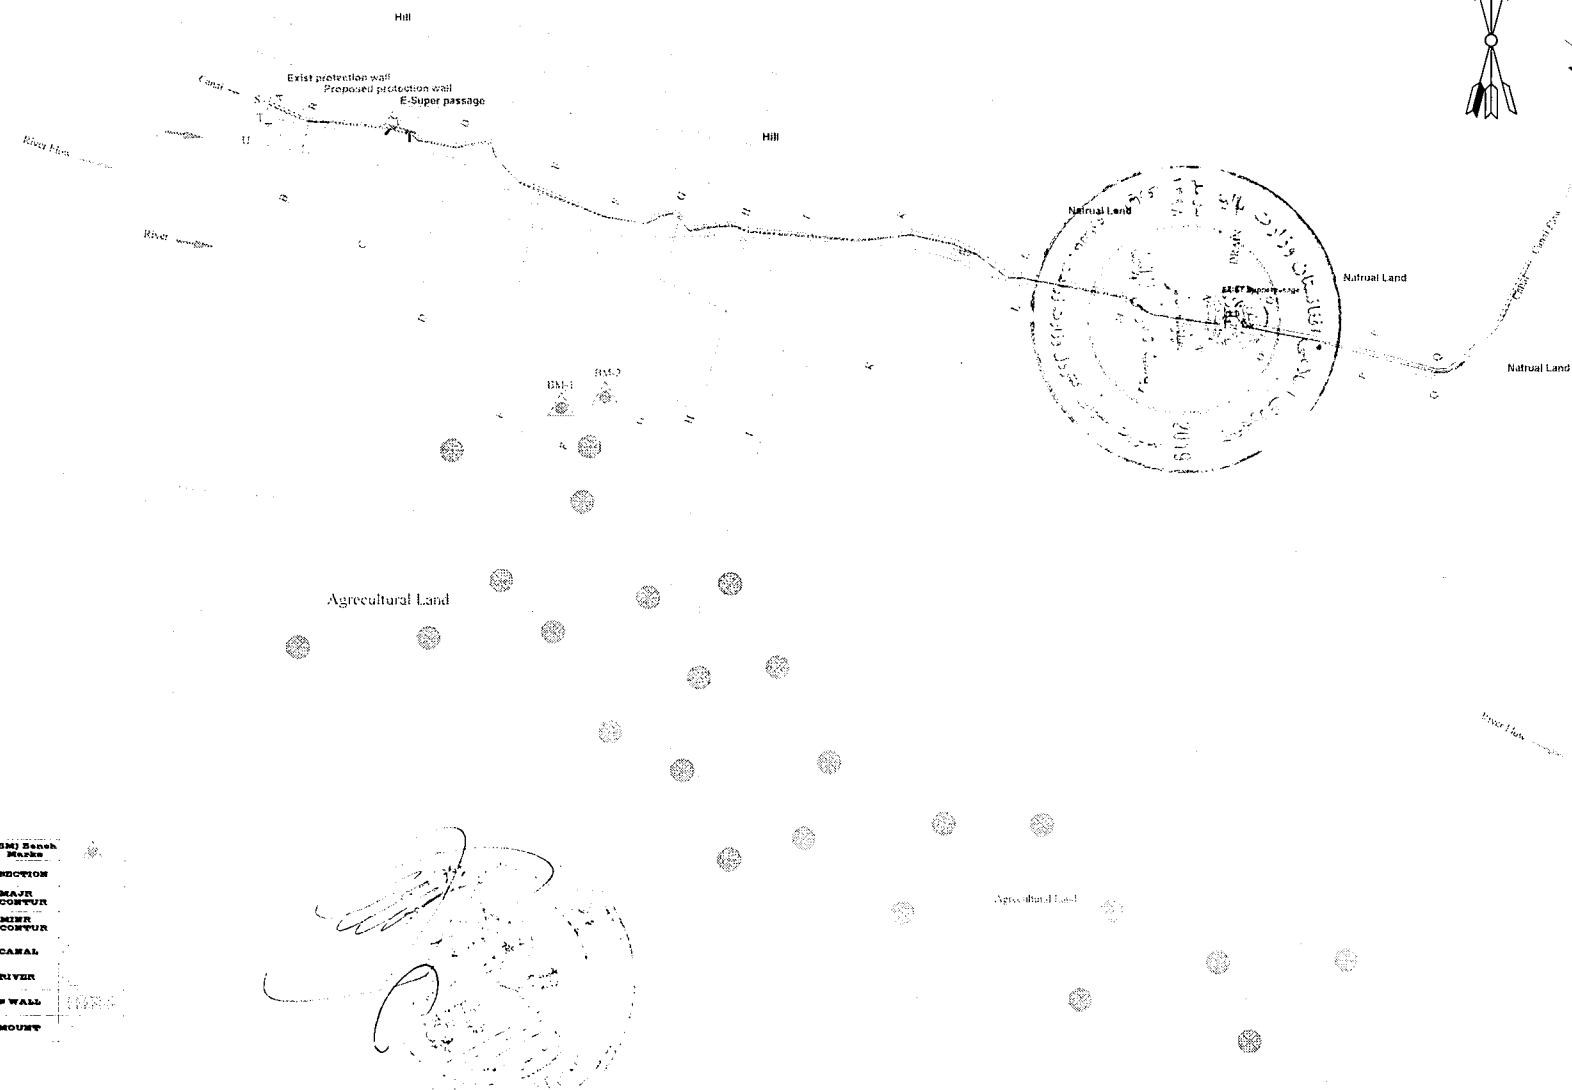

Site Plan of Shahedan Canal Protection Wall

400



J

H

I

G



E

BM-1



F

D

C

Canal  
S  
T  
A  
B  
C  
D  
E-Super passage  
Proposed protection wall  
Exist protection wall

0.500

0.274

Water Flow

K

Natrual Land

K

Proposed protection wall

Exist walls

DRAIN

Supperpasage

M

A

J

Natrual Land

Natrual Land

Canal S

Water Flow

O



P

Q









### CANAL PROTECTION WALL PLAN TL=690m


400

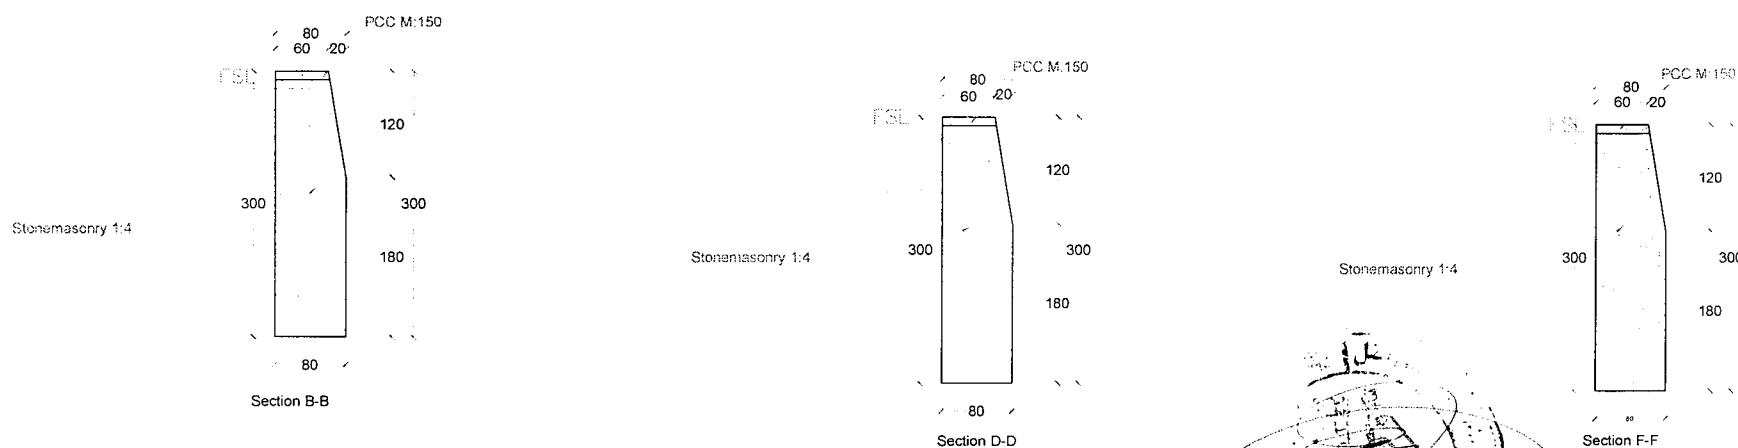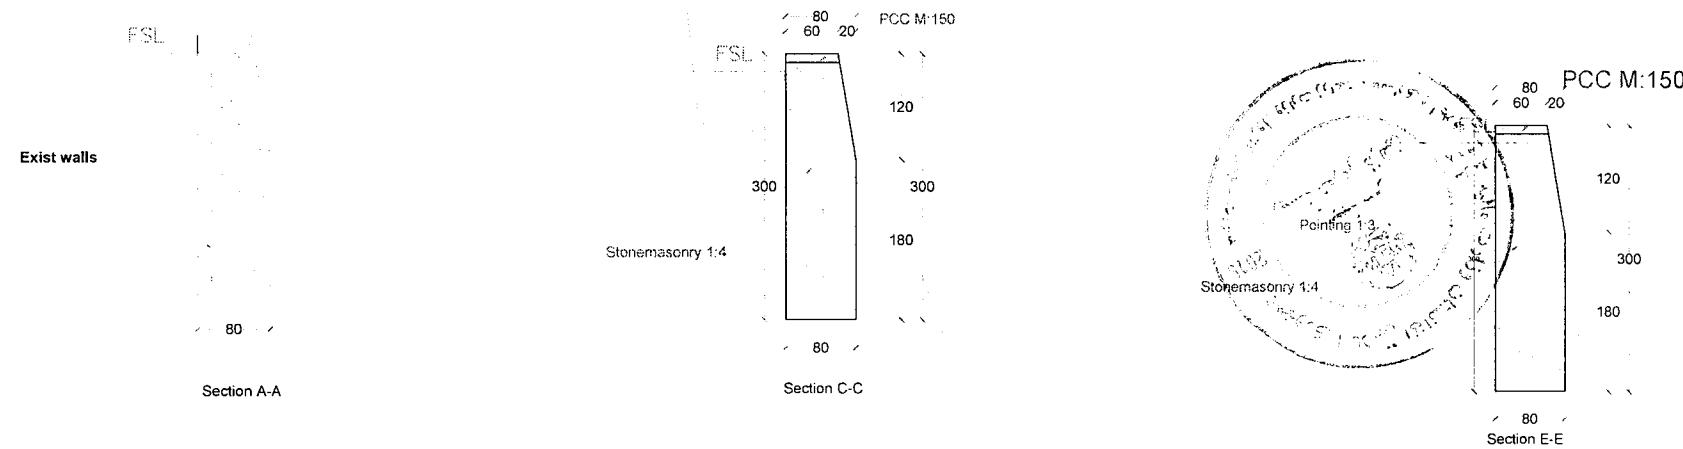

CCS 4

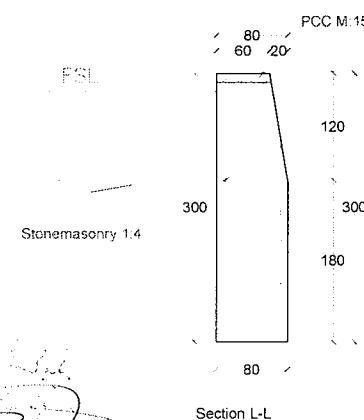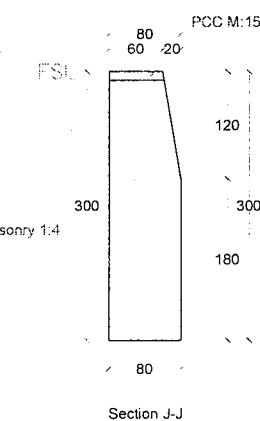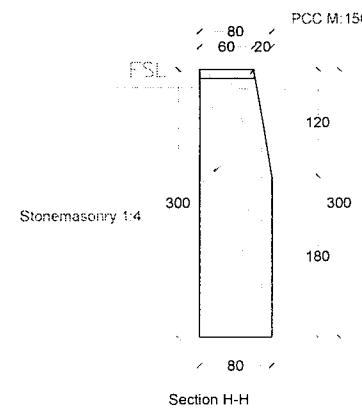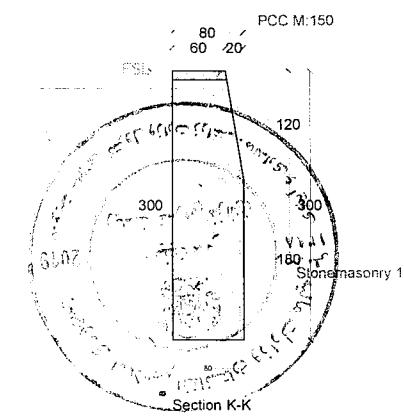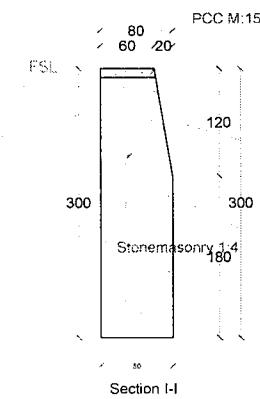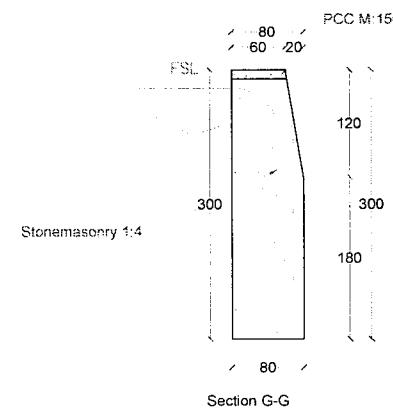


FSL


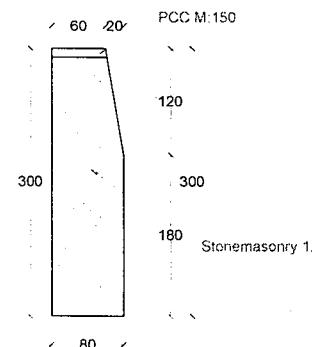


Section M-M



FSL



FSL



Section N-N



SURVEYED BY Eng.M Yunos & Samandar  
DRAWN BY Eng.Abdulrahman amin  
DESIGNED BY Eng.Abdulrahman amin

REVIEWED BY  
Eng. Salar

CHECKED BY  
Eng. Salar

APPROVED BY

Eng. Salar

SCALE

Not to scale

DATE

15/9/2018


PROVINCE

DISTRICT


VILLAGE

REVISION NO. Revised

PROJECT NAME: Shahedan Canal Protection Wall  
DRAWING TITLE: Location of construction on Section-A,B,C,D

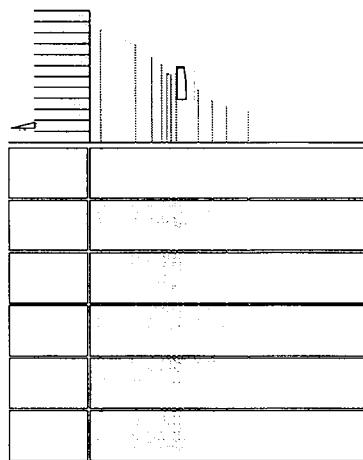

Section A-A

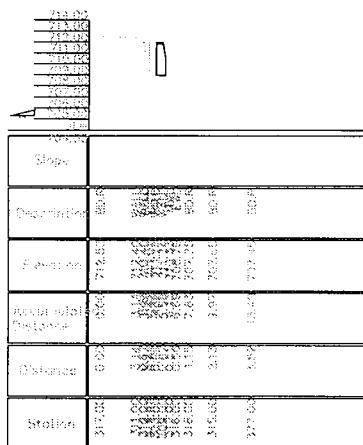

Section C-C

Station	Distance	Elevation	Accumulated Distance	Description	Slope
372.00	0.00	225.34	225.34	Start	-
372.00	0.22	225.67	225.67	Point 1	0.22
372.22	0.22	225.90	225.90	Point 2	0.22
372.44	0.22	226.13	226.13	Point 3	0.22
372.66	0.22	226.36	226.36	Point 4	0.22
372.88	0.22	226.59	226.59	Point 5	0.22
373.10	0.22	226.82	226.82	Point 6	0.22
373.32	0.22	227.05	227.05	Point 7	0.22
373.54	0.22	227.28	227.28	Point 8	0.22
373.76	0.22	227.51	227.51	Point 9	0.22
374.00	0.22	227.74	227.74	Point 10	0.22
374.22	0.22	227.97	227.97	Point 11	0.22
374.44	0.22	228.20	228.20	Point 12	0.22
374.66	0.22	228.43	228.43	Point 13	0.22
374.88	0.22	228.66	228.66	Point 14	0.22
375.10	0.22	228.89	228.89	Point 15	0.22
375.32	0.22	229.12	229.12	Point 16	0.22
375.54	0.22	229.35	229.35	Point 17	0.22
375.76	0.22	229.58	229.58	Point 18	0.22
376.00	0.22	229.81	229.81	Point 19	0.22
376.22	0.22	230.04	230.04	Point 20	0.22
376.44	0.22	230.27	230.27	Point 21	0.22
376.66	0.22	230.50	230.50	Point 22	0.22
376.88	0.22	230.73	230.73	Point 23	0.22
377.10	0.22	230.96	230.96	Point 24	0.22
377.32	0.22	231.19	231.19	Point 25	0.22
377.54	0.22	231.42	231.42	Point 26	0.22
377.76	0.22	231.65	231.65	Point 27	0.22
378.00	0.22	231.88	231.88	Point 28	0.22
378.22	0.22	232.11	232.11	Point 29	0.22
378.44	0.22	232.34	232.34	Point 30	0.22
378.66	0.22	232.57	232.57	Point 31	0.22
378.88	0.22	232.80	232.80	Point 32	0.22
379.10	0.22	233.03	233.03	Point 33	0.22
379.32	0.22	233.26	233.26	Point 34	0.22
379.54	0.22	233.49	233.49	Point 35	0.22
379.76	0.22	233.72	233.72	Point 36	0.22
380.00	0.22	233.95	233.95	Point 37	0.22
380.22	0.22	234.18	234.18	Point 38	0.22
380.44	0.22	234.41	234.41	Point 39	0.22
380.66	0.22	234.64	234.64	Point 40	0.22
380.88	0.22	234.87	234.87	Point 41	0.22
381.10	0.22	235.10	235.10	Point 42	0.22
381.32	0.22	235.33	235.33	Point 43	0.22
381.54	0.22	235.56	235.56	Point 44	0.22
381.76	0.22	235.79	235.79	Point 45	0.22
382.00	0.22	236.02	236.02	Point 46	0.22
382.22	0.22	236.25	236.25	Point 47	0.22
382.44	0.22	236.48	236.48	Point 48	0.22
382.66	0.22	236.71	236.71	Point 49	0.22
382.88	0.22	236.94	236.94	Point 50	0.22
383.10	0.22	237.17	237.17	Point 51	0.22
383.32	0.22	237.40	237.40	Point 52	0.22
383.54	0.22	237.63	237.63	Point 53	0.22
383.76	0.22	237.86	237.86	Point 54	0.22
384.00	0.22	238.09	238.09	Point 55	0.22
384.22	0.22	238.32	238.32	Point 56	0.22
384.44	0.22	238.55	238.55	Point 57	0.22
384.66	0.22	238.78	238.78	Point 58	0.22
384.88	0.22	239.01	239.01	Point 59	0.22
385.10	0.22	239.24	239.24	Point 60	0.22
385.32	0.22	239.47	239.47	Point 61	0.22
385.54	0.22	239.70	239.70	Point 62	0.22
385.76	0.22	239.93	239.93	Point 63	0.22
386.00	0.22	240.16	240.16	Point 64	0.22
386.22	0.22	240.39	240.39	Point 65	0.22
386.44	0.22	240.62	240.62	Point 66	0.22
386.66	0.22	240.85	240.85	Point 67	0.22
386.88	0.22	241.08	241.08	Point 68	0.22
387.10	0.22	241.31	241.31	Point 69	0.22
387.32	0.22	241.54	241.54	Point 70	0.22
387.54	0.22	241.77	241.77	Point 71	0.22
387.76	0.22	242.00	242.00	Point 72	0.22
388.00	0.22	242.23	242.23	Point 73	0.22
388.22	0.22	242.46	242.46	Point 74	0.22
388.44	0.22	242.69	242.69	Point 75	0.22
388.66	0.22	242.92	242.92	Point 76	0.22
388.88	0.22	243.15	243.15	Point 77	0.22
389.10	0.22	243.38	243.38	Point 78	0.22
389.32	0.22	243.61	243.61	Point 79	0.22
389.54	0.22	243.84	243.84	Point 80	0.22
389.76	0.22	244.07	244.07	Point 81	0.22
390.00	0.22	244.30	244.30	Point 82	0.22
390.22	0.22	244.53	244.53	Point 83	0.22
390.44	0.22	244.76	244.76	Point 84	0.22
390.66	0.22	245.00	245.00	Point 85	0.22
390.88	0.22	245.23	245.23	Point 86	0.22
391.10	0.22	245.46	245.46	Point 87	0.22
391.32	0.22	245.69	245.69	Point 88	0.22
391.54	0.22	245.92	245.92	Point 89	0.22
391.76	0.22	246.15	246.15	Point 90	0.22
392.00	0.22	246.38	246.38	Point 91	0.22
392.22	0.22	246.61	246.61	Point 92	0.22
392.44	0.22	246.84	246.84	Point 93	0.22
392.66	0.22	247.07	247.07	Point 94	0.22
392.88	0.22	247.30	247.30	Point 95	0.22
393.10	0.22	247.53	247.53	Point 96	0.22
393.32	0.22	247.76	247.76	Point 97	0.22
393.54	0.22	247.99	247.99	Point 98	0.22
393.76	0.22	248.22	248.22	Point 99	0.22
394.00	0.22	248.45	248.45	Point 100	0.22
394.22	0.22	248.68	248.68	Point 101	0.22
394.44	0.22	248.91	248.91	Point 102	0.22
394.66	0.22	249.14	249.14	Point 103	0.22
394.88	0.22	249.37	249.37	Point 104	0.22
395.10	0.22	249.60	249.60	Point 105	0.22
395.32	0.22	249.83	249.83	Point 106	0.22
395.54	0.22	250.06	250.06	Point 107	0.22
395.76	0.22	250.29	250.29	Point 108	0.22
396.00	0.22	250.52	250.52	Point 109	0.22
396.22	0.22	250.75	250.75	Point 110	0.22
396.44	0.22	250.98	250.98	Point 111	0.22
396.66	0.22	251.21	251.21	Point 112	0.22
396.88	0.22	251.44	251.44	Point 113	0.22
397.10	0.22	251.67	251.67	Point 114	0.22
397.32	0.22	251.90	251.90	Point 115	0.22
397.54	0.22	252.13	252.13	Point 116	0.22
397.76	0.22	252.36	252.36	Point 117	0.22
398.00	0.22	252.59	252.59	Point 118	0.22
398.22	0.22	252.82	252.82	Point 119	0.22
398.44	0.22	253.05	253.05	Point 120	0.22
398.66	0.22	253.28	253.28	Point 121	0.22
398.88	0.22	253.51	253.51	Point 122	0.22
399.10	0.22	253.74	253.74	Point 123	0.22
399.32	0.22	253.97	253.97	Point 124	0.22
399.54	0.22	254.20	254.20	Point 125	0.22
399.76	0.22	254.43	254.43	Point 126	0.22
400.00	0.22	254.66	254.66	Point 127	0.22
400.22	0.22	254.89	254.89	Point 128	0.22
400.44	0.22	255.12	255.12	Point 129	0.22
400.66	0.22	255.35	255.35	Point 130	0.22
400.88	0.22	255.58	255.58	Point 131	0.22
401.10	0.22	255.81	255.81	Point 132	0.22
401.32	0.22	256.04	256.04	Point 133	0.22
401.54	0.22	256.27	256.27	Point 134	0.22
401.76	0.22	256.50	256.50	Point 135	0.22
402.00	0.22	256.73	256.73	Point 136	0.22
402.22	0.22	256.96	256.96	Point 137	0.22
402.44	0.22	257.19	257.19	Point 138	0.22
402.66	0.22	257.42	257.42	Point 139	0.22
402.88	0.22	257.65	257.65	Point 140	0.22
403.10	0.22	257.88	257.88	Point 141	0.22
403.32	0.22	258.11	258.11	Point 142	0.22
403.54	0.22	258.34	258.34	Point 143	0.22
403.76	0.22	258.57	258.57	Point 144	0.22
404.00	0.22	258.80	258.80	Point 145	0.22
404.22	0.22	259.03	259.03	Point 146	0.22
404.44	0.22	259.26	259.26	Point 147	0.22
404.66	0.22	259.49	259.49	Point 148	0.22
404.88	0.22	259.72	259.72	Point 149	0.22
405.10	0.22	259.95	259.95	Point 150	0.22
405.32	0.22	260.18	260.18	Point 151	0.22
405.54	0.22	260.41	260.41	Point 152	0.22
405.76	0.22	260.64	260.64	Point 153	0.22
406.00	0.22	260.87	260.87	Point 154	0.22
406.22	0.22	261.10	261.10	Point 155	0.22
406.44	0.22	261.33	261.33	Point 156	0.22

Slope	2.92%
Description	Hill
Elevation	715.41
Accumulated Distance	0.00
Distance	0.00
Station	38.00

Section E-E

Station	Slope	Description	Elevation	Sounding Distance	Distance	Station
201.00	1.00%	100' 00"	201.00	100.00'	100.00'	202.00
201.20	1.00%	100' 20"	201.20	100.20'	100.20'	202.20
201.40	1.00%	100' 40"	201.40	100.40'	100.40'	202.40
201.60	1.00%	100' 60"	201.60	100.60'	100.60'	202.60
201.80	1.00%	100' 80"	201.80	100.80'	100.80'	202.80
202.00	1.00%	101' 00"	202.00	101.00'	101.00'	203.00
202.20	1.00%	101' 20"	202.20	101.20'	101.20'	203.20
202.40	1.00%	101' 40"	202.40	101.40'	101.40'	203.40
202.60	1.00%	101' 60"	202.60	101.60'	101.60'	203.60
202.80	1.00%	101' 80"	202.80	101.80'	101.80'	203.80
203.00	1.00%	102' 00"	203.00	102.00'	102.00'	204.00

Section K-H

**Islamic Republic of Afghanistan**  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock  
**Irrigation Directorate**  
**Engineering Department** KABUL

SURVEYED BY: ENG M Xunes & Samanera

REVIEWED

-----  
-----

628

10 of 10

• 100 •

DRAWING TITLE: Location of construction on Section E K L M

	213.00
	212.90
	212.80
	212.70
	208.00
	204.00
	202.00
	200.00
	198.00
Slope	
Description	SW 1/4 SW 1/4 SW 1/4
Elevation	213.00 211.20 210.00
Accumulated Distance	0.00 0.00 0.00
Distance	0.00 0.00 0.00
Station	205.80 205.80 205.80


## Section L.

	715.60		
	715.20		
	715.00		
	712.00		
	711.40		
	711.20		
	708.00		
	707.00		
	706.00		
	705.00		
	704.00		
	703.00		
Slope			
Description			
Elevation			
Accumulate Distance			
Distance			
Station			

## Section M-

## Section F-F

## Section G-G

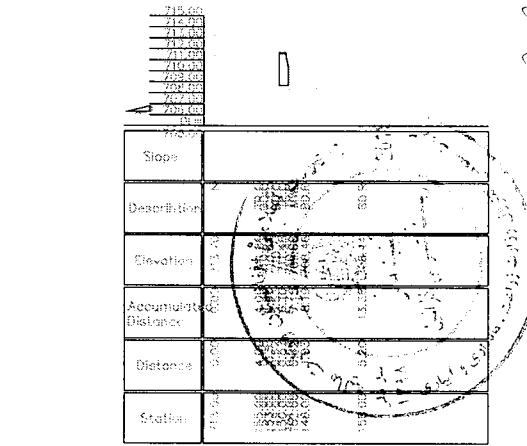

## Section N-N

	2,400			
	2,350			
	2,300			
	2,250			
	2,200			
	2,150			
	2,100			
	2,050			
	2,000			
	1,950			
	1,900			
	1,850			
	1,800			
	1,750			
	1,700			
	1,650			
	1,600			
	1,550			
	1,500			
	1,450			
	1,400			
	1,350			
	1,300			
	1,250			
	1,200			
	1,150			
	1,100			
	1,050			
	1,000			
	950			
	900			
	850			
	800			
	750			
	700			
	650			
	600			
	550			
	500			
	450			
	400			
	350			
	300			
	250			
	200			
	150			
	100			
	50			
Slope				
Description				
Elevation				
Accumulated Distance				
Distance				
Station				

Section 0-0

717.00
716.70
716.40
716.10
715.80
715.50
715.20
714.90
714.60
714.30
714.00
713.70
713.40
713.10
712.80
712.50
712.20
711.90
711.60
711.30
711.00
710.70
710.40
709.90
709.60
709.30
709.00
708.70
708.40
708.10
707.80
707.50
707.20
706.90
706.60
706.30
706.00
705.70
705.40
705.10
704.80
704.50
704.20
703.90
703.60
703.30
703.00
702.70
702.40
702.10
701.80
701.50
701.20
700.90
700.60
700.30
700.00
699.70
699.40
699.10
698.80
698.50
698.20
697.90
697.60
697.30
697.00
696.70
696.40
696.10
695.80
695.50
695.20
694.90
694.60
694.30
694.00
693.70
693.40
693.10
692.80
692.50
692.20
691.90
691.60
691.30
691.00
690.70
690.40
690.10
689.80
689.50
689.20
688.90
688.60
688.30
688.00
687.70
687.40
687.10
686.80
686.50
686.20
685.90
685.60
685.30
685.00
684.70
684.40
684.10
683.80
683.50
683.20
682.90
682.60
682.30
682.00
681.70
681.40
681.10
680.80
680.50
680.20
680.00
679.70
679.40
679.10
678.80
678.50
678.20
677.90
677.60
677.30
677.00
676.70
676.40
676.10
675.80
675.50
675.20
674.90
674.60
674.30
674.00
673.70
673.40
673.10
672.80
672.50
672.20
671.90
671.60
671.30
671.00
670.70
670.40
670.10
669.80
669.50
669.20
668.90
668.60
668.30
668.00
667.70
667.40
667.10
666.80
666.50
666.20
665.90
665.60
665.30
665.00
664.70
664.40
664.10
663.80
663.50
663.20
662.90
662.60
662.30
662.00
661.70
661.40
661.10
660.80
660.50
660.20
659.90
659.60
659.30
659.00
658.70
658.40
658.10
657.80
657.50
657.20
656.90
656.60
656.30
656.00
655.70
655.40
655.10
654.80
654.50
654.20
653.90
653.60
653.30
653.00
652.70
652.40
652.10
651.80
651.50
651.20
650.90
650.60
650.30
650.00
649.70
649.40
649.10
648.80
648.50
648.20
647.90
647.60
647.30
647.00
646.70
646.40
646.10
645.80
645.50
645.20
644.90
644.60
644.30
644.00
643.70
643.40
643.10
642.80
642.50
642.20
641.90
641.60
641.30
641.00
640.70
640.40
640.10
639.80
639.50
639.20
638.90
638.60
638.30
638.00
637.70
637.40
637.10
636.80
636.50
636.20
635.90
635.60
635.30
635.00
634.70
634.40
634.10
633.80
633.50
633.20
632.90
632.60
632.30
632.00
631.70
631.40
631.10
630.80
630.50
630.20
629.90
629.60
629.30
629.00
628.70
628.40
628.10
627.80
627.50
627.20
626.90
626.60
626.30
626.00
625.70
625.40
625.10
624.80
624.50
624.20
623.90
623.60
623.30
623.00
622.70
622.40
622.10
621.80
621.50
621.20
620.90
620.60
620.30
620.00
619.70
619.40
619.10
618.80
618.50
618.20
617.90
617.60
617.30
617.00
616.70
616.40
616.10
615.80
615.50
615.20
614.90
614.60
614.30
614.00
613.70
613.40
613.10
612.80
612.50
612.20
611.90
611.60
611.30
611.00
610.70
610.40
610.10
609.80
609.50
609.20
608.90
608.60
608.30
608.00
607.70
607.40
607.10
606.80
606.50
606.20
605.90
605.60
605.30
605.00
604.70
604.40
604.10
603.80
603.50
603.20
602.90
602.60
602.30
602.00
601.70
601.40
601.10
600.80
600.50
600.20
599.90
599.60
599.30
599.00
598.70
598.40
598.10
597.80
597.50
597.20
596.90
596.60
596.30
596.00
595.70
595.40
595.10
594.80
594.50
594.20
593.90
593.60
593.30
593.00
592.70
592.40
592.10
591.80
591.50
591.20
590.90
590.60
590.30
590.00
589.70
589.40
589.10
588.80
588.50
588.20
587.90
587.60
587.30
587.00
586.70
586.40
586.10
585.80
585.50
585.20
584.90
584.60
584.30
584.00
583.70
583.40
583.10
582.80
582.50
582.20
581.90
581.60
581.30
581.00
580.70
580.40
580.10
579.80
579.50
579.20
578.90
578.60
578.30
578.00
577.70
577.40
577.10
576.80
576.50
576.20
575.90
575.60
575.30
575.00
574.70
574.40
574.10
573.80
573.50
573.20
572.90
572.60
572.30
572.00
571.70
571.40
571.10
570.80
570.50
570.20
569.90
569.60
569.30
569.00
568.70
568.40
568.10
567.80
567.50
567.20
566.90
566.60
566.30
566.00
565.70
565.40
565.10
564.80
564.50
564.20
563.90
563.60
563.30
563.00
562.70
562.40
562.10
561.80
561.50
561.20
560.90
560.60
560.30
560.00
559.70
559.40
559.10
558.80
558.50
558.20
557.90
557.60
557.30
557.00
556.70
556.40
556.10
555.80
555.50
555.20
554.90
554.60
554.30
554.00
553.70
553.40
553.10
552.80
552.50
552.20
551.90
551.60
551.30
551.00
550.70
550.40
550.10
549.80
549.50
549.20
548.90
548.60
548.30
548.00
547.70
547.40
547.10
546.80
546.50
546.20
545.90
545.60
545.30
545.00
544.70
544.40
544.10
543.80
543.50
543.20
542.90
542.60
542.30
542.00
541.70
541.40
541.10
540.80
540.50
540.20
539.90
539.60
539.30
539.00
538.70
538.40
538.10
537.80
537.50
537.20
536.90
536.60
536.30
536.00
535.70
535.40
535.10
534.80
534.50
534.20
533.90
533.60
533.30
533.00
532.70
532.40
532.10
531.80
531.50
531.20
530.90
530.60
530.30
530.00
529.70
529.40
529.10
528.80
528.50
528.20
527.90
527.60
527.30
527.00
526.70
526.40
526.10
525.80
525.50
525.20
524.90
524.60
524.30
524.00
523.70
523.40
523.10
522.80
522.50
522.20
521.90
521.60
521.30
521.00
520.70
520.40
520.10

Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock  
Irrigation Directorate  
Engineering Department KABUL

SURVEYED BY Eng.M Yunus & Samadar

DRAWN BY Eng Abdulrahman amin

DESIGNED BY Eng.Abdulrahman amin

REVIEWED BY Eng. Wahidullah

CHECKED BY Eng. Salar

APPROVED BY

SCALE Not to scale

DATE 15/9/2018

REVISION NO. Revised

PROVINCE Laghman

DISTRICT

VILLAGE

Shahedan Canal Protection Wall

Location of construction on Section-H,I,P,Q

SCALE 1:10000

1000 500 0 -500 -1000

1000 500 0 -500 -1000

1000 500 0 -500 -1000

1000 500 0 -500 -1000




1000 500 0 -500 -1000


1000 500 0 -500 -1000

1000 500 0 -500 -1000

1000 500 0 -500 -1000

1000 500 0 -500 -1000

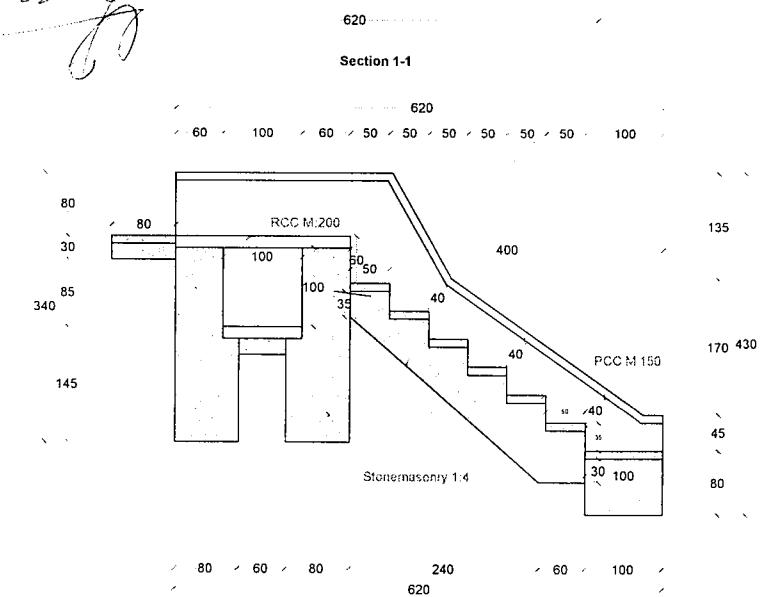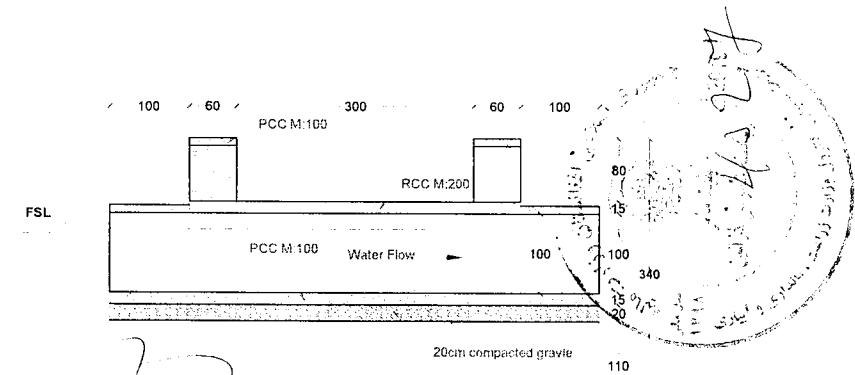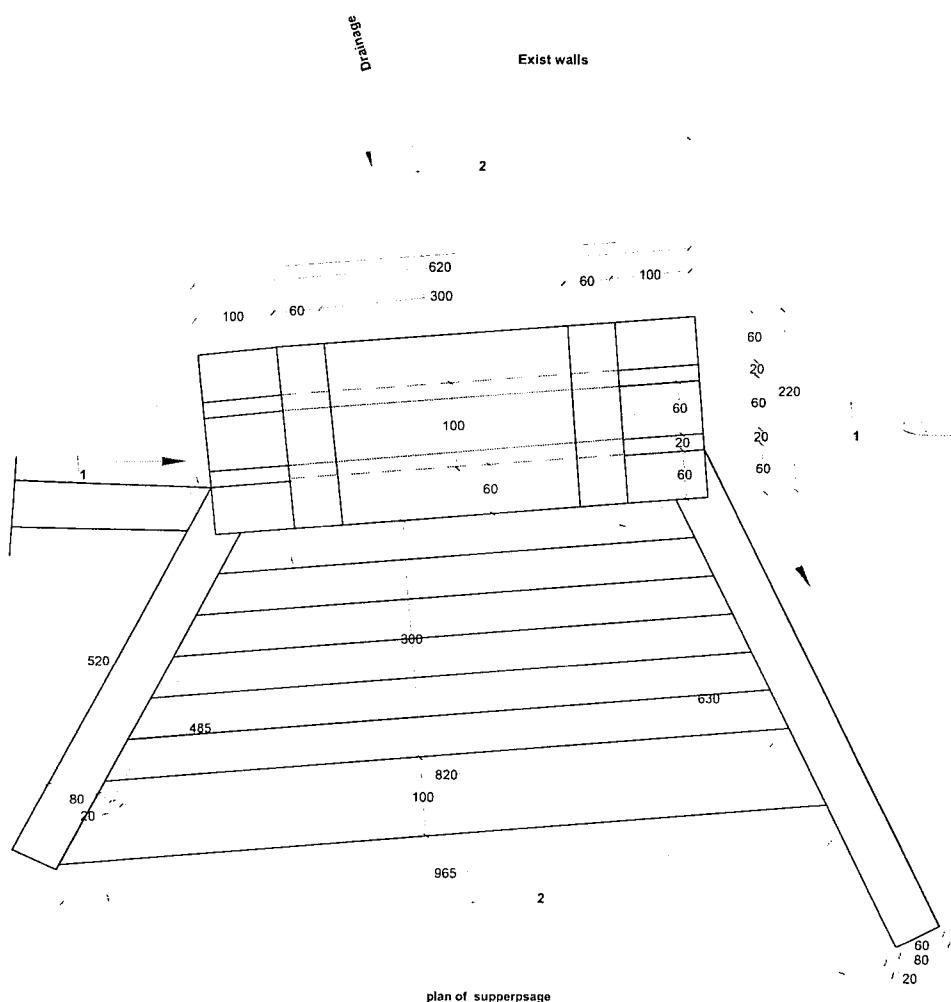

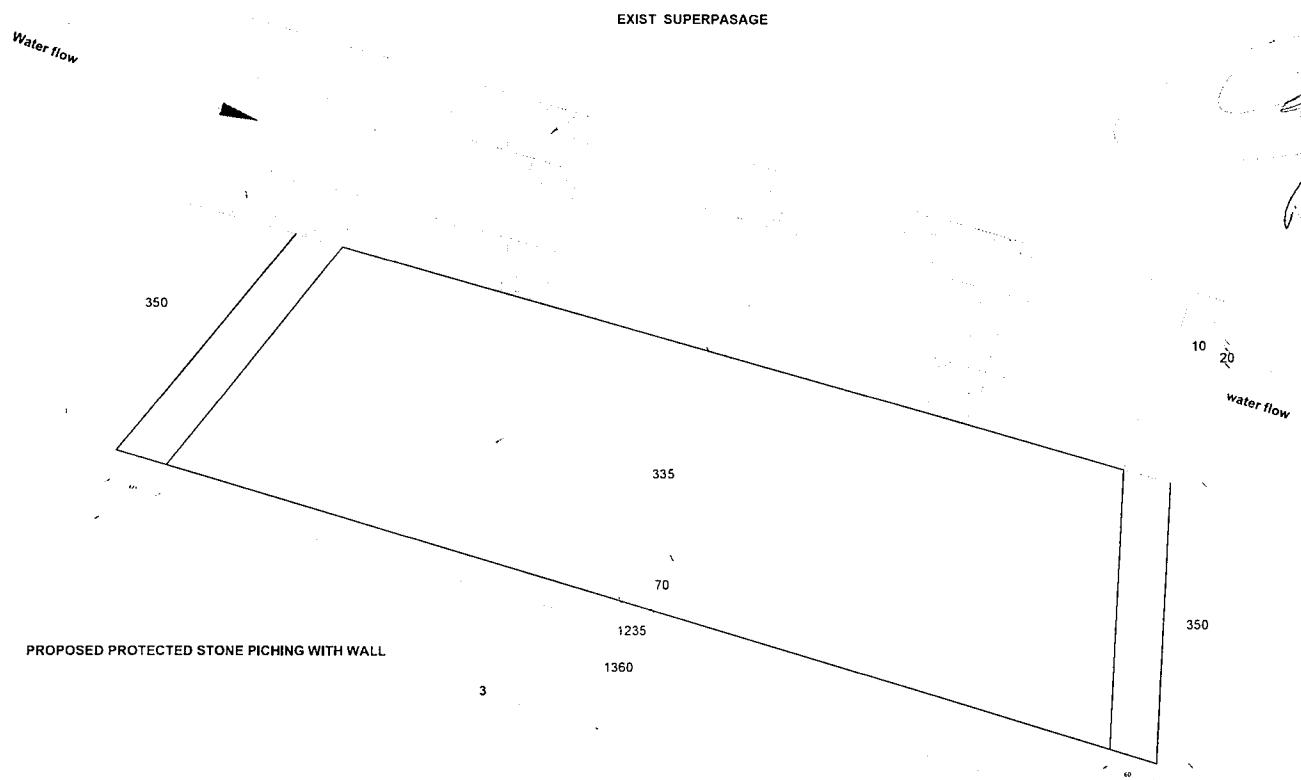


PROPOSED PROTECTED STONE PICHING WITH WALL


Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock  
Irrigation Directorate  
Engineering Department KABUL


SURVEYED BY Eng.M Yunos & Samandar	REVIEWED BY Eng. Wahidullah	SCALE Not to scale	PROVINCE Laghman	PROJECT NAME: Shahedan Canal Protection Wall and stone piching
DRAWN BY Eng.Abdulrahman amin	CHECKED BY Eng. Salar	DATE 15/9/2018	DISTRICT Dowlat Shah	DRAWING TITLE: PROPOSED PROTECTED STONE PICHING WITH WALL
DESIGNED BY Eng.Abdulrahman amin	APPROVED BY	REVISION NO. Revised	VILLAGE Drana Kala	13 10

Scale

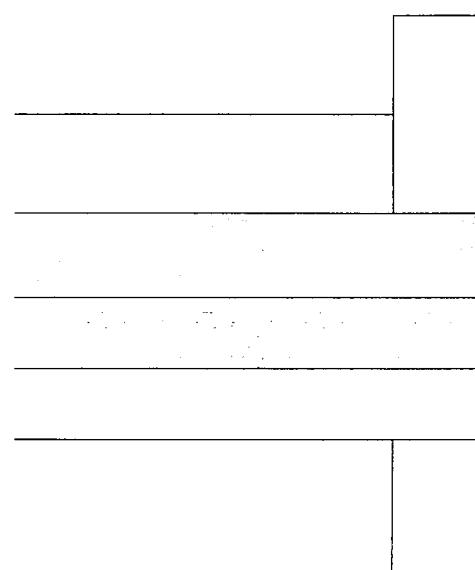

Exist super passage

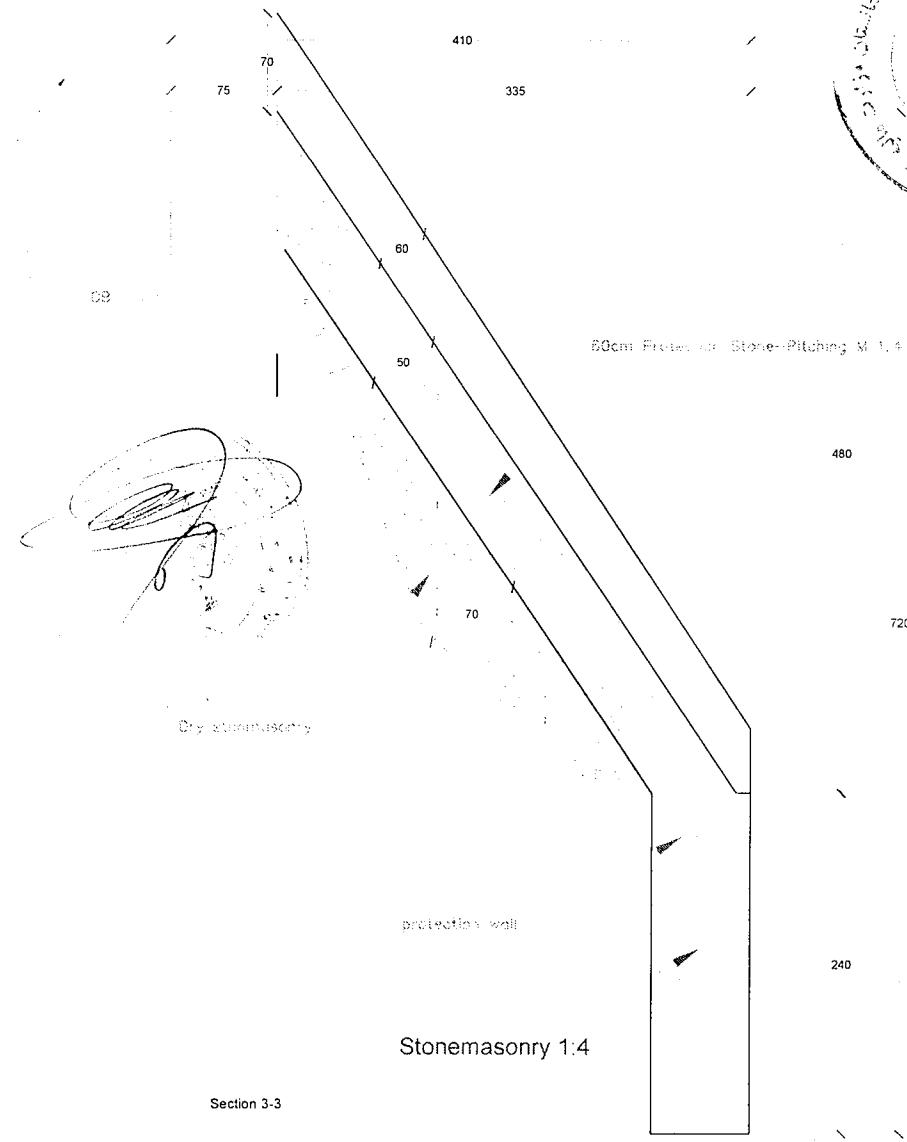

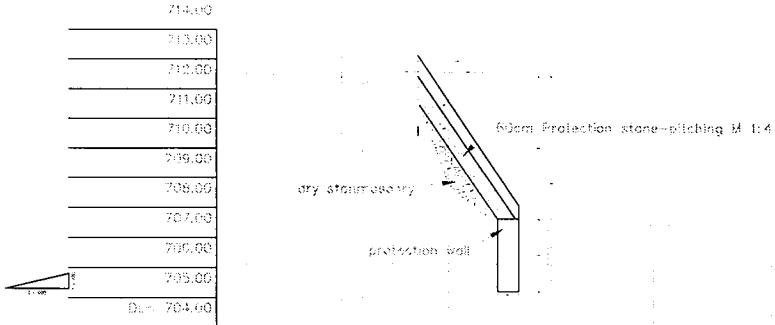

Description	Elevation	Accumulated Distances	Distance	Station
	712.53+	0.00	0.00	417.00+
	712.46	0.54	0.54	417.00
	712.40	0.54	0.54	417.00
	712.35	0.54	0.54	417.00
	712.30	0.54	0.54	417.00
	712.25	0.54	0.54	417.00
	712.20	0.54	0.54	417.00
	712.15	0.54	0.54	417.00
	712.10	0.54	0.54	417.00
	712.05	0.54	0.54	417.00
	712.00	0.54	0.54	417.00
	711.95	0.54	0.54	417.00
	711.90	0.54	0.54	417.00
	711.85	0.54	0.54	417.00
	711.80	0.54	0.54	417.00
	711.75	0.54	0.54	417.00
	711.70	0.54	0.54	417.00
	711.65	0.54	0.54	417.00
	711.60	0.54	0.54	417.00
	711.55	0.54	0.54	417.00
	711.50	0.54	0.54	417.00
	711.45	0.54	0.54	417.00
	711.40	0.54	0.54	417.00
	711.35	0.54	0.54	417.00
	711.30	0.54	0.54	417.00
	711.25	0.54	0.54	417.00
	711.20	0.54	0.54	417.00
	711.15	0.54	0.54	417.00
	711.10	0.54	0.54	417.00
	711.05	0.54	0.54	417.00
	711.00	0.54	0.54	417.00
	710.95	0.54	0.54	417.00
	710.90	0.54	0.54	417.00
	710.85	0.54	0.54	417.00
	710.80	0.54	0.54	417.00
	710.75	0.54	0.54	417.00
	710.70	0.54	0.54	417.00
	710.65	0.54	0.54	417.00
	710.60	0.54	0.54	417.00
	710.55	0.54	0.54	417.00
	710.50	0.54	0.54	417.00
	710.45	0.54	0.54	417.00
	710.40	0.54	0.54	417.00
	710.35	0.54	0.54	417.00
	710.30	0.54	0.54	417.00
	710.25	0.54	0.54	417.00
	710.20	0.54	0.54	417.00
	710.15	0.54	0.54	417.00
	710.10	0.54	0.54	417.00
	710.05	0.54	0.54	417.00
	710.00	0.54	0.54	417.00
	709.95	0.54	0.54	417.00
	709.90	0.54	0.54	417.00
	709.85	0.54	0.54	417.00
	709.80	0.54	0.54	417.00
	709.75	0.54	0.54	417.00
	709.70	0.54	0.54	417.00
	709.65	0.54	0.54	417.00
	709.60	0.54	0.54	417.00
	709.55	0.54	0.54	417.00
	709.50	0.54	0.54	417.00
	709.45	0.54	0.54	417.00
	709.40	0.54	0.54	417.00
	709.35	0.54	0.54	417.00
	709.30	0.54	0.54	417.00
	709.25	0.54	0.54	417.00
	709.20	0.54	0.54	417.00
	709.15	0.54	0.54	417.00
	709.10	0.54	0.54	417.00
	709.05	0.54	0.54	417.00
	709.00	0.54	0.54	417.00
	708.95	0.54	0.54	417.00
	708.90	0.54	0.54	417.00
	708.85	0.54	0.54	417.00
	708.80	0.54	0.54	417.00
	708.75	0.54	0.54	417.00
	708.70	0.54	0.54	417.00
	708.65	0.54	0.54	417.00
	708.60	0.54	0.54	417.00
	708.55	0.54	0.54	417.00
	708.50	0.54	0.54	417.00
	708.45	0.54	0.54	417.00
	708.40	0.54	0.54	417.00
	708.35	0.54	0.54	417.00
	708.30	0.54	0.54	417.00
	708.25	0.54	0.54	417.00
	708.20	0.54	0.54	417.00
	708.15	0.54	0.54	417.00
	708.10	0.54	0.54	417.00
	708.05	0.54	0.54	417.00
	708.00	0.54	0.54	417.00
	707.95	0.54	0.54	417.00
	707.90	0.54	0.54	417.00
	707.85	0.54	0.54	417.00
	707.80	0.54	0.54	417.00
	707.75	0.54	0.54	417.00
	707.70	0.54	0.54	417.00
	707.65	0.54	0.54	417.00
	707.60	0.54	0.54	417.00
	707.55	0.54	0.54	417.00
	707.50	0.54	0.54	417.00
	707.45	0.54	0.54	417.00
	707.40	0.54	0.54	417.00
	707.35	0.54	0.54	417.00
	707.30	0.54	0.54	417.00
	707.25	0.54	0.54	417.00
	707.20	0.54	0.54	417.00
	707.15	0.54	0.54	417.00
	707.10	0.54	0.54	417.00
	707.05	0.54	0.54	417.00
	707.00	0.54	0.54	417.00
	706.95	0.54	0.54	417.00
	706.90	0.54	0.54	417.00
	706.85	0.54	0.54	417.00
	706.80	0.54	0.54	417.00
	706.75	0.54	0.54	417.00
	706.70	0.54	0.54	417.00
	706.65	0.54	0.54	417.00
	706.60	0.54	0.54	417.00
	706.55	0.54	0.54	417.00
	706.50	0.54	0.54	417.00
	706.45	0.54	0.54	417.00
	706.40	0.54	0.54	417.00
	706.35	0.54	0.54	417.00
	706.30	0.54	0.54	417.00
	706.25	0.54	0.54	417.00
	706.20	0.54	0.54	417.00
	706.15	0.54	0.54	417.00
	706.10	0.54	0.54	417.00
	706.05	0.54	0.54	417.00
	706.00	0.54	0.54	417.00
	705.95	0.54	0.54	417.00
	705.90	0.54	0.54	417.00
	705.85	0.54	0.54	417.00
	705.80	0.54	0.54	417.00
	705.75	0.54	0.54	417.00
	705.70	0.54	0.54	417.00
	705.65	0.54	0.54	417.00
	705.60	0.54	0.54	417.00
	705.55	0.54	0.54	417.00
	705.50	0.54	0.54	417.00
	705.45	0.54	0.54	417.00
	705.40	0.54	0.54	417.00
	705.35	0.54	0.54	417.00
	705.30	0.54	0.54	417.00
	705.25	0.54	0.54	417.00
	705.20	0.54	0.54	417.00
	705.15	0.54	0.54	417.00
	705.10	0.54	0.54	417.00
	705.05	0.54	0.54	417.00
	705.00	0.54	0.54	417.00
	704.95	0.54	0.54	417.00
	704.90	0.54	0.54	417.00
	704.85	0.54	0.54	417.00
	704.80	0.54	0.54	417.00
	704.75	0.54	0.54	417.00
	704.70	0.54	0.54	417.00
	704.65	0.54	0.54	417.00
	704.60	0.54	0.54	417.00
	704.55	0.54	0.54	417.00
	704.50	0.54	0.54	417.00
	704.45	0.54	0.54	417.00
	704.40	0.54	0.54	417.00
	704.35	0.54	0.54	417.00
	704.30	0.54	0.54	417.00
	704.25	0.54	0.54	417.00
	704.20	0.54	0.54	417.00
	704.15	0.54	0.54	417.00
	704.10	0.54	0.54	417.00
	704.05	0.54	0.54	417.00
	704.00	0.54	0.54	417.00

Section C-C

Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock  
Irrigation Directorate  
Engineering Department KABUL

SURVEYED BY: Eng.M Yunos & Samandar  
DRAWN BY: Eng.Abdulrahman amin  
DESIGNED BY: Eng.Abdulrahman amin  
REVIEWED BY: Eng. Wahidullah  
CHECKED BY: Eng. Salar  
APPROVED BY:  
SCALE: Not to scale  
DATE: 15/8/2018  
PROVINCE: Laghman  
DISTRICT: VILLAGE:  
PROJECT NAME: Shahedan Canal Protection Wall  
DRAWING TITLE: Section C-C



No 24

## ahad mohibi

**From:** Mohammad Yasin <m.yasin@ibafg.af>  
**Sent:** Wednesday, August 7, 2019 4:07 PM  
**To:** 'ahad mohibi'  
**Cc:** monis.hossaini@mail.gov.af; mukhtar.omaryar@mail.gov.af; qurban.sarvari@mail.gov.af; 'Hameedullah Samim'; 'Habib Rahman'; h.qurbanali@ibafg.af; dy.ceo@ibafg.af; deputy.ceo@ibafg.af  
**Subject:** RE: تصدیق تصمین حسن اجرا پروژه اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی لغمان

محترما!

بانک اسلامی افغانستان به محترم ساختمانی و سرکسازی البیان فضل یک ورق تصمین بانکی شماره (2140/10010/2019) که حاوی مبلغ 187,000/- افغانی میباشد و از تاریخ (06/اگسٹ/2019) الی (05/اپریل/2020) قابل اعتبار میباشد. بانک اسلامی افغانستان صحت بودن تصمین بانکی مذکور را تصدیق مینماید.

Regards



د افغانستان اسلامي بانک  
Islamic Bank of Afghanistan

### Mohammad Yasin Shah "Nikyar"

Credit Officer

Islamic Bank of Afghanistan, Malalai Zeghantoon Square, Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan  
Post Box: 1166, Kabul Afghanistan

E-mail: [m.yasin@ibafg.af](mailto:m.yasin@ibafg.af) Personal E-mail: [yasin.nikyar@yahoo.com](mailto:yasin.nikyar@yahoo.com)  
Website: [ibafg.com](http://ibafg.com) Mobile: 0792990034 / 0799569559

This email and files transmitted it are confidential and contain privileged of copyright information. If you are not the intended recipient you must not copy Distribute or use this email or the information contained in it for any purpose other than to notify us of the receipt thereof. If you have received this message in error. Please notify the sender immediately. And delete this email from your system. Please note that e-mail are susceptible to change. The sender shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication. Nor for any delay in its receipt or damage to your system. The sender does not guarantee that this material is free from viruses or any other defects although due care has been taken to minimize the risk.

**From:** ahad mohibi [mailto:[ahad.mohibi@mail.gov.af](mailto:ahad.mohibi@mail.gov.af)]

**Sent:** Wednesday, August 07, 2019 3:31 PM

**To:** dy.cco@ibafg.af; m.yasin@ibafg.af

**Cc:** monis.hossaini@mail.gov.af; mukhtar.omaryar@mail.gov.af; qurban.sarvari@mail.gov.af; 'Hameedullah Samim'

**Subject:** تصدیق تصمین حسن اجرا پروژه اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی لغمان

به اداره محترم بانک اسلامی افغانستان

شرکت ساختمانی و سرکسازی البیان فضل تصمین حسن اجرا برای پروژه اعمار دیوار محافظوی کانال شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی لغمان را ارایه کرده است.  
بدین وسیله یک اسکن از تصمین مذکور به شما ارسال شده تا از صحت بودن آن این اداره را اطمینان خواهد فرمود.

بااحترام

عبدالاحد محبی

آمریت ندارکات امور ساختمانی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری



تضمين حسن اجرا  
(Performance Guarantee)

بنك اسلامي افغانستان	نام بنك صادر کننده تضمين
دفتر مرکزی چهارراهی ملالي ژرگتون کابل افغانستان	آدرس دفتر بنك صادر کننده تضمين
وزارت محترم وزراعت، اقتصاد و مالداری	نام و آدرس اداره ذيبلغ
10010/219/2140	شماره تضمين حسن اجرا
001PERG192190002	شماره رiferens
187,000/- افغانی	مبلغ تضمين
2019-06	تاریخ صدور تضمين
2020-05	تاریخ انقضای تضمين

ما اطلاع يافته که شركت محترم ساخته ای و سرکسازی الیاس فضل (که بعد از اين به اسم قراردادي ياد ميشود) دارنده جواز شماره 34684 به تاریخ 12-05-1398 باشما تعهد به اجرا قرارداد برای پروژه اعمار دیوار محافظتی کاتل شهیدان واقع فریه شهیدان و لسوالی قرغه بی و لایت لعنان غرارداد تمبر MAIL/PD/NCB/W/127/98 که ازین به بعد به عنوان قرارداد ياد ميشود) نموده است.

بر علاوه ما ميدانيم که مطابق به شريطي قرارداد، قراردادي يابد تضمين يانکي حسن اجرا را فراهم نماید.  
بندا بر اين بر مبنای تقاضاي قراردادي، پذيرفته ميله يانکي اسلامي افغانستان بصورت غير قابل فسخ تعهد مي سپارد که بدون تعلي، هر مبلغ را که بطور مجموعی بيشتر از مبلغ 187,000 افغانی (بكسدو هشتاد هفت هزار افغانی) بياشد، بعد از دریافت اولين تقاضاي کتبی از جانب شما در مورد يانکه قراردادي شريطي قرارداد را نقض کرده پرداخت ميگذرد.  
به اضافه موارد فوق، تاكيد ميگردد که:

1. مسؤوليت يانکي اسلامي افغانستان در قابل اين تضمين يانکي از مبلغ 187,000 افغانی (بكسدو هشتاد هفت هزار افغانی) بيشتر نميست.
2. اين تضمين يانکي الى تاریخ 05-اپریل-2020 داراي اعتبار است.
3. و يانکي اسلامي افغانستان صرف معهد يه پرداخت مبلغ ذكر شده اين تضمين يانکي فقط در صورت موافقنت تقاضاي کتبی از جانب اداره شما قبل یا در تاریخ 05-اپریل-2020 است.

اين ضمانت با درنظرداشت مقررات رسمي برای تقاضاي تضمينات، اطقم تجارت بین المللی چاپ نمبر 458 ميگذرد در صورت يکه اين مقررات در تضليل با وصول شرعاً نباشد.

يکاهنت: برای تصدیق اين تضمين يانکي لطفاً با قریئن علی حسینی به شماره 0792990050 یا به آدرس الکترونیکی ذیل پذیرفته يانکي این تضمينات در تضليل با وصول شرعاً نباشد.

تائید توسط کارمندان با صلاحیت يانک:

امضا صلاحیت دار

سپه موبایل (کلیم)  
رئیس هیئت عامل يانک  
از حلقه يانک

امضا صلاحیت دار  
توبیخ علی (کلیم)  
سرپرمان همچو علیه عبارات



11022




دکر هنی، او بولگولو اومالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغستان اسلامی جمهوری دولت  
دولت جمهوری اسلامی افغانستان

**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری  
ریاست تهیه و تدارکات  
آمریت تدارکات امور ساختمانی  
مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی



شماره: (۱۳۹۸)

تاریخ: ۱۰/۱/۱۳۹۸

**نامه قبولی آفر**

از: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

آدرس: جمال مینه ناحیه سوم کابل افغانستان

به: شرکت ساختمانی و سرکسازی الیاس فضل دارنده جواز نمبر (34684)

آدرس: مارکیت اوربا، جاده نادر پشتون، کابل، افغانستان

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارایه شده شما مؤخر 25/03/1398 برای پروژه اعمار دیوار محافظی شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان به قیمت مجموعی 3,652,030.00 (سه میلیون شش صد پنجاه دو هزار و سی افغانی) اعطای نماید. طوریکه در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرط‌نامه مربوطه تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است. لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون طرز العمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشت طرز العمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرط‌نامه مربوطه درج گردیده، به اداره تسليم نماید. در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود.

مشخصات تدارکات / قرار داد: پروژه اعمار دیوار محافظی شهیدان واقع قریه شهیدان ولسوالی قرغه بی ولایت لغمان
شماره تشخیصیه تدارکات: MAIL/PD/NCB/W/127/98
قیمت مجموعی: 3,652,030.00 (سه میلیون شش صد پنجاه دو هزار و سی افغانی)
نوعیت تضمین اجرای قرار داد: تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی و غیر مشروط باشد
مقدار تضمین اجرای قرار داد: پنج فیصد (187,000.00) یک صد و هشتاد و هفت هزار افغانی به مدت 8 ماه تضمین اجرا ارائه گردد.
زمان عقد قرار داد: بعد از ارائه تضمین حسن اجرا قرارداد عقد می گردد.
مکان عقد قرار داد: ریاست تهیه و تدارکات

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، موافقت شما قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص: **محمد الله "پناحل"**

وظیفه: **رئیس تهیه و تدارکات**

امضاء و تاریخ

کابی: **به دو سیه مربوطه**
