


ملخصات	
05/07/98	تاریخ تعمیمی تکمیل بروزه
180	میزان بروزه به روز
06/01/98	تاریخ تعمیمی امسا قرارداد
17/12/97	تاریخ تعمیمی نشر اطلاعات تضمیم بر اعلانی قرارداد
03/12/97	تاریخ ارایه گوارض ارزیابی
01/12/97	تاریخ ختم ارزیابی آفرها
01/11/97	تاریخ تعمیمی بازگشایی آفرها
11/10/97	تاریخ تعمیمی امانت تدارکات / بروزه
15/11/97	تاریخ تعمیمی مظویری آثار بروسم تدارکات بروزه
ناراد	تاریخ ارزیابی قابلی اهلیت ناظران در صورت که لازم باشد
1737031	قیمت تعمیمی تدارکات بروزه به (الفانی)
300000000	مبلغ پودجه مظلوم شده به الفانی
MAIL/PD/NCB/W135/98	شماره قرارداد
	ترجیح تدارکات از منابع داخلی در صورت ضرورت گرفته می شود
	بروزه بلان شده جدید یا الفانی
	سال های قبل
	امض
	کنکوری تدارکات
	نوع قرارداد
	به اساس پیشرفت کار
	دوفن با شیوه تدارکات (در باز داخلی)
	صورت استفاده از شیوه های ساختنی
	نوع تدارکات
	مقول تبدیل بروزه (کوتاه، دور نمایز پودجه ایام هندسه)
	قیمه
	مشکلمن
	وسایل
	پلاست
	جایزه نحوی نحوی
AFG/390676	کود پودجه
	بودجه اختیاری یا غیر اختیاری
	لخته ای
	لخته ای (عادی/کشاورزی)
	اداره تدارکاتی
	وزارت زراعت بیانی و مدداری
	مسکون
100	شماره



دکرنی، اوپولگولو او مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

## د افغانستان اسلامی جمهوری دولت

**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

## معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آپیاری

آمريت انچنيري

تاریخ: ۹ / ۱ / ۱۳۹۷

شماره: ) ۱۰۲۰ (

به ریاست محترم تهیه و تدارکات!

به منظور تسریع روند تطبیق پروژه های انکشافی اینک به تعداد (15) ورق اسناد پروژه بازسازی سربندو تحکیم کاری کانال نمازگه قریسه نمازگه ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان که شامل (10) ورق نقشه، یک ورق فورم تعهد بودجه‌ی، دو ورق جدول برآورد قیمت دار و بدون قیمت و یک ورق جدول میعاد و گرتی پروژه، یک ورق لست تجهیزات ساختمانی پروژه فوق الذکر می باشد، جهت طی مراحل پرسوه ندارکاتی به شما ارسال است.

بای احترام

إنجنير خليل الرحمن "عمر"

مکرر سمت ریاست آپیاری



Eric - Eric (31st)  
Michael (2nd)  
97-11-14  
~~2000~~



**۲** به أمریت برنامه، نظارت و ارزیابی  
امریت آبیاری ریاست زراعت، آبیاری و مداری ولایت (بدخشنان)

صرف برای تدارکات یک ساله {ماده 13 (3) ، حکم 14 (15)}

<b>درخواست تدارکات</b> قانون تدارکات سلطان 1387 فصل 2 ماده 12 احکام طرز العمل تدارکات واحد پالیسی تدارکات حمل 1386 فصل 2 حکم 13	 <b>وزارت زراعت ، آبیاری و ملداری</b> Ministry of Agriculture																				
تاریخ درخواست خریداری شماره پروژه : ( ) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">اجناس</td> <td style="width: 20%;">امور ساختمانی</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">خدمات</td> </tr> <tr> <td colspan="2">روش باز</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ماده 15(1) حکم 14 (1)</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>بلی</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>نخیر</td> </tr> </table>	اجناس	امور ساختمانی	<input checked="" type="checkbox"/>	خدمات	روش باز		<input checked="" type="checkbox"/>		ماده 15(1) حکم 14 (1)		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	بلی			<input type="checkbox"/>	نخیر	شماره در خواست خریداری شماره درخواست خریداری در AFMIS اداره درخواست کننده: ریاست آبیاری نوعیت تدارکاتی: روش تدارکاتی {ماده 20 ، حکم 21 (1)} کود بودجوي {ماده 20 ، حکم 20 (1)} آیا بودجه منظور گردیده است؟ {ماده 13 (1) . حکم 14 (1)} : نخیر
اجناس	امور ساختمانی	<input checked="" type="checkbox"/>	خدمات																		
روش باز		<input checked="" type="checkbox"/>																			
ماده 15(1) حکم 14 (1)		<input checked="" type="checkbox"/>																			
		<input checked="" type="checkbox"/>	بلی																		
		<input type="checkbox"/>	نخیر																		

استدلال			
این پروژه در قسمت تامین آب کافی جهت آبیاری زمین های زراعتی برای دهائین در منطقه مفید واقع میگردد.			
قیمت تخمینی کل قیمت فی واحد	نام پروژه پروژه: سر بند و تحکیم کاری کانال نمازگه ولسوالی: اشکاشم ولایت: بدخشنان	توضیح {ماده 14 (1) ، حکم 15 (1)} برای اجناس ، 17 برای امور ساختمانی پروژه احداث ذخایر کوچک آب و ساختمانهای آبیاری از کود بودجوي 76 AFG/390676	
تاریخ: 30/10/1397		امضاء:  وظیفه: سرپرست ریاست آبیاری اسم: انجیر خلیل الرحمن "عمر"	
قیمت تخمینی {ماده 12 (2) ، حکم 13 (1) } - 2 درخواست کننده: اسم: انجیر خلیل الرحمن "عمر"			

تائید موجودیت بودجه از سوی ریاست مالی			
پروژه آبیاری و ذخایر آب دارای AFG390676 بوده و در پلان سال مالی 1398 مبلغ 280,000,000 افغانی منظوری دارد. از آنجمله مبلغ 1,737,031 افغانی آن بابت اعمار سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان طبق پلان مالی سال 1398 تعهد گردید. تاریخ: 1397/11/02			
امضاء:  وظیفه:  اسم: تائید کننده {ماده 13 (1) ، حکم 14 (1) }			

منظوری			
 تائید کنندم {ماده 12 (1) ، حکم 13 (4) ، ضمیمه ۱} : وظیفه:  اسم: 			



دیکتراتیو، ایوالنگونی او مالداری وزارت  
وزارت زرراحت، آبیاری و مالداری

د افغانستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان



*Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*

معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امیریت انجیری

Province : Badakhshan

District : Ishkashim

Village : Namazgah

Project : Namazgah Weir and Canal Protection

ولایت : بدخشنان

ولسوالی : اشکاشم

قریه : نمازگه

پروژه : سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه

شماره	تفصیل امور	واحد	حجم	قیمت فیلات	قیمت مجموعی	ملاحظه
1	کندن کاری برای تهدیبها در زمین ریگی و چهاردار	متر مکعب	812.51			
2	سنگ کاری با مصاله نسبت 1:4	متر مکعب	617.58			
3	هنگاف کاری با مصاله نسبت 1:3	مترمربع	675.05			
4	کانگریت سیخ دار (RCC) با ترکیب نسبت 1:1.5:3	متر مکعب	0.22			
5	کانگریت بدون سیخ (PCC) با ترکیب نسبت 1:1.5:3	متر مکعب	32.76			
6	پرکاری کف کانال توسط جفل مطابق به نقشه	متر مکعب	0.96			
7	دروازه سربند مکمل الاسباب مطابق به مشخصات نقشه	پله	1			
8	پرکاری عقب دیوارها با مواد کندن کاری شده مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	150.8			
1,737,031		مجموع قیمت تخمینی به افغانی				


قرار شرح فوق جدول برآورد اول امور کاری پروژه ( سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه ) ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان غرض اجرات بعدی ترتیب و تقدیم است.

الجیر سلا (اکبر) :

وحید الله الجیردیزین :

محمد زمان الجیر برآورده

25 11 1396



g 2



دکتر نبیل، ابوالنگونی او مالداری و وزارت  
وزارت زیرالعهت، آبیاری و مالداری

دیاًفغانستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امرت انجمنی

Province : Badakhshan

District : Ishkashim

Village : Namazgah

Project : Namazgah Weir and Canal Protection

ولایت : بدخشنان

ولسوالی : اشکاشم

قریه : نمازگه

پروژه : سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه

شماره	تصیل امور	واحد	حجم	قیمت تخمینی به افغانی	قیمت فیات تخمینی به افغانی	ملاحظه
1	کندن کاری برای تهدابها در زمین ریگی و چغدار	متر مکعب	812.51			
2	سنگ کاری با مصالله نسبت 1:4	متر مکعب	617.58			
3	هنگفت کاری با مصالله نسبت 1:3	مترمربع	675.05			
4	کانگریت سیخ دار (RCC) با ترکیب نسبت 1:1.5:3	متر مکعب	0.22			
5	کانگریت بدن سیخ (PCC) با ترکیب نسبت 1:1.5:3	متر مکعب	32.76			
6	پرکاری کف کانال توسط چغل مطابق به نقشه	متر مکعب	0.96			
7	دروازه سربند مکمل الاسباب مطابق به مشخصات نقشه	پایه	1			
8	پرکاری عقب دیوارها با مواد کندن کاری شده مطابق به مشخصات نقشه	متر مکعب	150.8			
مجموع قیمت تخمینی به افغانی						

قرار شرح فوق جدول برآورد اول امور کاری پروژه ( سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه ) ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان غرض اجرآت بعدی ترتیب و تقدیم است.

انجمن اسلا را ( اکبر ) :

وحیدالله انجمن دیزاین :

محمد زمان انجمن برآورده :

۹۰۰

25 11 1396

۱۳۹۶



د افغانستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان



*Islamic Republic of Afghanistan*  
*Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*

مدونیت ابیاری و منابع طبیعی

ریاست ابیاری

امروزیت انجنیری

Province : Badakhshan  
Duration : Six Month Calender Days  
Granty : One Year

Project : Namazgah Weir and Canal Protection

ولایت : بدخشنان  
مدت پروژه : شش ماه تقویمی

گرفتن پروژه : یک سال

نام پروژه : سریند و تحقیق کاری کنال نمازگاه


شماره	شرحات	واحد	حجم	مداومت به روز	مدت پروژه
1	آمادگی ساخه			14	
2	کندن کاری برای تهدابها در زمین ریگی و چهاردار	متر مکعب	812.51	105	
3	سنگ کاری با مصاله نسبت 1:4	متر مکعب	617.58	105	
4	هنگان کاری با مصاله نسبت 1:3	مترمربع	675.05	90	
5	کلگریت سیخ دار (RCC) بفرکوب نسبت 1:1.5:3	متر مکعب	0.22	2	
6	کلگریت بدون سیخ (PCC) بفرکوب نسبت 1:1.5:3	متر مکعب	32.76	45	
7	پر کاری کفت کنال توسط جمل مطبق به نقشه	متر مکعب	0.96	1	
8	دروازه سریند مکمل اسپاب مطلق به مشخصات نقشه	پله	1	2	
9	پر کاری عقب دیوارها با مواد کندن کاری شده مطلق به مشخصات نقشه	متر مکعب	150.8	45	
10	پاک کاری ساخه			7	

انجینیر سالار (اکبر) :

وحید الله انجینیر دیر این :

محمد زمان انجینیر اوون :


25 11 1396

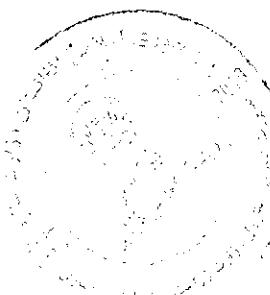

615



د افغانستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان  
*Islamic Republic of Afghanistan*  
*Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*



معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امربیت انجنیری

لست تجهیزات ساختمانی و پرسونل کلیدی پروژه ( سربند و تحکیم کاری کاتال نمازگه ) واقع : ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان


شماره	تجهیزات	نوعیت تجهیزات	تعداد	ملاحظات
بخش ماشینری				
1	اسکواتور		1	
2	گریدر		0	
3	جیکبیر		1	
4	بلوزر		0	
5	ترک		2	
6	کامپرسور		0	
7	کانکریت میکسر		2	
8	جنراتور		1	
9	واپراتور		1	
10	واترپمپ		1	
لست پرسونل کلیدی پروژه				
11	منیجر پروژه		1	
12	انجینیر ساحه		1	
13	انجینیر سروی		1	

امیر



دکتر هنفی، اوپولگولو او مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیساری و مالداری

داغستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

ریاست تهیه و تدارکات

فورم پازدید و منظوری اسناد (شرطنامه) دا طلبی

معلومات عمومی:

عنوان پروژه	بازسازی سربند و تحکیم کاری کانل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشن
نمبر تشخیصیه پروژه	MAIL/PD/NCB/W/135/98
معیاد پروژه	۶ ماه تقویمی
میتوود تدارکاتی	دا طلبی باز داخنی
معیارهای ارزیابی	<p>حد اقل متوسط بحجم معاملات مالانه قابل تطبیق نمی باشد</p> <p>حداقل تجربه مشابه قابل تطبیق نمی باشد</p> <p>حداقل سرمایه نقدی شرکت ۴۰۰,۰۰۰ افغانی</p> <p>تضمین بانکی آفر ۴۵,۰۰۰ افغانی</p> <p>پرسونل تختیکی به تعداد سه نفر</p>
شماره پروژه درپلان تدارکاتی	۱۰۰
تاریخ حصول اسناد تختیکی	۱۳۹۷/۱۱/۱۴

ملاحظات:

ایسناد تختیکی پروژه متذکره به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ به مدیریت ساختمانی ریاست تدارکات موافقات ورزید و به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ در زوئنامه هشت صبح، وبسایت های NPA و MAIL به عنوان سیرداد سی شود.

موقیب کننده:


اسم و وظیفه	اداره مربوطه	تاریخ و امضا
عبدالله محبی، عضو مسلکی تدارکات امور ساختمان	ریاست تدارکات	

مرور کننده:

اسم و وظیفه	اداره مربوطه	تاریخ و امضا
میر محمد مونس حسینی، امر تدارکات امور ساختمانی	ریاست تدارکات	

تائید کننده:

اسم	وظیفه	تاریخ و امضا
محمدالله ساحل	رئیس تدارکات	



جمهوری اسلامی افغانستان  
شرطنامه معیاری تدارک امور ساختمانی کوچک  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  
ریاست تهیه و تدارکات

پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کابل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت  
بدخشان

آدرس اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه، چهارراهی کارتنه سخی کابل، افغانستان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/135/98

تعداد بخش ها (LOTS): ندارد  
کودبودجوی : AFG #: 390676

تاریخ صدور: 1397/11/21

MAIL/PD/NCB/W/135/98 بازسازی سربند و تحکیم کاری کابل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشان

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

### مقدمه

این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی طبق استناد مشابه معیاری داوطلبی مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک که قیمت تخمینی تدارکات الی (500) میلیون افغانی بوده و با استفاده از وجوده عامه<sup>۱</sup> تمویل می گرددند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد.

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد.

با اتفاق این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجنبی متنضم متحددالمال شماره PPU/C024/1388 اصدره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد.

ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 2 ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل می گرددند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند.

نقل این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری  
اداره تدارکات ملی  
ریاست پالیسی تدارکات  
قصر مرمرین، کابل، افغانستان

[www.npa.gov.af](http://www.npa.gov.af)

<sup>۱</sup> وجوده عامه عبارت از پول یا سایر دارایی های مالی و عایدات اداره است که در ماده هشتم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هر گونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوده بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.</p> <p>3.2 اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتكب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلاق و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می نماید.</p> <p>3.3 اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربیط ارجاع می نماید.</p> <p>3.4 اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.</p> <p>3.5 داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفییش و بررسی حسابات، بادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.</p>	<p>ماده 4 - داوطلب واجد شرایط</p>
<p>4.1 داوطلب و شرکای وی میتوانند نایعت هرکشوری را با رعایت محدودیت های مندرج صفحه معلومات داوطلبی داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعلیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد.</p> <p>4.2 داوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد، داوطلب با یک یا بیشتر جوانب این داوطلبی تضاد منافع دارد اگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا طرف که طرح، مشخصات و سایر اسناد مربوط این تدارکات را ترتیب نموده و یا با شخص که منحیث مدیر پروژه تحت این داوطلبی پیشنهاد شده باشد ارتباط داشته باشد. داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود. شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و نظارت امور ساختمانی گردیده و همچنین شرکت های متعلق به آن در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند.</p>	
<p>4.3 اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده و تحت محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد.</p>	
<p>4.4 داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی ارائه نماید.</p>	
<p>5.1 تمام داوطلبان شرح اولیه شیوه کاری پیشنهادی و جدول امور ساختمانی بشمول نقشه ها و چارت های مورد نیاز را در قسمت ۳ فورمه های داوطلبی، ارائه می نمایند.</p>	<p>ماده 5 - اهلیت داوطلب</p>
<p>5.2 در صورت انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، عقد قرارداد صرف با داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت صورت می گیرد. داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت معلومات تجدید شده در مورد اهلیت خویش و یا احصار اهلیت ارزیابی شده را در روز تسلیمی آفر ارائه می نمایند. تجدید یا تأیید استمرار اهلیت در قسمت ۴ درج میگردد.</p>	
<p>5.3 در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را بر علاوه اسناد مندرج اجزای ۲، ۳، ۴ و ۶ فقره (۲) حکم هدفهم طرز العمل تدارکات شامل قسمت ۳ می نمایند. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد:</p>	

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>1- حجم معاملات در سکتور ساختمانی در خلال مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛</p> <p>2- تجربه منحیت قراردادی اصلی در امور ساختمانی در حد اقل تعداد قرارداد های ساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در میعاد مندرج صفحه معلومات داوطلبی (بمنظور مطابقت با این معیار داطلب باید حد اقل (70) فیصد امور ساختمانی را تکمیل نموده باشد) قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از (10) فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیت تجربه مد نظر گرفته شود؛</p> <p>3- یک پلان دسترسی (مالکیت و اجاره) به موقع تجهیزات مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛</p> <p>4- داشتن یک مدیر قرارداد با (5) سال تجربه کاری در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمول حد اقل (3) سال تجربه کاری منحیت مدیر؛</p> <p>5- دارایی های سیال و یا انواع اعتبارات (قرضه) که کمتر از مبلغ تذکر رفته در صفحه معلومات داوطلبی نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داطلب برای سایر قرارداد ها بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد باشد؛</p> <p>استمرار دعاوی یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داطلب یا شریک داطلب مشترک در گذشته منجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داطلب شده می تواند.</p>	
<p>5.6 برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز 1 بند 5 ماده 5 این دستورالعمل، ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا 100 فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حد اقل (25) فیصد و شریک اصلی حد اقل (40) فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد.</p>	
<p>6.1 هر داطلب می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا منحیت شریک شرکت مشترک ارائه نماید. هر گاه داطلب بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریک باشد منجر به رد تمام آفر های که داطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیت قراردادی فرعی و آفر بدیل در صورتیکه مجاز باشد از این امر مستثنی است.</p>	<p>ماده 6- هر داطلب یک آفر</p>
<p>7.1 داطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤولیت چنین مصارف را ندارد.</p> <p>8.1 داطلب می تواند با قبول مسؤولیت و خطرات مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده و معلومات لازم جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد امور ساختمانی را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل به عهده داطلب می باشد.</p>	<p>ماده 7- مصارف داوطلبی</p> <p>ماده 8- بازدید از ساحه</p>
	<p>ب. شرطنامه</p>

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

میعاد تسليمی آفر ها در مطابقت با بند 2 ماده 21 این دستورالعمل تمدید نماید.	
ج- تهیه آفر ها	
ماده 12 - زبان آفر	12.1 تمام استناد مربوط آفر به زبان که در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده ترتیب میگردد.
ماده 13 - استناد شامل آفر	<p>13.1 آفر ارائه شده شامل استناد ذیل می باشد:</p> <p>1- تضمین آفر در مطابقت با ماده 17 این دستور العمل؛</p> <p>2- بل احجام کاری<sup>۳</sup> قیمت گذاری شده؛</p> <p>3- فورمه آفر داوطلبی؛</p> <p>4- استناد و فورم معلومات اهلیت؛</p> <p>5- آفر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛ و</p> <p>6- سایر مواد مطالبه شده در صفحه معلومات داوطلبی.</p>
ماده 14 - قیم آفر	<p>14.1 قرارداد برای تمام امور ساختمانی مندرج بند 1 ماده 1 این دستورالعمل به اساس بل احجام کار قیمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گردد می باشد.</p> <p>14.2 داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقلام امور ساختمانی مندرج بل احجام کاری را ارائه نماید. اقلام که برای آنها نرخ و قیمت ارائه نشده باشد، قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده محسوب گردیده و برداخت به آن صورت نمی گیرد. در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقلامی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از (10) فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیر جوابگو محسوب میگردد. در صورت تصحیح، اغلاط خط زده شده، تصحیح شده امضا و تاریخ تصحیح درج گردد.</p> <p>14.3 تمام محصولات قابل پرداخت، مالیات، بشمول مالیات بر معاملات انتفاعی<sup>۴</sup> (BRT) و سایر مکلفیت های مالی قابل پرداخت تحت این قرارداد 28 روز قبل از ختم میعاد تسليمی آفر، در نرخ ها و قیمت مجموعی آفر شامل گردد.</p> <p>14.4 در صورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد و احکام ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نرخ ها و قیمت های آفر در جریان اجرای قرارداد قابل تعديل میباشند. داوطلب معلومات لازم مندرج ماده 47 شرایط عمومی و خاص قرارداد را توان با آفر خویش ارائه می نماید.</p> <p>15.1 داوطلب باید نرخ فی واحد و قیمت های مندرج آفر<sup>۵</sup> را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طوری دیگر تذکر رفته باشد.</p>
ماده 15 - اسعار آفر و پرداخت	

<sup>4</sup> Business Receipt Tax

<sup>5</sup> اگر قرارداد هایی با پرداخت بالقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" یا "قیمت سر جمع" تعیین گردد، MAIL/PD/NCB/W/135/98 بازسازی سربند و تحریم کاری کانل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشان

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردد.</p>	<p><b>17.4</b> تضمین آفر داوطلبان غیر موفق بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، به آنان مسترد میگردد.</p>
<p><b>17.5</b> در حالات ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- در صورت تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد بند 2 ماده 16 این دستور العمل؛</li> <li>2- در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباها حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛</li> <li>3- در صورت اجتناب داوطلب از پذیرش اشتباها محاسبی در آفر در مطابقت با بند 2 ماده 28 این دستور العمل؛</li> <li>4- اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خلال مدت معینه؛</li> <li>5- عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛</li> <li>6- در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی</li> </ul>	
<p><b>17.6</b> در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.</p>	<p><b>ماده 18- آفر های بدیل</b></p>
<p><b>18.1</b> آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در صفحه معلومات داوطلبی از قبولي آن تذکر رفته باشد. در صورت قبولی آفر بدیل طبق احکام بند 1 و 2 ماده 18 این دستور العمل اجراءات صورت میگردد و پذیرش یکی از گزینه های ذیل در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- داوطلب می تواند آفر های بدیل را با آفر اصلی تسلیم نموده و اداره صرف در صورت که آفر اصلی ارائه شده دارای نازلترين قیمت باشد، آفر بدیل را ملاحظه می نماید.</li> <li>2- داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی تسلیم نماید که در این صورت آفر های اصلی و آفر های بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردد.</li> </ul>	<p>یا</p>
<p><b>18.2</b> آفر های بدیل تمام معلومات لازم بشمول محاسبه دیزاین، مشخصات تختیکی، جزئیات قیمت ها، شیوه پیشنهادی اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب و دیگر جزئیات مربوط جهت ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمایند.</p>	<p><b>ماده 19- شکل ۹</b> <b>امضاء آفر</b></p>
<p><b>19.1</b> داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده 13 این دستورالعمل ترتیب و با علامه کلمه "اصل" علامه گذاری نماید. بر علاوه کاپی های آفر با کلمه "کاپی" علامه گذاری شده و به تعداد مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردد. درصورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.</p>	
<p><b>19.2</b> اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی</p>	

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>22.1 آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردد.</p> <p>23.1 داوطلب می تواند، قبل از ختم ميعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطلاعیه کتبی که توسط نماینده با صلاحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صلاحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعديل و یا از آن انصراف نماید. اطلاعیه کتبی توام با آفر های تعویض، انصراف یا تعديل شده بوده و این اطلاعیه باید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1- در مطابقت با مواد 19 و 20 این دستورالعمل ارسال گردیده، بر علاوه پاکت های مربوط نیز با کلمات "انصراف"، "تعویض" یا "تعديل" نشانی شده باشد.</li> <li>-2- قبل از ختم ميعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.</li> </ul> <p>23.2 تعویض یا تعديل آفر ها بعد از ضرب الاجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.</p> <p>23.3 هرگونه انصراف، تعویض و تعديل آفر ها در فاصله زمانی میان ضرب الاجل تسلیمی آفر ها و ختم ميعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول ميعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 17 دستورالعمل برای داوطلبی میگردد.</p> <p>23.4 داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی یا در اثر تعديل در مطابقت با این ماده دستورالعمل پیشنهاد می نماید.</p>	<p>ماده 22- آفر های نا وقت رسیده</p> <p>ماده 23- انصراف، تعویض و تعديل آفرها</p> <p>23.2 تعویض یا تعديل آفر ها بعد از ضرب الاجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.</p> <p>23.3 هرگونه انصراف، تعویض و تعديل آفر ها در فاصله زمانی میان ضرب الاجل تسلیمی آفر ها و ختم ميعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول ميعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 17 دستورالعمل برای داوطلبی میگردد.</p> <p>23.4 داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی یا در اثر تعديل در مطابقت با این ماده دستورالعمل پیشنهاد می نماید.</p>
<p>24.1 اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعديلات مطابق ماده 23 این دستورالعمل در محضر عام در محل، تاریخ و زمان که در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در صفحه معلومات داوطلبی درج گردد.</p> <p>24.2 در مجلس آفر گشایی، رئیس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختم ميعاد تسلیمی آفر ها اطلاعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند، را اعلام و بدون باز شدن مسترد می نماید.</p> <p>24.3 هیئت آفر گشایی آفر را باز نموده، نام داوطلب، قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل (در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل)، هر گونه تخفیف، انصراف، تعویض، تعديل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 1 ماده 22 این دستورالعمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض و تعديل تسلیم شده مطابق ماده 23 این دستورالعمل برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.</p> <p>24.4 اداره رویاد جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند 3 ماده 24 این دستور</p>	<p>هـ آفر گشایی و ارزیابی</p> <p>ماده 24- آفر گشایی و ارزیابی</p>

MAIL/PD/NCB/W/135/98 بازسازی سربند و تحکیم کاری کانل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخسان

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

<p>27.5 داولطلب مسؤولیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در شرط‌نامه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تعییر قیمت یا تعییل آفر صورت گیرد.</p>	
<p>28.1 اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش از ارزیابی مالی جهت تصحیح اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل ذیل صورت میگیرد:</p> <p>۱- هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود.</p> <p>۲- در صورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد. مگراینکه از نظر اداره به صورت واضح کدام علامه اعشاری در قیمت فی واحد بینجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصلاح می گردد؛</p>	<p><b>ماده 28 - تصحیح اشتباهات</b></p>
<p>28.2 هرگاه داولطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را قبول نکند، آفر وی رد و تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء ۲ بند ۵ ماده ۱۷ این دستور العمل اجرا می گردد.</p>	
<p>29.1 آفر ها به واحد پولی افغانی مطابق بند ۱ ماده ۱۵ این دستور العمل ارزیابی میگردد، در صورتیکه، داولطلب نرخ مبادله دیگری را استفاده نموده باشد نخست قیمت آفر به واحد پولی افغانی با استفاده از نرخ مبادله مشخص شده مندرج آفر تبدیل و ارزیابی آفر ها صورت میگردد. مگر اینکه در صفحه معلومات داولطلبی طور دیگر ذکر گردیده باشد.</p>	<p><b>ماده 29 - اسعار در ارزیابی آفر</b></p>
<p>30.1 اداره آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخفیکی مندرج شرط‌نامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخفیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد. هیئت ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به امر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلت ارزیابی شده را مورد ارزیابی تخفیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.</p>	<p><b>ماده 30 - ارزیابی آفر و مقایسه آفر ها</b></p>
<p>30.1 اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر را طور ذیل تعیین می نماید:</p> <p>۱- تصحیح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده ۲۸ این دستور العمل؛</p> <p>۲- منهای هر گونه وجہ احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که بصورت رقابتی قیمت گذاری شده اند؛</p> <p>۳- تطبیق یک تعیین متناسب برای هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود معقول قبل تعیین شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت به ماده ۱۸ این دستور العمل؛</p> <p>۴- تطبیق تعديلات مناسب که انکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند ۵</p>	

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

<p>34.3 اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برندۀ، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، ویب سایت اداره تدارکات ملی و سایر ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، نشر می نماید:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- نام داوطلبانیکه آفر تضمین نموده اند؛</li> <li>2- قیمت های خوانده شده در آفر گشایی؛</li> <li>3- نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛</li> <li>4- نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دلایل رد آن؛</li> <li>5- نام داوطلب برندۀ، قیمت ارائه شده، مدت و خلاصه حدود قرارداد اعطا شده.</li> </ol>	
<p>34.4 بعد از نشر اطلاعیه عقد قرارداد، در صورتیکه داوطلبان غیر موفق دلایل عدم موفقیت آفر خویش را بصورت کتبی از اداره مطالبه نمایند، اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر دلایل عدم انتخاب آفر ارائه می نماید.</p>	
<p>35.1 داوطلب برندۀ مکلف است، در خلال مدت (10) روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل قسمت 8 (فورمهای قرارداد) یا سایر اشکال قابل قبول به اداره باشد به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده شده است، ارایه نماید.</p>	ماده 35- تضمین اجراء
<p>35.2 در صورت ارائه تضمین اجرا بشكل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم در جمهوری اسلامی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که نمایندگی بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.</p>	
<p>35.3 در صورتیکه داوطلب برندۀ نتواند شرط بند 1 ماده 35 و بند 3 ماده 34 این دستور العمل را برآورده سازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد نمیگردد.</p> <p>35.4 اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تشییت صحت و سقّم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برندۀ و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطلاع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.</p>	
<p>36.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در شرایط عمومی قرارداد از آن تذکر رفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج صفحه معلومات داوطلبی باشد. فورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در فورمهای قرارداد و تضمین قسمت 9 این شرطنامه می باشد.</p>	ماده 36- پیش پرداخت و تضمین پیش پرداخت
<p>37.1 مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد.</p>	ماده 37- مرجع حل و فصل منازعات
<p>38.1 هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرز العمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا گردد، می تواند اعتراض خویش را به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به کمیته بررسی اداری که محل و آدرس آن در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده، ارسال نماید.</p>	ماده 38- حق شکایت داوطلبان

<p>3- ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در 5 سال گذشته؛</p> <p>4- تجربه کاری با ماهیت و اندازه مشابه در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می‌توان برای معلومات بیشتر با وی تماس گرفت.</p> <p>5- اقلام عمدۀ تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛</p> <p>6- اهلیت و تجارب کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل تخصصی که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده می‌شود؛</p> <p>7- گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش یا بیانیه مفاد و ضرر یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی در (5) سال گذشته؛</p> <p>8- مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای این قرارداد (دسترسی به اعتبارات (فرضه) و سایر منابع مالی قابل دسترس)، که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بستر از سایر تعدادات مالی داوطلب برای سایر قراردادها و آفرهای ارائه شده باشد.</p> <p>9- معلومات در مورد دعایی در جریان و یا اختتام یافته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد.</p> <p><b>10- معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی )</b></p>	<p>ماده 5.3<sup>7</sup> جزء 10 دستورالعمل برای داوطلبان</p> <p>ماده 5.4 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>11- در صورت ورود تعددی در اهلیت لازم مطالبه شده از داوطلبان که مندرج بند ۴ ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان میباشد:</p>	
<p>12- آفر شامل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 این دستور العمل برای هر شریک مشترک باشد؛</p> <p>13- آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛</p> <p>14- تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤول تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛</p>	
<p>15- یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤول قبول مسؤولیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛</p> <p>16- اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد</p>	

7 اعطای قراردادی فرعی در روشی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم طرز العمل تدارکات صورت می‌گیرد.

MAIL/PD/NCB/W/135/98 بازسازی سربند وتحکیم کاری کانل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشان

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک – اداره تدارکات ملی

	۱	منیجر پروژه	۱	داوطلبان
	۱	انجینیر ساحه	۲	
	۱	انجینیر سروی	۳	
مبلغ حد اقل دارایی های سیال (نقدی) یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب 400,000 چهارصد هزار افغانی از تاریخ نشر اعلان الی روز آفر گشای در یکی از تاریخ ها در صورت حساب بانکی شرکت (ستتمنت بانکی) ارائه نماید.				ماده ۵.۵ جزء ۵ دستورالعمل برای داوطلبان
ب. مندرجات شرطنامه				
<p>جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد:</p> <p><b>توجه: محمدالله "ساحل"</b></p> <p>رئیس تهیه و تدارکات</p> <p>آدرس: ریاست تهیه و تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری – جمال مینه چهاراهی کارتہ سخنی، کابل - افغانستان</p> <p>مobil: 0766647451</p> <p><u>Mohammdullah.sahil@mail.gov.af</u></p> <p>کاپی به:</p> <p>میر محمد مونس "حسینی</p> <p>امر تدارکات امور ساختمانی</p> <p>ایمیل آدرس: <u>monis.hossaini@mail.gov.af</u></p> <p>mobil: 0782024444</p> <p>نوت: طبق حکم 30 طرز العمل تدارکات، داوطلبان می توانند 7 روز تقویمی قبل از تسليمی افر گشایی، توضیحات خوش را طور کنی ارائه کنند.</p>				ماده 10.1 دستورالعمل برای داوطلبان
<p>جلسه قبل از داوطلبی:</p> <p> ساعت 02:00 بعد از ظهر مورخ 1397/12/06 جلسه قبل از داوطلبی در اتاق جلسات آفر گشایی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت برگزار میگردد.</p>				ماده 10.2 دستورالعمل برای داوطلبان
ج. تهیه آفرها				
<p>آفر مه یکی از زبان های دری یا پشتو ارائه میگردد.</p>				ماده 12.1 دستورالعمل برای داوطلبان
داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی نیل را ارائه نماید:				ماده 13 جزء 6

در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد.  
MAIL/PD/NCB/W/135/98 بازسازی سربند وتحکیم کاری کانل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشان

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

	برای داوطلبان
ج. تسليمی آفر ها	
ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی و پستی "قابل قبول نیست"	ماده 20.1 دستورالعمل برای داوطلبان
صرف به مقاصد ارائه آفر، آدرس اداره عبارت است از: ریاست تهیه و تدارکات منزل دوم آمریت ساختمان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری	ماده 20.2 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان
نام و نمبر تخصیصیه قرارداد در ماده 1.1 دستورالعمل برای داوطلبان در صفحه معلومات داوطلبی فوق ذکر شده است.	ماده 20.2 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان
پاکت آفر حاوی هشدار اینکه قبل از ساعت 02:00 بعد از ظهر مورخ 14 حوت سال 1397 باز نگردد.	ماده 20.2 جزء 3 دستورالعمل برای داوطلبان
ضرب الاجل برای تسليمی آفر ها: ساعت 01:45 بعد از ظهر ، مورخ 14 حوت سال 1397 می باشد.  در صورتیکه این روز رخصتی عمومی بوده و یا رخصتی عمومی اعلان شود، ضرب الاجل برای تسليمی آفر ها روز بعد در همین ساعت خواهد بود.	ماده 21.1 دستورالعمل برای داوطلبان
داوطلبان می توانند قبل از ختم ضرب الاجل برای تسليمی آفرها با دادن یک اطلاعیه کتبی از آفرهای (اسناد داوطلبی) خود انصراف و یا آنرا تعویض و یا تعدیل نمایند.	ماده 23.3 دستورالعمل برای داوطلبان
د. آفر گشایی و ارزیابی	
آفر گشایی در آدرس ذیل دایر خواهد شد:  آدرس: تعمیر عقب منبایع بشری، منزل دوم، اتاق جلسات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه کارتہ سخی، کابل ، افغانستان .  تاریخ و زمان: ساعت 02:00 بعد از ظهر، مورخ 14 حوت 1397 به وقت کابل در صورتیکه این روز رخصتی عمومی بوده و یا رخصتی عمومی اعلان شود، آفر گشایی روز بعد در همین ساعت تدویر میابد.	ماده 24.1 دستورالعمل برای داوطلبان

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

قسمت سوم: فورم‌های داوطلبی

فورم‌های داوطلبی

عنوان فورم	شماره فورم
فورم‌های تسلیمی آفر	01/ امور ساختمانی کوچک
فورم‌های معلومات اهلیت داوطلب	02/ امور ساختمانی کوچک
فورم‌های نامه قبولی آفر	03/ امور ساختمانی کوچک


شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

نام: **[نام شخص درج شود]**

وظیفه: **[وظیفه درج شود]**

امضاء:

تاریخ:



شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

با ذکر طرف های مقابل کر یه و خرید	(جديد، خوب، کهنه، و تعداد قابل دس رس)	(تاریخ ساخت و مدت کارابی)	
{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

1.5 اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد: {جدول دليل ها اضافه نمودن رویف اها بجز صورت ضرورت  
تکمیل گردید} اطلاعات بیوکاریست مخصوصه کاربینه و متن به حزمه 4 بسته 5 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان و بند 1 ماده 9  
شرط عضوی قرارداد، مراجعته شرط، می باشد.

سالهای تجربه کاری در این وظیفه	تعداد سالهای تجربه کاری (عمومی)	نام	وظیفه
{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

1.6 قراردادیان فرعی و شرکت های مریبوط: {جدول دليل ها اضافه نمودن رویف اها بجز صورت ضرورت، مراجعته مراجعته به ماده 7  
شرط عضوی قرارداد، تکمیل گردید} می باشد.

سالهای تجربه کاری در این ظیفه	تعداد سالهای تجربه کاری (عمومی)	نام	وظیفه
{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

1.7 گزارش تفتیش {تفصیل بهار فهم و حروفه درج گردید} سال گذشته، بیانس شیت و بیانیه مفاد و ضرر تأثید شده توسط مفتش  
مستقل {لست و کاری های مخصوصه گردید}.

1.8 شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت: دارایی سیال (نقدي)، دسترسی به انواع اعتبارات (فرضه) و  
سایر اسناد منابع مالی {پیشرفت آن ترتیب و کاری های اسناد حداکثری عرضه گردید} می باشد. داوطلب مکلف است لست  
تعهدات مالی برای پذیری قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز ارائه نماید.

1.9 بمنظور ثبت صحت {نمایه ندارک} منابع مالی، به بانک های ذیل تماس گرفته می شود:

{نامه، آدرس، شماره ملی معمون و فکس بانک درج گردید}

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

فورم نامه قبولی آفر<sup>۹</sup>

فورم امور ساختمانی کوچک/03

شماره: / شماره صدور این نامه درج نمایند / تاریخ: / تاریخ صدور این نامه را درج نمایند /

از: / نام اداره دادگاهی را درج نمایند /

آدرس: / آدرس اداره دادگاهی را درج نمایند /

به: / نام داوطلب برپا شده و شناخته حوا فعالیت وی را ذکر نمایند /

آدرس: / آدرس داوطلب برپا شده را درج نمایند /

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارائه شده مؤخر / تاریخ / روز مخصوص برقرار رسانی شده است، شما برای تدارک / نام و حروف قرارداد را مشخص کردید.

به قیمت قطعی مجموعی مبلغ / قیمت اجرای قرارداد و حروف قرارداد /، طوریکه در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرز العمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

مشخصات تدارکات/قرارداد: /نام و مخصوصات شخص تدارکات/قرارداد را درج نمایند/
شماره تشخیصیه تدارکات: / شماره قرارداد مربوطه را درج نمایند /
قیمت مجموعی قرارداد: / قیمت مجموعی قرارداد را به این قدر و حروف درج نمایند /
نوعیت تضمین اجرای قرارداد: / نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را مشخص کنید /
مقدار تضمین اجرای قرارداد: / مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به این قدر و حروف درج نمایند /
زمان عقد قرارداد: / تاریخ و ساعت عقد قرارداد را مشخص کنید /
مکان عقد قرارداد: / محل عقد قرارداد را مشخص کنید /

همچین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص:

وظیفه:

امضاء و تاریخ<sup>۱۰</sup>

<sup>۹</sup> طبق فقره (۱) حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات، اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت امر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برندۀ ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برندۀ ارسال می شود

<sup>۱۰</sup> این نامه، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء نموده است، امضا شود. این نامه منحیت یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>16- قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.</p> <p>17- تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسريع توسط مدیر پروژه تغيير نموده می تواند.</p> <p>18- مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.</p> <p>19- تأسیسات: منضمات امور ساختمانی که دارای عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاولی، یا بیولوژیکی باشد.</p> <p>20- مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسؤولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.</p> <p>SCC-21 به معنی شرایط خاص قرارداد است.</p> <p>22- ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.</p> <p>23- گزارش بررسی ساحه: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.</p> <p>24- مشخصات: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات واردہ یا تائید شده توسط مدیر پروژه می باشد.</p> <p>25- تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد.</p> <p>26- قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.</p> <p>27- ساختمان های مؤقت: ساختمان دیرایین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.</p> <p>28- تعديل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.</p> <p>29- امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.</p>	<p>2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤثر معنی مذکور یا ختنی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر</p>	<p>ماده 2- تفسیر</p>
--	---	----------------------

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>تفصیل اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می‌نماید، قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می‌نماید. اداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تعییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.</p>	
<p>9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تأیید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می‌پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.</p>	ماده 9- کارمندان
<p>9.2 مدیر پروژه می‌تواند در خواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.</p>	
<p>10.2 اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می‌باشند.</p>	ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی
<p>11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می‌باشد:</p> <p>1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:</p> <p>(1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب ناپذیر امور ساختمان باشد؛ یا</p> <p>(2) غفلت، تخطی از مسؤولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره پاشد به استثنای خود قراردادی</p> <p>2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا اثر جنگ یا آسودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متأثر سازد.</p>	ماده 11- خطرات مربوط اداره
<p>11.2 خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می‌باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد:</p> <p>1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛</p> <p>2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا</p> <p>3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.</p>	
<p>12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤولیت قراردادی می‌باشد.</p>	ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده ۱۰ قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.</p> <p>۲۱.۱ اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تأخیر در شروع فعالیت های مربوطا نقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.</p> <p>۲۲.۱ قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محالات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد.</p> <p>۲۳.۱ قراردادی تمام دستایر مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.</p> <p>۲۳.۲ قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یادداشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مقتض موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند ۱ ماده ۶۰ فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند ۲ حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.</p> <p>۲۴.۱ در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (۱۴) روز از اطلاعیه تصمیم ، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد.</p> <p>۲۴.۲ مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (۲۸) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.</p>	<p>ماده ۲۱- ملکیت ساحه</p> <p>ماده ۲۲- دسترسی به ساحه</p> <p>ماده ۲۳- دستور، تفتیش و بررسی</p> <p>ماده ۲۴- منازعه</p>
<p>ب. کنترول زمان</p> <p>۲۵.۱ قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های امواساختمانی را جهت تأییدی به مدیر پروژه ارائه نماید.</p> <p>۲۵.۲ پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلیل فعالیت ها باشد.</p> <p>۲۵.۳ قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.</p> <p>۲۵.۴ تأیید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.</p>	<p>ماده ۲۵- پلان کاری</p>
<p>۲۶.۱ مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.</p> <p>۲۶.۲ مدیر پروژه در جریان ۲۱ روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جلب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.</p>	<p>ماده ۲۶- تمدید تاریخ تکمیل</p>

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

		می گردد.
		د. کنترول مصارف
35.1 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.	ماده 35- بل احجام کاری	11
35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.		
36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.	ماده 36- تغییر مقدار	۱۲
37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.	ماده 37- اضافه کاری و کم کاری	
38.1 در صورت اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.	ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها	
38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبل ارائه شده در بل احجام کاری منحیت نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.		
38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.		
38.4 در صورتیکه به نسبت استجعالت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیت حادثه قابل جبران بنشانه می شود.		
38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد. نمی باشد.		
39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری <sup>۱۱</sup> ، قراردادی تخمین جریان بول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان بول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبدله قرارداد تبدیل میگردد.	ماده 39- تخمین جریان بول نقد	
40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده	ماده 40- تصدیق نامه	

<sup>۱۱</sup> این قرارداد با پرداخت بالقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند ۱ ماده ۳۷ شرایط عمومی قرارداد با بند ۲ ماده ۳۷ شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعریض گردد:  
بند ۱ ماده ۳۷ قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را در جریان ۱۴ روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.  
بند ۲ ماده ۳۷ در صورت پرداخت بطری موافق خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.

<sup>۱۲</sup> در قرارداد با پرداخت بالقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده ۳۸ شرایط عمومی قرارداد با بند ۱ ماده ۳۸ شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعریض گردد:  
بند ۱ ماده ۳۸ تغییر جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

<sup>۱۳</sup> در قرارداد با پرداخت بالقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد  
MAIL/PD/NCB/W/135/98 بازسازی سربند و تحکیم کاری کامل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشان

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد. مدیر پروژه تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.</p>	<p>42.3 در صورت ورود خسارت به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.</p>	<p>ا) ماده 43- مالیه</p>
<p>43.1 مدیر پروژه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی(BRT)، و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسلیمی آفرها و آخرين تاریخ تصدیق تکمیلی، تعديل می نماید. این تعديل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبل از قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.</p>	<p>ماده 43- مالیه</p>	
<p>44.1 در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.</p>	<p>ماده 44- اسعار</p>	
<p>45.1 تعديل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.</p>	<p>ماده 45- تعديل قیم</p>	
<p>46.1 اداره الی ختم تمام کار، قسمتی از پول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.</p>	<p>ماده 46- تأمینات</p>	
<p>46.2 تأمینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورانی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.</p>	<p>ماده 46- تأمینات</p>	
<p>47.1 جرمیه تأخیر به نرخ فی روز مندرج شرایط خاص قرارداد برای روز های تأخیر محاسبه میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد. جرمیه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشت طرز العمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جرمیه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد. قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جرمیه تأخیر تأثیری بر مسؤولیت های قراردادی ندارد.</p>	<p>ماده 47- جرمیه تأخر</p>	
<p>47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جرمیه تأخیر، مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جرمیه تأخیر توسط قراردادی را با تعديل تصدیق نامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.</p>	<p>ماده 47- جرمیه تأخر</p>	
<p>48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مكافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مكافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است) شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است تصدیق می نماید.</p>	<p>ماده 48- میکافات</p>	
<p>49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکنانه وضع نمیگردد.</p>	<p>ماده 49- پیش پرداخت</p>	
<p>49.2 قراردادی پیش پرداخت <del>باید</del> صرف برای پرداخت به تجهیزات، تاسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت ثبت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کایه های اనوایس ها یا دیگر استند را به مدیر پروژه ارائه می نماید.</p>	<p>ماده 49- پیش پرداخت</p>	

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی


قرارداد از جانب قراردادی یا عدم تأییدی آن از جانب مدیر پیروزه، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.	
--	--

!



۳۳

## شرط‌نامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>58.3 ۵ اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می‌نمایند:</p> <p>۶- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر<sup>۱۵</sup> (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.</p> <p>7- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهوأ به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و با اجتناب از اجرای مکلفیت‌ها صورت گیرد.</p> <p>8- تباین: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر<sup>۱۶</sup> داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قراردادن نادرست اعمال سائزین طرح گردیده باشد.</p> <p>9- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسایدین به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می‌باشد.</p> <p>10- ایجاد اخلاق و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پرسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می‌باشد.</p> <p>اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برندۀ ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتكب فساد، تقلب، تباین، اجبار یا ایجاد اخلاق و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می‌نماید.</p> <p>اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تباین، اجبار و اخلاق در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربسط ارجاع می‌نماید.</p> <p>اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می‌نماید.</p> <p>داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی حسابات، یادداشت‌ها و سایر اسناد مربوط به تسليمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مقتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.</p> <p>58.4 هیچ نوع فیس، مكافات، تخفیف، تخفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پرسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهاییکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی‌شود.</p>	<p>ماده ۵۹- پرداخت به محض فسخ</p> 
<p>59.1 در صورت فسخ قرارداد بدليل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروره تصدیق‌نامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفرقی پیش پرداخت پرداخت شده الی تاریخ صدور تصدیق‌نامه و فیصی قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل ناشده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می‌نماید. جریمه تأخیر اضافی قابل تطبیق نمی‌باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محسوب می‌گردد.</p> <p>59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدليل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، <sup>۱۷</sup> پروره تصدیق‌نامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفرقی پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور</p>	

<sup>۱۵</sup> به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مریوط به پرسه تدارکات یا اجرای قرارداد می‌باشد.

<sup>۱۶</sup> از بیه شرکت گفته های پرسه تدارکات (شمول مقامات دولتی) که تصدی سازش یا کاهش سطح رقابت بر پرسه تدارکات را داشته اند، اطلاق میگردد.

قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

اداره این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه پری مینماید. معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند.	
تعديلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد	مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسائل عمومی	
میعاد رفع نواقص بعد از پروسه تسلیم دهی و تسلیم گیری موقت مدت یکسال تقویمی میباشد.	جز 12 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری	جز 14 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تعین شده تکمیل کاربرای تمام امور ساختمانی مربوط ۶ ماه تقویمی میباشد.	جز 17 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه یکتن از ریاست آبیاری می باشد.	جز 20 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
محل ( ساحه ) کار قریه نمازگه ولسوالی اشکاشم ولايت بدخshan	جز 22 بند ۱ ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
تاریخ آغاز کار از روز صدور مكتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.	جز 25 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
امور ساختمانی بازسازی سربند و تحکیم کاری کانل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخshan	جز 29 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>کارمندان کلیدی یک مدیر قرارداد یعنی انженیر با ۵ سال تجربه در احرای قراردادهای امور ساختمانی که دارای ماهیت و حجم معادل و مشابه، به شمول اینکه به حیث مدیرپروره برای مدت حداقل سه سال تجربه داشته باشد یک انженیر ساحه.</p>	<p>بند ۱ ماده ۹ شرط عومومی قرارداد</p>																								
<table border="1" data-bbox="218 460 1209 1015"> <thead> <tr> <th>شماره</th><th>نام بست</th><th>تعداد</th><th>درجه تحصیل</th><th>تجربه عمومی کار (سال)</th><th>رشته تحصیلی</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td><td>مدیر پروره یا آمر پروره جهت تنظیم امورات ساختمانی در ساحه طبیق پروره</td><td>۱</td><td>لیسانس</td><td>۵</td><td>سیول</td></tr> <tr> <td>۲</td><td>انженیر ساحه</td><td></td><td>لیسانس</td><td>۳</td><td>رشته های ساختمانی</td></tr> <tr> <td>۳</td><td>انженیر سروی</td><td></td><td>لیسانس</td><td>۳</td><td>سرروی</td></tr> </tbody> </table>	شماره	نام بست	تعداد	درجه تحصیل	تجربه عمومی کار (سال)	رشته تحصیلی	۱	مدیر پروره یا آمر پروره جهت تنظیم امورات ساختمانی در ساحه طبیق پروره	۱	لیسانس	۵	سیول	۲	انженیر ساحه		لیسانس	۳	رشته های ساختمانی	۳	انженیر سروی		لیسانس	۳	سرروی	
شماره	نام بست	تعداد	درجه تحصیل	تجربه عمومی کار (سال)	رشته تحصیلی																				
۱	مدیر پروره یا آمر پروره جهت تنظیم امورات ساختمانی در ساحه طبیق پروره	۱	لیسانس	۵	سیول																				
۲	انженیر ساحه		لیسانس	۳	رشته های ساختمانی																				
۳	انженیر سروی		لیسانس	۳	سرروی																				
<p>مبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: (تهیه بیمه از وجایب و مکلفیت داوطلبان میباشد و شامل موارد ذیل می باشد).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد (افغانی)</li> <li>۲- برای زیان یا خساره به تجهیزات قیمت تعویضی آن (تجهیزات مربوطه) پرداخته میشود.</li> <li>۳- برای زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات (افغانی)</li> <li>۴- مرگ یا خساره به کارمندان:</li> </ul> <p>(۱) کارمندان قراردادی (افغانی در هر رویداد) (۲) افراد دیگر (۰) افغانی</p> <p>بیمه مطابق ماده ۱۳ شرایط عومومی قرارداد قابل تطبیق است</p>	<p>بند ۱ ماده ۱۳ شرط عومومی قرارداد</p>																								
<p>گزارشات بررسی ساحه (کتابچه ژورنال و راپور های یومیه انженیر مراقبت کننده) می باشد.</p>	<p>بند ۱ ماده ۱۴ شرط عومومی قرارداد</p>																								
<p>مدیر پروره به پرسش های قراردادی توضیحات ارائه می نماید</p>	<p>بند ۱ ماده ۱۵ شرط عومومی قرارداد</p>																								

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

د. کنترول مصرف	
بند 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد	قراردادی مکلف است تا هر نوع تغیرات در احجام کاری را قبل از انجام آن به مدیر پروژه بطور کتبی اطلاع داده و مدیر پروژه را مطلع سازد.
در صورت موجودیت اضافه کاری، قبل از انجام آن در ساحه مدیر پروژه مکلف است تا موضوع را با ذکر دلایل موجه به آمر اعطای پیشنهاد نموده و تعديل احجام (اضافه کاری) مطابق به طرز العمل تدارکات صورت گیرد.	
بل احجام تجدید شده که شامل (اضافه کاری داخل و با خارج آفر) باشد همراه با تعديل قیمت قرارداد توسط طرفین قرارداد (اداره و قراردادی) قبل از انجام کار امضا گردد.	
تعديل قرارداد شامل (اضافه کاری، تمدید معیاد) در خلال معیاد قرارداد و قبل از انجام کار صورت گیرد، در غیر آن بعد از انجام کار و یا ختم معیاد قرارداد قابل پرداخت و مجزا نبود و مکلفیت به دوش قراردادی می باشد.	
مدیر پروژه نمی تواند هیچ نوع تعديل (افزایش یا کاهش در قیمت قرارداد) به طور خو سرانه اجرا نماید.	
بند 1 ماده 40 شرایط عمومی قرارداد	<p>پرداخت های به اساس پیشرفت فریکی کار صورت میگیرد.</p> <p>برای انجام پرداخت ها اسناد ذیل نیاز می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ صورت حساب (نوایس) شرکت قراردادی</li> <li>▪ بل احجام کار از احجام کار انجام شده</li> <li>▪ اندازه گیری کار انجام شده</li> <li>▪ رایپور تست های کنترول و کفیت کار (Quality Control Tests)</li> <li>▪ تصدیق مدیر پروژه از کار انجام شده</li> <li>▪ تصدیق مراقبت کننده از کار انجام شده</li> </ul>

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>اندازه جریمه تاخیر (0.05) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 57 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>پیش پرداخت الی (10٪) قیمت قرارداد بوده) در مقابل تضمین بانکی غیرمشروط پرداخت میگردد. معیاد اعتبار تضمین پیش پرداخت الی ختم معیاد قرار داد می باشد، پیش پرداخت 30 روز بعد از امضا قرارداد و ارائه تضمین پیش پرداخت صورت گرفته می تواند.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. پیش پرداخت مطابق به شرایط خاص قرارداد الی 30 فیصد صورت گرفته می تواند.</li> <li>2. تضمین پیش پرداخت دواطلب مطابق پیشرفت فزیکی کار آزاد ساخته می شود.</li> </ol> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 30 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 3 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 20 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 2 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 10 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 1 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>اداره این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در حالات خاص حسب لزوم دید و حکم آمر اعطای، برابر با پیشرفت فزیکی کار مقدار تضمین پیش پرداخت را آزاد سازد.</p>	<p>بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>مبلغ تضمین اجرا آپنج(5) فیصد مجموع قرارداد میباشد.</p> <p>تضمين اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط.</p>	<p>بند 1 ماده 50 شرط عمومی قرارداد</p>
<p>ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 56 شرط عمومی قرارداد</p>
<p>درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ (20,000 ) از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید</p>	<p>بند 2 ماده 56 شرط عمومی قرارداد</p>

قسمت ششم: مشخصات تختنیکی و شرایط اجرا

پادشاهیت ها در مورد مشخصات عمومی

باین پادشاهیت صرف جهت ترتیب مشخصات تختنیکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در استاد نهایی شامل نمی باشند اما

مشخصات تختنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان میباشد.  
در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تختنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، مواد خام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمریت و منصفانه بودن که سبب ارائه آفر جوابگو و تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد.

مشخصات تختنیکی بیانگر اینکه تمام اجتناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخرين یا جدیدترین مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح و دیزاین مواد میباشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.

مشخصات تختنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. اکثر مشخصات تختنیکی که برای اجرای قرارداد امور ساختمانی مناسب باشد، از جانب اداره یا انجمن تحریر میگردد. مشخصات تختنیکی معیاری با کاربرد فراتر از تمام سکتورها وجود ندارد، اما اصول و عرف پا بر جا موجود در این استناد منعکس گردیده است.

معیاری سازی مشخصات تختنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتورهای دولتی چون شاهراهها، بنادر، قطار آهن مسکن، شهری، آبیاری، و تأمین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگردد. مشخصات تختنیکی عمومی شامل طرز کار، مواد و تجهیزات که معمولاً در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد. هرگونه جذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تختنیکی عمومی باشد. مشخصات تختنیکی عمومی مشخصات اند که توسط وزارت های سکتوری انهدادهای مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی استاندرد (ISO) صادر شده باشد.

توجه داشت که مشخصات تختنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تختنیکی تهیه شده از نهادهای داخلی یا بین المللی میبن این باشد که اجنبی، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تختنیکی بوده و مشخصات تختنیکی معادل یا بالاتر از معیارات ذکر شده، قابل قبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تختنیکی درج گردد.

معادل بودن معیارها و کودها

درصورتیکه از معیارات و کودهای خاص جهت تهیه اجتناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرين ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و کودها از نهادهای جمهوری اسلامی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیارهای دیگر معادل یا بالاتر از آن مشروط بر توافق کتسی و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول میباشد. قراردادی، تفاوت میان معیارهای مشخص شده و معیارهای بدیل پیشنهاد شده را بصورت واضح کتسی ارائه و در جریان (28) روز قبل از توافق کتسی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم مینماید. در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیارهای مشخص شده اسناد داوطلبی را برآورده نماید.



قسمت هشتم بل احجام کار<sup>۱۷</sup>

یادداشت ها درمورد بل احجام کار

ضم میباشد

این یادداشت صرف معلومات برای ترتیب بل احجام کار به اداره بوده و در استناد نهایی شامل نمیگردد.

اهداف

اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

- ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهیه آفر بشکل متمر و درست از جانب داوطلب میگردد;
- ارائه بل احجام کار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختمان اجرا شده در صورت عقد قرارداد.

برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقلام در بل احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امور ساختمان با تتفیک بخش ها یا امور ساختمان با ماهیت مشابه که در ساحت مختلف، شرایط مختلف انجام و سبب بررسی مصارف از جهات مختلف میگردد، صورت گیرد.

با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار باید تا حد ممکن ساده و خلاصه باشد.

جدول مزد کار

جدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پیش بینی نشده بیرون از بل احجام کار بیشتر باشد. جهت بررسی واقعی بودن نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذیل میباشد:

- لست بخش های مختلف نیروی کار، مواد و تاسیسات امور ساختمان که به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت ها درج میگردد، با بیانیه شرایط پرداخت امور ساختمان به قراردادی
- مقدار اسمی برای هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد.

مبالغ احتمالی

یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فزیکی (افزایش مقدار) در بل احجام کار شامل میگردد.

همچنان هزینه احتمالی برای افزایش ممکن قیمت منحیت مبلغ احتمالی در بل احجام کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد.

شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و حلولگیری از درخواست دورانی برای نیاز های آینده میگردد.

در صورت استفاده مبلغ احتمالی (Contingency Allowance) روش استفاده و مقام با صلاحیت منظور کننده آن که معمولاً مدیر پروره میباشد، در شرایط خاص قرارداد ذکر میگردد.



<sup>۱۷</sup> برای قرارداد های پالستیک، بلو احجام کار صرف بیکار ارائه مدهی نمایند. هر اراضی مملوکات از این بخش بقدر بیکار ارائه مدهی نمایند.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

### قسمت نهم - فورمه های قرارداد و تضمین

فورمه ها	عنوان فورمه ها
فورمه امور ساختمان کوچک/05	تضمين آفر: تضمین بانکی
فورمه امور ساختمان کوچک/06	اظهار نامه تضمین آفر
فورمه امور ساختمان کوچک/07	تضمين اجرا (غیر مشروط)
فورمه امور ساختمان کوچک/08	تضمين پيش پرداخت: تضمین بانکی
فورمه امور ساختمانی کوچک/09	موافقت نامه قرارداد

الف) فورمه های نمونه ای قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت از ارائه گردیده است، با این حاله این فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت را در این نیروسته خاله برای تعیین تعابد بینها دلخواه بورنده این دو فورمه را از ارائه می توانند.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

اظهار نامه تضمین آفر

فورمه امور ساختمان کوچک/06

شماره اعلان تدارکات:

{اعلان تدارکات درج گردید}

شماره شرطنامه داوطلبی:

{شماره داوطلبی درج گردید}

شماره آفر بدلیل:

{در شرطنامه این آفر بدلیل نمایند، شماره شرطنامه این درج گردید}

تاریخ:

{روز، ماه و سال تسليیم آفر درج گردید}

به: {نام مکمل اداره درج گردید}

ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینماییم که:

ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد.

ما می پذیریم که در صورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت {اعلان تدارکات درج گردید} سر از {تاریخ درج گردید} محروم گردیم، وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:

۱- ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛

۲- تغییر با انصراف در میعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسليمی آفر؛

۳- انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛

۴- اختیاب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛

۵- فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده.

این اظهار نامه تضمین آفر در صورت بردنده شدن ما و تسليمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرارداد با داوطلب بردنده و یا 28 روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد.

امضا: {امضای شخصی که صلاحیت امضای این اظهار نامه را دارد،

دارای صلاحیت امضای این اظهار نامه از طرف: {نام داوطلب درج گردید}

تاریخ: {روز، ماه و سال درج گردید}

میهر: {مهر گردید}

{یادداشت: در صورت تحریک مدرسک، این اظهار نامه تضمین آفر تا زمانی که تمام شرکی آفر را ارائه گزند،

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تضمين پيش پرداخت: تضمين بانکي

فورمه امور ساختمان کوچک 08

به استثنی درخواست دادطلب نباشد، باشک این فورمه را مطابق رهم عده از ائمه شدید خاتمه باری می پنداشند.

بانک: (نام و آدرس بانک درج گردد)

ذینفع: (نام و آدرس اداره درج گردد)

تاریخ: (روز، ماه و سال) (تاریخ درج گردد)

شماره تضمين بانکی آخر (شماره درج گردد):

ما (نام قانونی و آدرس بانک درج گردد) اطلاع حاصل نمودیم که (نام و آدرس قراردادی ذینفع گردید)، که منبعد بنام "قراردادی" یاد می شود، قرارداد شماره (شماره قرارداد درج گردد)، مؤخر (روز، ماه و سال درج گردد)، را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان (نام قرارداد توضیح مختص امور ساختمان درج گردد)، غفل نماید.

علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پيش پرداخت در مقابل تضمين پيش پرداخت صورت میگیرد.

به درخواست قراردادی، تعهد می نمایم که بدون چون و چرا مبلغ (متبلغ به محو قیمت ارتفاق درج گردد)، را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پيش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته باشد شما بپردازیم.

این یک شرطی است برای تهیه هر نوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پيش پرداخت متذکره فوق باید توسط قراردادی به حساب پیشگیرش دریافت شده باشد (شماره و محل حساب درج گردد)

متبلغ این تضمين بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پيش پرداخت توسط قراردادی که در کایی بیانیه موقت یا تصدیقنامه پرداخت از آن نذکر و به نارانه گردیده، کم میگردد. این تضمين بمجرد دریافت کایی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه (80) فیصد قیمت قرارداد برای پرداخت تصدیق گردیده، یا به تاریخ (روز، ماه و سال) (تاریخ گردد)، فاقد اعتبار میگردد.

این تضمين تابع مقرره منتشره شماره 785 اطاق تجارت بین المللی، میباشد.

(امضا نهایته با صلاحیت اخذ گردد)

(شهر بانک)

<sup>24</sup> این تاریخ (28) روز بعد از تاریخ تضمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید این تضمين را فورمه ندرج مینماید: "تضمين کنند (بانک) به یک تمدید زمان برای مدت که نیاید بیشتر از (6) ماد (1) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اختبار تضمين، موافقه مینماید"

فورمه معیاری برای دعوتنامه داوطلبی

دعوت به داوطلبی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان  
باکود نمبر MAIL/PD/NCB/W/135/98

1. این دعوتنامه برای داوطلبی به تعقیب پلان عمومی تدارکاتی سالانه توسط ریاست تهیه و تدارکات برای سال 1397 ترتیب شده است.

2. ریاست تهیه و تدارکات از تمام داوطلبان دارای اهلیت و واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا آفرهای سربسته خویش را برای بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان ارائه نمایند.  
میعاد تحويل و تکمیل امور ساختمانی 6 ماه تقویمی میباشد.

3. پرسه داوطلبی از طریق داوطلبی باز ملی طبق قانون تدارکات عامه و متعدد المالها و برای تمام داوطلبان ازمنابع و کشورهای واجد شرایط طوریکه درشرطنامه تعریف شده است، راه اندازی خواهد شد.

4. داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتوانند معلومات بیشتر را از میر محمد مونس "حسینی" شماره تیلفون 0782024444، ایمیل: monis.hossaini@mail.gov.af ریاست تهیه و تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مراجعه نمایند.

5. پژاییط اهلیت شامل (به قسمت های ذکر شده در شرایط برای داوطلبان، مراجعه گردد). یک حد ترجیح برای قراردادها و شرکت های مشترک قابل اجراء خواهد بود.

6. یک مجموعه مکمل شرطنامه به دری توسط داوطلبان با ارائه یک درخواست تحریری همراه جواز شرکت به آدرس ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

7. آفرها باید به آدرس ذیل به ساعت 01:45 بعد از ظهر به وقت کابل مورخ 14 حوت سال 1397 تحويل داده شود. داوطلبی الکترونیکی مجاز نیست. آفرهای ناوقت رسیده رد خواهند شد. آفرها طور طبیعی درحضورداشت داوطلبان یا نماینده های آنها که خواهان حضور فزیکی ریاست تهیه و تدارکات منزل دوم، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه، چهاراهی کارتنه سخنی، کابل، افغانستان، 02:00 بعد از ظهر به وقت کابل 14 حوت سال 1397 گشوده خواهند شد.

8. تمام آفرها باید همراه با یک تضمین آفر (تضمين بانکي) مبلغ (45,000)افغانی باشد.

9. آدرس به منظور تسلیمی آفر عبارت است ریاست تهیه و تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه، چهاراهی کارتنه سخنی، کابل، افغانستان

10. هر نوع معلومات شامل در این دعوت به داوطلبی درضورت تفاوت با احکام دستورالعمل برای داوطلبان قسمت 1 شرطنامه جایگزین شده میتواند.



صفحه اصلی داوطلبی

متون را حسنه جو نمائید

**پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سریند و تحکیمکاری کانال نمازگه واقع در ولسوالی  
اشکاشم ولايت بدخشنان**

در باره وزارت زراعت

تاریخ نشر: 2019 Feb 10,

استند تحقیقی و اداری وزارت

تاریخ خاتمه: 2019 Feb 05,

مقام وزارت

Download Document سند داوطلبی:

معینیت‌ها و ریاست‌ها

پلان‌های کاری

محظوظات:

خبرها

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/135/98

دانستان‌های موافقیت

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واحد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سریند و تحکیمکاری کانال نمازگه واقع در ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان اشتراک نموده، شرط‌نامه مربوطه را در فلش‌سک و یا هم در سی‌دی (CD) بطور رایگان از امریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویسایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) بست آورده، افرادی که خوبیش را مطابق شرایط مندرج شرط‌نامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سریعه از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۱ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر به تعییر عقب منابع بشري اتفاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، افرادی که ناوگر رسانیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

مقنه نامه دهقان

کاریابی

نتصمن افراد بصورت تصمین‌خط بانکی به مبلغ چهل و پنج هزار (۴۵,۰۰۰) افغانی بوده، جلسه آفریگمانی بر تاریخ ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر در اتفاق جلسات افریگمانی ریاست تهیه تدارکات دایر می‌گردد.

زعفران افغانستان

نمایشگاه زراعت

مراحل کاری

برنامه‌ها و پروژه‌ها

بانک اطلاعات

خدمات علم زراعتی

مزایع اطلاع‌رسانی وزارت

قورهای عرضه خدمات

گزارش‌ها

دانسته‌ها

دانسته‌ها

دست اول ایصال وزارت

جایخته بین‌المللی  
GENEVA CONFERENCE ON  
AFGHANISTAN  
27 - 28 November 2018

بانک معلوماتی قیم محصولات زراعتی

قوائیں، مقررات، اساسنامه‌ها، و طرز العمل‌های  
زراعتی

پیشتر



## اعلانات

وزارت زراعت، آبیاری و ملداری مینه دهقان  
و بیستودهمین نمایشگاه...

پورسیه های فوق لسانس ماستری در رشته  
های مرتبط به گندم (دور دوم)

پیشتر

## ویدیوها


نمایشگاه نمایش  
Posted by .  
17,091 Views

افتتاح نمایشگاه بین المللی محصولات زراعی در  
دیه  
قرار است این نمایشگاه تا پنج روز دیگر ادامه  
داشته باشد.  
#وزارت\_زراعت\_آبیاری\_و\_ملداری

See Translation

481 14 59

## Social Media



© e-Government of Afghanistan.  
All rights reserved.

نمایشگاه و جشن زراعتی

اخبار و اعلانات

فعالیت های وزارت زراعت

معرفی پالنکاری زراعت

گلزاری

تلوبیت های ده گذشه

آخوندک

معزف

پندتین، نمایشگاه برز اعنی

امدادخواهی مکانیزه

آبروی

تمدن پاها

1397

دانه خلیلی

بللابری

GENEVA CONFERENCE ON  
AFGHANISTAN  
27 - 28 November 2018



**Islamic Republic of Afghanistan  
Administrative Office of the President  
National Procurement Authority**

| جستجو | سوالات و جوابهای تدارکات | کمک و رهنمانی | پیوندها | ارتباط با ما | دخول شدن به سیستم برای اعضاء | اصلی | English

**وضعیت کاربری**

Welcome, MNasim.I  
[Logout]

مسیریابی در وبسایت  
صفحه اصلی ابزارهای نهادهای  
تدارکاتی

**معلومات مبتنی بر تدارکات**

- پلان تدارکاتی
- نظرات تدارکات

**معلومات روزمره تدارکات**

- داوطلبی ها
- ثبت شرکت های فرادرادی
- فرادرادهای اعطا شده

**آرشیو معلومات**

- چت همای کارشناسی
- گزارشات

گزارشات پلان تدارکاتی

گزارشات نظرات تدارکاتی

**گزارش فرادرادهای اعطا**

- شده
- گزارش متابوسی تدارکات

تغییر کلمه عبوری

**Online Users**

Reload	Filter	لطفاً انتخاب کنند...	
دری	ID		
	12628		
		نوعیت تدارکات	
		تدارکات امور ساختمانی	
		دروغی	
		شیوه تدارکات	
		دروغی باز	
		نمبر بودجه منظور شده	
		AFG/390676	
		شماره فرادراد	
		MAIL/PD/NCB/W/135/98	
		توضیح	
		پروژه بازسازی سربند وتحکیم کاری کائن نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدختان	
		تاریخ اختتام داوطلبی (ضرب العجل)	
		14/12/1397	

Uploads/MAIL39/BiddingOpportunities/12628/BidDocuments/BidDocument.pdf/~

اسناد داوطلبی

توضیح تعديلات	

Uploads/MAIL39/BiddingOpportunities/12628/NoticeOfTender/NoticeOfTender.pdf/~

اعلام داوطلبی

Description	
پروژه بازسازی سربند وتحکیم کاری کائن نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدختان	Download Info
	Download Details
Delete	New
Edit	
354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 ...	

**INVOICING PARTY**

Hasht e Sobh Daily newspaper  
H # 1, Street 5, Sherpure  
Kabul Afghanistan

**Invoice recipient**

Ministry of Agriculture  
Kabul Afghanistan

Invoice Number : INV-19-028

DATE : 10-Feb-19

Currency :AFN

DETAILED DESCRIPTION	QUANTITY OF SERVICES	Date	Issue	NET AMOUNT	TOTAL
Publishing advertisement نشاره دعوت به ناوهنگی MAIL/PD/NCB/W/135/98 بروکس نادوطفنی بروزہ مجازی سرتی سریت و تحریک کاری کلین نیاز گاه وافی و لسوالی اشکشم و لایت بدختان	1	10-Feb-19	3050	4000	4000

TOTAL                          VAT AMOUNT ( % )                          AFN

4000                          4000


**BANK DETAIL**

Account Name: 8 Sobh Daily  
 Account Number/IBAN: ((0510101002047117))  
 Account Type:(AFN OR USD) AFN  
 Bank Name: Afghanistan International Bank (AIB)  
 Bank Address: Mirwais Maidan Branch, Kota e Sangi, Kabul  
 Bank Swift Code: AFIBAFKA  
 Intermediary Bank Standard Chartered Bank New York - NY US  
 Account Number: ((3582026146001))  
 Best Regards



دکتر هنفی، اوبولگولو او مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

دافتارستان اسلامی جمهوری دولت  
دولت جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری  
ریاست تهیه و تدارکات  
آمریت تدارکات ساختمانی  
مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی

تاریخ: ۲۱ / ۱۷ / ۹۶

شماره (۳۱۸)

به روزنامه محترم هشت صبح!  
لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشاعه آنرا از دارای وزارت محاسبه نمایید.

«دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/135/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروردۀ بازسازی سربند و تحکیم کاری کامل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان اشتراك نموده شرطname مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطname و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۰ بعد از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمين آفر بصورت تضمين خط بانکی (۴۵ میلیون ۰۰۰) چهل و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائي بتاريخ معينه ساعت ۰۰:۰۰ بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائي ریاست تهیه و تدارکات تدوير ميگردد.


با احترام  
محمد الله "ساحل"  
رئیس تهیه و تدارکات

کذبی به:  
مدیریت عمومی پلان جهت نشر اعلان  
دوسیه مربوطه



## دکر هنی، او بولگولواو مالداری وزارت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

## د افغانستان اسلامی جمهوری دولت دولت جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری  
ریاست تهیه و تدارکات  
آمریت تدارکات ساختمانی  
مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی

تاریخ: ۲۱/۱۱/۹۵

( ۱۸ ) شماره

## به روزنامه محترم هشت صبح!

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سیرده و پول حق انشاعه آنرا از دارایی، وزارت محاسن نمائید.

## «دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به دادگاه MAIL/PD/NCB/W/135/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از وب سایت اداره تدارکات ملی ([www.npa.gov.af](http://www.npa.gov.af)) بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰ بعد از ظهر به تعمیر عقب منابع بشري اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنستی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی (۵۰۰،۰۰۰) چهل و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۲:۰۰ پس از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه تدارکات تدویر میگردد.


با احترام  
محمد الله "ساحل"  
رئيس تهییہ و تداریکات

## کاپی بے : مددیریت عمومی پلان جہت نشر اعلان



دکر هنی، اوپولگولسو او مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

دافتار افغانستان اسلامی جمهوری دوست  
دولت جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری  
ریاست تهیه و تدارکات  
آمریت تدارکات ساختمانی  
مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱

شماره (۴۸)

به روزنامه محترم هشت صبح!

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق اشاعه آنرا از دارائی وزارت محاسبه نمائید.

«دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/135/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان اشتراك نموده شرطname مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ([www.npa.gov.af](http://www.npa.gov.af)) بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطname و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۱۴ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر به تعمیر عقب منابع بشري اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترننتي قابل پذيرش نمیباشد.

تضمين آفر بصورت تصميم خط بانکي (۵۰۰,۰۰۰) چهل و پنج هزار افغاني بوده و جلسه آفرگشائي بتاریخ معینه ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائي ریاست تهیه تدارکات تدوير ميگردد.

با احترام  
محمد الله  
رئیس تهیه و تدارکات

کابی به:  
مدیریت عمومی پلان جهت نشر اعلان  
دوسیه مربوطه



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation  
معینیت مالی و اداری  
ریاست تهیه و تدارکات



## گزارش ارزیابی آفر

و

پیشنہاد برای اعطاء قرارداد

نام پروژه: بازسازی و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع  
ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/W/135/98



نمبر تشخیص بودجه: AFG/390676  
ترتیب کننده گزارش: هیئت ارزیابی

فورم معیاری خلاصه معلومات داوطلبی

فورم (د - 2)

معلومات عمومی پروژه	
نامزگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان	اسم پروژه
MAIL/PD/NCB/W/135/98	شماره داوطلبی
ساختمان	نوعیت تدارکات
11,737,031 افغانی	قیمت تخمینی
داوطلبی باز داخلی بالقطع	روش تدارکات
AFG/390676	نوع قرارداد
ارزیابی قبلی اهلیت (در صورتیکه انجام یافته باشد)	نوع و کود بودجه
ارزیابی قبلی انجام نیافته	تاریخ اعلان
نخیر	تعداد داوطلبان ارزیابی شده
نخیر	تعداد داوطلبان موفق
اعلان و آفر گشایی	
1397/11/21 برای مدت 23 یوم	تاریخ و مدت اعلان
روزنامه هشت صبح، ویب سایت های تدارکات ملی و وزارت زراغت، آبیاری و مالداری	نام نشریه ها داخلی و بین المللی (در صورت لزوم) که اعلان در آنها نشر گردیده
1397/12/06 ساعت 02:00 بعداز ظهر	تاریخ جلسه قبل از داوطلبی (در صورت لزوم)
1397/12/14 ساعت 01:45 بعداز ظهر	تاریخ و زمان ضرب الاجل تسلیمی آفر ها
ندارد	تمدید ميعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها (در صورت لزوم)
نه (9)	تعداد آفر های دریافت شده
نه (9)	تعداد آفر های باز شده
ندارد	تعداد آفر های مسترد شده
ارزیابی آفرها	
1397/12/14	تاریخ آغاز ارزیابی
1398/1/13	تاریخ ختم ارزیابی
ندارد	تعداد آفر های غیر جوابگو
شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بربالی	نام داوطلب برنده
2,046,943.00 افغانی	قیمت آفر داوطلب برنده

باداشه: از این فورم در مرحله ارزیابی استفاده میگردد.

**فورمه های معیاری ارزیابی آفر  
رایپور ارزیابی آفر و  
پیشنهاد برای عقد قرارداد**

ما هیئت ارزیابی آفر ها که به اساس حکم مورخ 1397/11/13 مقام محترم وزارت زراعت آبیاری و مالداری، جهت ارزیابی آفر های ارایه شده پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان دارای کود نمبر MAIL/PD/NCB/W/135/98، توظیف گردیدیم، گزارش ارزیابی خویش را طور ذیل ارائه میداریم:

برویت جدول ثبت توزیع شرطنامه، به تعداد (24) شرکت ساختمانی اسناد دا وطلبی را از ریاست تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری و به تعداد (82) شرکت از وب سایت تدارکات ملی اخذ و در روز آفر گشایی در محل تعین شده مندرج شرطنامه به تعداد (9) شرکت اشتراک نموده اند که قرار ذیل میباشند:

ردیف	اسم دا وطلب	نمبر جواز	قیمت خوانده شده در زمان آفرکشانی به افغانی	ملاحظات
1	شرکت ساختمانی خالد حسامی	D-54313	3,816,541.50	No
2	شرکت ساختمانی و سرکسازی عمران اکبر زاده	53107	2,225,446.50	No
3	شرکت ساختمانی سرکسازی و تهیه مواد ساختمانی مهرزاد دروازی	D-05-604	2,373,920.00	173,920.00 افغانی تخفیف
4	شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بریالی	D-26404	2,046,943.00	No
5	شرکت ساختمانی گولدن رینگ	D-25005	2,914,571.00	500,000.00 افغانی تخفیف
6	شرکت ساختمانی نافع	D-28724	2,942,204.00	No
7	شرکت ساختمانی و سرکسازی هارون مسعود	D-27786	2,398,685.50	No
8	شرکت ساختمانی نخیه گان شمال	D-05-174	2,392,939.00	No
9	شرکت سرکسازی و تولید مواد ساختمانی اخلاص کیهان	52892	2,125,153.60	No

فورم معیاری ارزیابی ابتداءی آفر ما

فورم (3-د) ایام اداره: وزارت زراعت، آبپاری و مالاند اری  
اسم پرسوه: بازارسازی سرپند و تحریک کاری کانون نمازگاه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدنهشان  
شماره داولطلبی: MAIL/PD/NCB/W/135/98

شماره	اسم داولطلب	آیا داولطلب شامل لیسته شده است؟	آیا داولطلب بجهاز فعالیت محروم شده اداره تدارکات معتبر دارد؟	آیا داولطلب بجهاز فعالیت محروم شده اداره تدارکات ملی نمیباشد؟	آیا داولطلب بجهاز فعالیت محروم شده اداره تدارکات ملی نمیباشد؟	آیا داولطلب بجهاز فعالیت محروم شده اداره تدارکات ملی نمیباشد؟	آیا داولطلب بجهاز فعالیت محروم شده اداره تدارکات ملی نمیباشد؟	آیا داولطلب بجهاز فعالیت محروم شده اداره تدارکات ملی نمیباشد؟	آیا داولطلب بجهاز فعالیت محروم شده اداره تدارکات ملی نمیباشد؟
1	شرکت ساختمانی خالد حسامی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
2	شرکت ساختمانی و سرکسازی عمران اکبرزاده	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
3	شرکت ساختمانی مهرزاد دروازی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
4	شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بولای	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
5	شرکت ساختمانی گولدن رنگ	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی
6	شرکت ساختمانی نافع	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی



نمودار نیک میاد جاز داولطلب ختم گردیده باشد و داولطلب اسناد دل بر تخت دوران تهدید جواز خوش را مرجع صادر کننده آن را نماید. جواز و تهدید شده پذاشته می شود لیکن تهدید جواز بروه به ان اعلان شده نمیتواند.

و

تمامی شرکت ها بسا تکمیل نمودن تمامی معیارات ارزیابی ابتدائی به مرحله ارزیابی مارکی و مقایسه راه پافتند. ساده شده این فقره (2) حکم جهلوچهار طرز العدل نهاده دارکات درصورتی که جو این برای سوال مربوط به يك يكابيتشون معیار مانع برآشده، دا وظیله به مرحله بعدی ارزیابی راه نمیباشد.

卷之三

1



## فورم معیاری تبادله نرخ اسعار آفر

فورم (4-د)

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم پروژه: بازسازی سرینه و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم

ولایت بدخشان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/135/98

واحد پولی مورد استفاده در ارزیابی آفر ها:

شماره	اسم داوطلب	مبالغه به هر یک از واحد های پولی ارائه شده در آفر	مبالغه به هر پولی مندرج در شرطنامه	نرخ تبادله به واحد پولی مندرج در شرطنامه	مبلغ ارائه شده به واحد پولی مندرج در شرطنامه	مجموع (ه) مبلغ به واحد پولی مندرج در شرطنامه	ملاحظات
الف	ب	ج	د	ه	و	(ج*) (د*)	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	

شهرت و امضای هیئت ارزیابی:

نام و امضای هیئت

نام و امضای هیئت

نام و امضای هیئت

یادداشت: این فورم در صورت که داوطلب قیمت آفر خویش را به واحدهای پولی متفاوت از واحد پولی مندرج شرطنامه ارائه نموده باشد قابل استفاده می باشد. نقل سند تثیت نرخ تبادله اسعار که توسط مرجع ذیصلاح صادر گردیده باشد ضمیمه گردد.


ارائه نگردیده

فورم معیاری محاسبه ترجیح داخلی

فورم (د-5)  
 اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالاداری  
 اسم پژوهه: بازسازی سربند و تحقیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان  
 شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/135/98

لست اقلام که شامل تطبیق ترجیح میگردند

قیمت آفر بعد از تطبیق ترجیح	مقدار ترجیح	فصیدی ترجیح	نام	قیمت ارزیابی شده آفر 2	اسم داوطلب	شماره
۴ = (۲ - ۰)	۰	ز	د	ج	ب	الف
--	--	--	--	--	--	1
--	--	--	--	--	--	2
--	--	--	--	--	--	3



<sup>۱</sup> این سخن در صورت استفاده میگردد که بک و پیشتر اقام آفر داوطلب مشمول تطبیق ترجیح گردد.  
<sup>۲</sup> از زبان شده آفر از فورم (د-5) نقل میگردد.

فورم معیاری ارزیابی مالی و مقایسه آفر ها

نامه (د-۶)  
اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  
پژوه: بازسازی سرپند و تحقیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدنهشان  
شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/135/98

ردیف	نامه (د-۶) اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پژوه: بازسازی سرپند و تحقیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدنهشان شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/135/98	آفر ها	درجه پیشنهادی آفر ها	مقدار ترجیح داده شده	قیمت ارزیابی شده	مبلغ مشروط غیر	مبلغ تخفیف غیر	مبلغ احتیاطی	مقدار اشتباها	مقدار اشتباها محسوبی	قیمت قرارداد	اسم داوطلب	شماره	
					آفر داده شده	آفر شده آفر	آفر آفر	آفر آفر	آفر آفر	آفر آفر	آفر آفر			
(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
اول	اول	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد
دوم	دوم	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد
سوم	سوم	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد
چهارم	چهارم	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد
پنجم	پنجم	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد
ششم	ششم	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد	ندا ارد

لار این سخون مر صورت ازمه به فرم (د-۵) بهمنظور محاسبه ترجیح داخلي اشغال میگردد.

7

ویراس

6

5

7	شرکت ساختمانی گولدن رینج	2,914,571.00	-135.00	نـد اـرد	2,914,436.00	نـد اـرد	500000.00	نـد اـرد	2,414,436.00	نـد اـرد	هـفـتـم
8	شرکت ساختمانی نـافـع	2,942,204.00	342.50	نـد اـرد	2,942,546.50	نـد اـرد	نـد اـرد	نـد اـرد	2,942,546.50	نـد اـرد	هـفـتـم
	شرکت ساختمانی خـالـد حـسـامـی	3,816,541.50	0.00	نـد اـرد	3,816,541.50	نـد اـرد	نـد اـرد	نـد اـرد	3,816,541.50	نـد اـرد	نـهـم

پیاده شد: حسب هدایت حکم چهل و ششم طیار العمل به ارکان هیئت از پسر، آفراد از ای نازلترین قیمت ارزبائی شده جو ابکو شنخیم نکردد، هیله ارزبائی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزبائی شده را مورد ارزبائی تختیگی و در درستگاه آنرا بازگردانید.

تہوڑیاں:

تضمین آفر: شرکت ساخته‌سازی و سرکسازی نوبهاری بربالی تضمین آفر (ضمانت بانکی) شماره 10010/1464/2019 27 جولای 2019 مورخ 28 فبروری 2019 را که حاوی مبلغ 45,000.00 افغانی میباشد و بتناریخ 27 جولای 2019 میعاد اعتبر آن اختتام میباشد، توسط عزیزی بانک صادر شده است، از اینه نموده اند. طبی ایمیل مؤخر 2019/03/11 از بانک منتظر خواهان معلومات گردیدیم، که در جواب بانک منتظر 2019/03/12 مورخ آفر و ایمیل خویش، از صحت بودن آن اطمینان داده است. (ایمیل ریاست تدارکات، کاپی تضمین آفر و ایمیل عزیزی بانک ضمیمه راپور هذا میباشد).

✓

وَسَمَّ

A black and white line drawing of a long, thin, slightly curved object, possibly a fish or a stylized plant, extending diagonally from the top left towards the bottom right. The object has a pointed tip at the top left and a wavy, textured end at the bottom right.

فورم معیاری ارزیابی تخفیفی

فورم (د - ۷)   
 اسم اداره : وزارت زراعت، آبپاری و مالند اری  
 اسم پژوهه : بازسازی سریند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم و لایت بدخشنان  
 شماره داولطلبی : MAIL/PD/NCB/W/135/98

معیاره انتخاب شرطنامه		شماره	
نوعیت اسناد ارائه شده در توسط داولطلب	معیار را تکمیل نموده ؟	مقدار آرائه شده در آفر	معیار داولطلب
توضیح مبنی ارزیابی عدم تکمیل (دلیل تکمیل پایا عدم تکمیل معیارات)			
شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار پروردالی			
مطابق حکم پنجم بند چهارم طرز العمل تراکات افغانستان اداره مکلف است جهت فراغم سازی اشتراک تشیبات کوچک در صورت که امور ساختمانی از لحاظ تخفیف پیچیده نبوده نرخ تخمینی آن از حد ده میلیون افغانی تجاوز ننماید در شرطنامه های معیار تجربه کاری مشابه و حجم معاملات سازه را برای داولطلبان مدد نظر نگیرند.	قابل تطبیق نمی باشد	قابل تطبیق نمی باشد	
مطابق حکم پنجم بند چهارم طرز العمل تراکات افغانستان اداره مکلف است جهت فراغم سازی اشتراک تشیبات کوچک در صورت که امور ساختمانی از لحاظ تخفیف پیچیده نبوده نرخ تخمینی آن از حد ده میلیون افغانی تجاوز ننماید در شرطنامه های معیار تجربه کاری مشابه و حجم معاملات	قابل تطبیق نمی باشد	قابل تطبیق نمی باشد	قابل تطبیق نمی باشد
			حجم معاملات سازه ۵.۵ جزء
			۱ دستور العمل پرای داولطلبان
			۲ دستور العمل پرای داولطلبان

نگیرند. سازنده را برای دو اطلبان مد نظر				
ذريعه استعلام شماره 2565 مورخ 1397-12-19 شمرکت سپاه ختمانی و سرکسازی نوبهار خواهان معلومات گردیدم که بازگشته نامه شماره 74335 بودن آن اطلاعات داده اند. بازگشته اسناد میوند بازگشته از زیارت ارزیابی، جواب شرکت سپاه ختمانی و سرکسازی نوبهار بریالی فم گزارش هذا می باشد.	بانک استیضاند میوند بازگشته	بلی	شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بریالی مبلغ 400,000.00 بیول نقده جهت پیشبرد پروژه در صورت حساب شرکت داشته باشد	تو اسنادنی مالی 5.5 جزء 5 ماده 5.5 دستور العمل براي داطلبان 4
اسناد خرید اری و قرارداد خطرها تجهیزات و ملکیت شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بریالی و فولاد آن با سایر شرکت ها در زمانیه تهیه مالکیتی می باشد از این گردیده است.	اسناد خرید اری و قرارداد خطرها	بلی	به تعداد ده قلم مالکیت شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بریالی و فولاد آن با سایر شرکت ها در زمانیه تهیه مالکیتی می باشد از این گردیده است.	تجهیزات 3 ماده 5.5 جزء 3 دستور العمل براي داطلبان 5
اسناد تجهیزات و مالکیت شرکت ساختمانی داد آن با سایر شرکت ها می باشد.	اسناد تجهیزات و مالکیت شرکت ساختمانی داد آن با سایر شرکت ها می باشد.	بلی	تحویله کاری (سال) 21 5 3 3 مدیر پروژه (مدد اکبر) 5 1 1 1 انحصار ساخته (نور الله) 7 1 1 1 انجینر سروی (عبدالاوسیع)	کارمندان 4 ماده 5.5 جزء 4 دستور العمل براي داطلبان 6
ذريعه استعلام شماره 2604 مورخ 1397-12-22 مالکیتی و گزارش ربیعه اول 1397 از اداره مستوفیت و لایت بدشان معلومات گردیدم که خواهان معتبرم در جواب استعلام چنین نگاشته اند (قابل توجه ریاست محترم تهیه و تدارکات !	گزارش تصویبی مالکیتی چهار سال	بلی	آفرگشانی ( اظهار نامه ویسا گزارش ربیعه اول مكتوب تصویب مالکیتی آخرين دوره قبل از طبق شرطنامه سایر موادر 7	

1397  
شرکت مهندکره مالیات سال بندام خویش را از اینه نموده است کدام در مربوطات اینه اداره کدام بساقی دارد ( ) استعلام ریساست تهییه و تقدیر کات و جواب اد اره مستوفیت ولایت بندخان فرم گزارش هدا می باشد.


بیانش هدیت ارزیابی بعد از ارزیابی تحقیق طبق حکم چهل و ششم طرز العمل تدارکات باید تشخیص دهد که ضرورت به ارزیابی محصل طبق حکم چهل و هفتم طرز العمل میباشد یا خیر.

و ط رس

۱۷/۱۱

فورم معیاری پیشنهاد اعطای قرارداد

فورم (هـ - ۱)

معلومات عمومی پروژه				
پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان MAIL/PD/NCB/W/135/98	اسم پروژه و شماره داوطلبی آن			
1,737,031.00	قیمت تخمینی پروژه			
ندارد	قیمت سایر آفرها ( درصورتیکه آفر برند از نظر قیمت در رتبه اول نشاشد )			
ندارد	تعداد آفرهای غیر جوابگو			
آفر دارای نازلترين قيمت ارزياي شده و جوابگوي کلي برای اعطای قرارداد				
شرکت ساختمني و سركسازي نوبهار بريالي	اسم داوطلب / شركت:			
ناحية سوم شهر فيض آباد، مرکز ولایت بدخشنان، فيض آباد	آدرس داوطلب / شركت			
17.84 % فيصد بلند تر از نرخ تخمیني	فيصدى تفاوت ميان قيمت تخمیني و قيمت پیشنهادی شده برای اعطا قرارداد			
2,046,943.00 افغانی ( در جواب استعلام 2566 مورخ 19 حوت 1397 هیات ارزیابی، ریاست مالی و حسابی مبلغ 309,911 افغانی تعهد مجدد مالی نموده است )	قيمت آفر پیشنهاد شده برای اعطاقرارداد			
<b>خلاصه بورسی هیئت ارزیابی:</b> به اساس بورسی و ارزیابی آفرهای ارائه شده برای پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان ، دارای کود نمبر MAIL/PD/NCB/W/135/98 بتأريخ 1397/11/21 به داوطلبی سپرده شده به تعداد (24) شرکت ساختمني اسناد داوطلبی را از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاري و مالداري و به تعداد (82) شرکت از وب سایت تدارکات ملی اخذ و بتاریخ 14/12/1397 مجلس آفرگشایی دایر گردیده که به تعداد نه (9) شرکت اشتراک نموده و آفر خویش را ارزیابی نموده است، که در نتیجه ارزیابی ابتدائی (9) شرکت توانستند تا با تکمیل نمودن معیارات ارزیابی ابتدائی به ارزیابی مالی و مقایسه راه یابند. شرکت ساختمني و سركسازي نوبهار بريالي دارنده جواز نمبر D-26404 وزارت تجارت و صنایع، با ارایه قيمت 2,046,942.90 افغانی (دو ميليون و چهل و شش هزار و نو صد چهل و دو اعشاريه نود افغاني) که نظر به قيمت تخمیني انجنبيري 17.84 % بلند تر است، از لحاظ قيمت در ردیف اول قرار دارد که بعد از ارزیابی آفر، آفر داوطلب جوابگو و اجد شرایط شناخته شد. اينکه این شرکت ارزیابی به مقام محترم وزارت تقدیم است، در زمینه هر آنطوریکه لازم دانند هدایت خواهند فرمود. <b>شهرت و امضای هیئت ارزیابی:</b> 				
<b>شهرت آمر اعطا مربوط</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">داوطلبی مجدد</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">فسخ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">منظور</td> </tr> </table>		داوطلبی مجدد	فسخ	منظور
داوطلبی مجدد	فسخ	منظور		
<b>وظیله: سرپرست معینت مالی و اداری</b>				
<b>اسم: انجینیر محمد ظاهر ایوب</b>				
<b>امضاء:</b>				

اسناد ضمایم ارزیابی

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  
 اسم پروژه: بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی  
 اشکاشم ولایت بدخشنان  
 شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/135/98

شماره	تفصیلات	تعداد ورق	ملاحظات
1	تعهد نامه سه عضو هیئت ارزیابی	یک ورق	
2	سه ورق اظهارنامه تضاد منافع هیئت ارزیابی	سه ورق	

## اظهارنامه تضاد منافع

این اظهار نامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف است، در مواردی که تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره (۱) (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضاد منافع طور مستقیم یا غیر مستقیم»: «ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره آن چنین حکم میکند تضاد منافع: حالتی است که موظفين تدارکات به شمول امر اعطاء به: «که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین تعريف شده است.

نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذی نفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد. اقارب به این مقصد عبارت از اولاد، پدر، پدر کلان، مادر، مادر کلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولاد های ایشان تا درجه دوم، والدین همسرو خواهر و برادر آن، همسر پسریا شوهر دختر، میباشد بنابراین، تصدیق میدارم؛ این جانب در پروسه تدارکاتی تهیه و تدارک پروره بازسازی سربرند و تحکیم کاری کمال نمازگه واقع و لسوالی اشکاشم ولايت بدخشان، دارای کود نمبر MAIL/PD/NCB/W/135/98 به صفت هئیت ارزیابی تعیین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آتی را ندارم:

موارد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام و تخلص: محمد حسن کلی ولد: حسن الکاظمی شماره تماس: ۰۷۸۹۰۲۴۴۴۴ وظیفه: اخصای اسلامی اداره: کارخانه اسناد امضاء و تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

## اظهارنامه تضاد منافع

این اظهار نامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف اند، در مواردی که تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره (۱) (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضاد منافع طور مستقیم یا غیرمستقیم : «ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره آن چنین حکم میکند تضاد منافع : حالتی است که موظفین تدارکات به شمول آمر اعطاء به : «که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین تعريف شده است.

نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذی نفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد. اقارب به این مقصد عبارت از اولاد، پدر، پدرکلان، مادر، مادرکلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولاد های ایشان تا درجه دوم، والدین همسرو خواهر و برادر آن، همسر پسریا شوهر دختر، میباشد بنابراین، تصدیق میدارم؛ این جانب در پروسه تدارکاتی تهیه و تدارک پروژه بازسازی سربنده و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشان، دارای کود نمبر MAIL/PD/NCB/W/135/98 به صفت هئیت ارزیابی تعین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آتی را ندارم:

موارد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام و تخلص: احمد عبدالکریم ضحی ولد: سلمان الحوز

شماره تماس: 0298849024 وظیفه: آمر ارضیه ختن

اداره: رئاسة سرگی همازگانی امضاء و تاریخ

13/1/1398

## اظهارنامه تضاد منافع

این اظهار نامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف اند، در مواردی که تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره (۱) (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضاد منافع طور مستقیم یا غیر مستقیم» : «ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصت جزء ۴ فقره ۱ آن چنین حکم میکند تضاد منافع: حالتی است که موظفین تدارکات به شمول آمر اعطاء به: «که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین تعریف شده است.

نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذی نفع بوده و با اقارب یکی از داوطلبان باشد. اقارب به این مقصد عبارت از اولاد، پدر، پدر کلان، مادر، مادر کلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولاد های ایشان تا درجه دوم، والدین همسرو خواهر و برادر آن، همسر پسریا شوهر دختر، میباشد بنابراین، تصدیق میدارم؛ این جانب در پروسه تدارکاتی تهیه و تدارک پروره بازسازی سریند و تحکیم کاری کمال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان، دارای کود نمبر MAIL/PD/NCB/W/135/98 به صفت هئیت ارزیابی تعیین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آتی را ندارم:

موارد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام و تخلص: وحید اللہ ھاسٹل (ولد: محمد ھاسٹل)

شماره تماس: 0578647166 وظیفه: دینیان اجیر

اداره: دیست آبیاری امضاء و تاریخ 13/1/1398

## **Qurban Sarvari**

**From:** [Qurban Sarvari]qurban.sarvari@mail.gov.af  
**Sent:** Thursday, April 11, 2019 10:38 AM  
**To:** info.ekcc1@gmail.com'; 'khalid\_ha2012@yahoo.com'; 'emranakbarzada.cc2018'@gmail.com'; 'goldenringcc@gmail.com'; 'north.elites@gmail.com'; "makbar\_safari@yahoo.com"; 'hmcc.fzd@gmail.com'; 'hafi.nfcc@gmail.com'  
**Cc:** 'Mir Mohammad Mones'; 'mukhtar.omaryar@gmail.gov.af'  
**Subject:** اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه کانال نمازگه بدخشنان

به شرکت های محترم اشتراک کننده!

بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان را به شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بربالی دارنده جواز نمبر (D-26404) به قیمت مجموعی 2,046,842.90 افغانی (دو میلیون و چهل و شش هزار و هشت صد و چهل و دو اعشاریه نه افغانی) اعطاء نماید.  
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجم این قانون تدارکات ارائه نمایند.  
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

فریانعلی سروری

امیریت تدارکات امور ساختمانی وزارت زراعت



منسوبه مخصوصه به همایش

صفحه اصلی پروپریتی



## داوطلبی

برپاره و رئیس لر اعانت

اسناد اقتصادی و اداری وزارت

مقام وزارت

محیطی ها و پیامدها

پلان های کشاورزی

خبرها

دانسته هایی در مذکوب

دقیقه نامه راهنمای

کاریابی

داوطلبی

ریغزرن افغانستان

لماشیگانه از اعانت

مراحل کاربر

برآمدگاهها و بروزدها

بانک اطلاعات

خواهان علمون از اعانت

مرجع اطلاعات اقتصادی از اعانت

فهرم داده های علمه خدمات

گزارش ها

تعاس ب ما

سایت اینترنتی

دست اول این سال وزارت

کارخانه بیمه و از اعانت  
DNCB ON STATION

بانک ملی افغانستان مخصوصات زر عصی

قوافلین، مددگار، مسنانه ها، و طرز احتفل های

زراعت

پیشتر

## Filter by Category

تاریخ	تاریخ	عنوان	مختصر
May 07, 2019	Apr 10, 2019	دعوت به داوطلبی، پرسه داوطلبی تکارک سه قلم مواد کیمیایی و پکجیوه ملکین سرسته کن	دعوت به داوطلبی روش باز ملی مسازه دعوت به داوطلبی دعوت به داوطلبی روش باز ملی مسازه دعوت به داوطلبی برایست تهیه و تکارکات وزارت زر اعانت، ابیاری و مکاری از شام داوطلبی واحد شرایط دعوت می شود، تا شر پرسه داوطلبی تکارک سه قلم مواد کیمیایی و پکجیوه ملکین...
May 08, 2019	Apr 10, 2019	دعاوه به داوطلبی، پرسه داوطلبی پرسه دعوه تکارک آنوار تشخیص ارض افتاده نیاشی	دعوت به داوطلبی روش باز ملی مسازه دعوت به داوطلبی دعوت به داوطلبی روش باز ملی مسازه دعوت به داوطلبی برایست تهیه و تکارکات وزارت زر اعانت، ابیاری و مکاری از شام داوطلبی واحد شرایط دعوت می شود، تا در پرسه داوطلبی پرسه تکارک رسیده و تجهیزات لایرانی از شخص امر ارض...
Apr 17, 2019	Apr 10, 2019	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پروژه اعمام حوض فیض ابد و نلات (۱) تهدیه جیوانی غیر ملکی	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران پرسه دعوه تکارک ده قلم مواد خوارانی جیوانی حیث تهدیه جیوانی غیر ملکی
Apr 16, 2019	Apr 09, 2019	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران بینین و سلنه به ذمی از فقره دوم ماده چهل و سوم فکری کارکاران به طلاع عموم رسانیده می شود، که برایست تهیه و تکارکات وزارت زر اعانت، ابیاری و مکاری از نظر دارد فرادران، پروژه اعمام حوض فیض ابد و نلات (۱) پروژه اعمام حوض فیض ابد و نلات...	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام حوض فیض ابد و نلات (۱) پروژه ابد و نلات (۱) اعمام حوض که روز و لایته جیوانی
Apr 16, 2019	Apr 09, 2019	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران بینین و سلنه به ذمی از فقره دوم ماده چهل و سوم فکری کارکاران به طلاع عموم رسانیده می شود، که برایست تهیه و تکارکات وزارت زر اعانت، ابیاری و مکاری از نظر دارد فرادران، پروژه اعمام حوض فیض ابد و نلات (۱) پروژه اعمام حوض فیض ابد و نلات...	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام حوض فیض ابد و نلات (۱)
Apr 16, 2019	Apr 09, 2019	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری حوض اینکه و نیوار بسیاری از جویی شهادت انسانی و ایع و سوسانی پیشون گوت و لایته فاریاب اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران بینین و سلنه به ذمی از فقره دوم ماده چهل و سوم فکری کارکاران به طلاع عموم رسانیده می شود، که برایست تهیه و تکارکات وزارت زر اعانت، ابیاری و مکاری از نظر دارد فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری حوض	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری حوض اینکه و نیوار
Apr 16, 2019	Apr 09, 2019	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری حوض اینکه و نیوار که و نسی ای اکائند و لایته پیشنهاد اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران بینین و سلنه به ذمی از فقره دوم ماده چهل و سوم فکری کارکاران به طلاع عموم رسانیده می شود، که برایست تهیه و تکارکات وزارت زر اعانت، ابیاری و مکاری از نظر دارد فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری حوض	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری حوض اینکه و نیوار
Apr 16, 2019	Apr 09, 2019	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری کاش و ترکاب شرکاگ ملکه، افع در مکانه ای از اینکه اینکه	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری کاش و ترکاب شرکاگ ملکه، افع
Apr 16, 2019	Apr 09, 2019	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران بینین و سلنه به ذمی از فقره دوم ماده چهل و سوم فکری کارکاران به طلاع عموم رسانیده می شود، که برایست تهیه و تکارکات وزارت زر اعانت، ابیاری و مکاری از نظر دارد فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری حوض	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری کاش و ترکاب شرکاگ ملکه، افع
Apr 16, 2019	Apr 09, 2019	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری کاش و ترکاب شرکاگ ملکه، افع در مکانه ای از اینکه اینکه	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری کاش و ترکاب شرکاگ ملکه، افع
Apr 16, 2019	Apr 09, 2019	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری کاش و ترکاب شرکاگ ملکه، افع در مکانه ای از اینکه اینکه	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری کاش و ترکاب شرکاگ ملکه، افع
Apr 16, 2019	Apr 09, 2019	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری کاش و ترکاب شرکاگ ملکه، افع در مکانه ای از اینکه اینکه	اطلاعیه تصدیق انتخابی فرادران، پرسه دعوه اعمام بیزاساری کاش و ترکاب شرکاگ ملکه، افع



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱/۹

شماره: (۵۲۶)

**اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد**

به روز نامه محترم هشت صباح!

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشعه آنرا از دارائی وزارت محاسبه نمائید.

بدینوسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کanal نمازگه و لسوالی اشکاشم ولایت بدخسان را به شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بریالی دارنده جواز نمبر (D-26404) به قیمت مجموعی ۲,۰۴۶,۸۴۲.۹۰- افغانی (دو میلیون و چهل و شش هزار و هشت صد و چهل دو اعشاریه نه افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجماه قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام  
محمد الله فیصل  
رئیس تهیه و تدارکات

کاپی به:  
مدیریت پل رجهت نش در وب سایت وزارت  
دوستی مریوطه



داغفانستان اسلامی جمهوریت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وزارت  
جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

آمربت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۹

شماره: (۵۲۶)

**اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد**

به روز نامه محترم هشت صبح!

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشعه آنرا از دارائی وزارت محاسبه نمائید.

بدینوسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه و لسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان را به شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بربالی دارنده جواز نمبر (D-26404) به قیمت مجموعی ۲,۰۴۶,۸۴۲.۹۰- افغانی (دو میلیون و چهل و شش هزار و هشت صد و چهل دو اعشاریه نه افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام  
محمد الله "جاہل"  
رئیس تهیه و تدارکات

کابینه:  
مدیریت پلان جهت نشر در وبس سایت وزارت  
دروسیه مریوطه



دکرهنی، اوپولگولو او مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

د افغانستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan**  
**Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**  
**معینیت مالی و اداری**  
**ریاست تهیه و تدارکات**  
**آمریت تدارکات ساختمانی**  
**مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی**

تاریخ ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۸

شماره (۵۲۹)

**نامه عدم قبولی آفر**

از: ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

آدرس: جمال مینه ناحیه سوم کابل - افغانستان

( ) به: شرکت ساختمانی ( )

آدرس:

این نامه عدم قبولی آفر به تأسی از ماده چهل و چهارم قانون تدارکات و حکم هشتاد و هفتم طرز العمل  
تدارکات صادر و به موجب آن به شما اطلاع داده میشود که آفر ارائه شده مورخ (14/12/1397) شما  
برای تدارک قرارداد اعمار پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کanal نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت  
بدخشنان را با کود نمر ۹۸ / NCB/W-135 / PD / MAIL از جانب این اداره برای اعطای قبول نشده  
است. این قرارداد به شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بربالی دارنده جواز نمر (D-26404) واقع  
ناحیه سوم شهر فیض آباد مرکز ولايت بدخشنان به قيمت مجموعی ۲,۰۴۶,۸۴۲.۹۰- افغاني (دو ميليون و  
چهل و شش هزار و هشت صد و چهل دو اعشار يه نه افغاني) اعطاء نماید.

در صورتیکه که شما تقاضای ارائه توضیحات مبنی بر عدم قبولی آفر تان را مطابق ماده چهل و چهارم قانون  
تدارکات داشته باشید، خواهشمندیم درخواست خویش را به این اداره ارسال نمایید. همچنین شما میتوانید  
در مطابقت به فقره (۱) حکم هشتاد و هفتم طرز العمل، تضمین آفر خویش را از این اداره واپس اخذ  
نمایید.

در اخير از اشتراك و سهم گيري شما در اين پروسه تدارکاتي تشکر و قدردانی مينمایيم. اميداريم در  
پروسه هاي تدارکاتي آينده نيز اشتراك و سهم فعال داشته باشيد.

با احترام

نام و تخلص: "محمد الله" ساحل

وظيفه: رئيس اداره اکات

امضاء و تاریخ:



دکر هنی، او بولگو لو او مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

د افغانستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan**  
**Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**  
 معینیت مالی و اداری  
 ریاست تهیه و تدارکات  
 آمرویت تدارکات ساختمانی  
 مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ ۱۳۹۷/۱/۹

شماره (۵۲۹)

**نامه عدم قبولی آفر**

از: ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

آدرس: جمال مینه ناحیه سوم کابل - افغانستان

( ) به: شرکت ساختمانی ( )

آدرس:

این نامه عدم قبولی آفر به تأسی از ماده چهل و چهارم قانون تدارکات و حکم هشتاد و هفتم طرز العمل تدارکات صادر و به موجب آن به شما اطلاع داده می شود که آفر ارائه شده مورخ (1397/12/14) شما برای تدارک قرارداد اعمار پروره بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان را با کود نمبر 89/NCB/W-135/PD/MAIL از جانب این اداره برای اعطای قبول نشده است. این قرارداد به شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بربالی دارنده جواز نمبر (D-26404) واقع ناحیه سوم شهر فیض آباد مرکز ولايت بدخشنان به قيمت مجموعی 2,046,842.90- افغاني (دو ميليون و چهل و شش هزار و هشت صد و چهل دو اعشار يه نه افغاني) اعطاء نماید.

در صورتیکه که شما تقاضای ارائه توضیحات مبنی بر عدم قبولی آفر تان را مطابق ماده چهل و چهارم قانون تدارکات داشته باشید، خواهشمندیم درخواست خویش را به این اداره ارسال نمایید. همچنین شما میتوانید در مطابقت به فقره (۱) حکم هشتاد و هفتم طرز العمل، تضمین آفر خویش را از این اداره واپس اخذ نمایید.

در اخیر از اشتراک و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی مینماییم. امیداریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

با احترام

نام و تخلص: محمد الله "ساحل"

وظیفه: رئیس تدارکات

امضاء و تاریخ:

**INVOICING PARTY**

Hasht-e-Sobh Daily newspaper  
H # 1, Street 5, Sherpure  
Kabul Afghanistan

ص

### Invoice recipient

Ministry of Agriculture  
Kabul Afghanistan

Invoice Number : INV-19-116

DATE : \_\_\_\_\_

9-Apr-19

Currency :AFN

---

**BANK DETAIL**

Account Name: 8 Sobh Dail

Account Number/IBAN: ((0510101002047117))

Account Type:(AFN OR USD) AFN

Bank Name: Afghanistan International Bank (AIB)

**Bank Address:** Mirwais Maidan Branch, Kota e Sangi, Kabul

Bank Swift Code: AFIBAFKA

Intermediary Bank Standard Chartered Bank New York - NY US

Account Number: ((3582026146001))

Best Regards



Islamic Republic of Afghanistan  
Administrative Office of the President  
National Procurement Authority

| جستجو | سوالات و جوابهای تدارکات | کمک و رهنمایی | پیوندها | ارتباط با ما | دخال شدن به سیستم برای اعضاء

English

وضعیت کاربری  
Welcome, MNA

### قراردادهای اعطای شده

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد قراردادهای اعطای شده را وارد نمایید.

Reload	Filter	لطفاً انتخاب کنید...
		دري
		نمبر تشخصيه 6600
		عنوان پروژه در بودجه منظور پروژه آبیاری و ذخایر آب شده
		شماره قرارداد MAIL/PD/NCB/W/135/98
		نوعیت تدارکات تدارکات امور ساختمانی
		شرح قرارداد پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم و لایت بدخسان
		تاریخ امضای قرارداد 15/02/1398
		قیمت قرارداد به 0 دالر
		قیمت قرارداد به 2046843 افغانی
		اعطا شده به شرکت ساختمانی و سرکسنز نوبهار بریالی
		تاریخ تکمیل قرارداد 15/08/1398
		ارشیو English
		Budget Reference Title
		Irrigation and water reservoir project Description
		اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه ولسوالی اشکاشم و لایت بدخسان را به شرکت ساختمانی و سرکسنز نوبهار بریالی دارند

- سیریابی در وبسایت**
- صفحه اصلی ایزارهای نهادهای تدارکاتی**
- معلومات مدیریتی تدارکات**
  - پلان تدارکاتی
  - ناظرت تدارکات
- معلومات روزمره تدارکات**
  - دارطلبی ها
  - ثبت شرکت های قراردادی
  - قراردادهای اعطای شده
  - ارشیو معلومات
  - چت همای کارشناسی
- گزارشات**
  - گزارشات پلان تدارکاتی
  - گزارشات ناظرت تدارکاتی
  - گزارش قراردادهای اعطای شده
  - گزارش مقایسهی تدارکات
  - تغیر کلمه عنوانی

Online Users

جوائز نمبر (D-26404) به قیمت مجموعی 2.046,842.90- افغانی (دو میلیون و چهل و شش هزار و هشت صد و چهل دو اعشاریه نه افغانی) اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان تا 7 روز تقویمی طور کنی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و سالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نموده و الى تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Contract Award Date	AM 12:00:00 5/5/2019
Awarded To	شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بریالی
Contract Complete Date	AM 12:00:00 11/6/2019
Delete	New
Edit	


128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 ...

۱۱۶



دکرهنی، اوپولگولو اومالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

دافتارستان اسلامی جمهوری دولت  
دولت جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ ۱۳۹۷ / ۸ / ۷

شماره: (۵۶۴)

**نامه قبولی آفر**

از ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

آدرس: جمال مینه ناحیه سوم کابل افغانستان

به: شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بریالی دارنده جواز نمبر (D-26404)

آدرس: ناحیه سوم شهر فیض آباد، مرکز بدخشان، فیض آباد

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنج طرز العمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارایه شده شما مؤخر ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ برای قرارداد پروژه بازسازی سریند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشان به قيمت مجموعی ۲,۰۴۶,۹۴۲.۹۰ - افغاني (دو ميليون و چهل و شش هزار و نه صد و چهل و دو عشراريه نه افغاني) اعطانايم. طوريكه در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرطname مربوطه تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است. لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ۵ (۱۰) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشت طرز العمل، تضمین اجرای قرارداد را طوريكه در شرطname مربوطه درج گردیده، به اداره تسلیم نمایید. در غير آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود.

مشخصات تدارکات / قرارداد: پروژه بازسازی سریند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشان

شماره تشخیصیه تدارکات: MAIL/PD/NCB/W/135/98

قيمت مجموعی: ۲,۰۴۶,۹۴۲.۹۰ - افغاني (دو ميليون و چهل و شش هزار و نه صد و چهل و دو عشراريه نه افغاني)

نوعیت تضمین اجرای قرارداد: تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی و غیر مشروط باشد

مقکار تضمین اجرای قرارداد: پنج فیصد (5%) افغاني - به مدت ۷.۵ ماه تضمین اجرا ادائه گردد.

زمان عقد قرارداد: بعد از ادائه تضمین حسن اجرا قرارداد عقد می گردد.

مکان عقد قرارداد: ریاست تهیه و تدارکات

همچنین عرض مطالعه و مزید معلومات شما موافقتname قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص: محمد الله "ساحل"


وظیفه: رئیس تهیه و تدارکات

امضاء و تاریخ

کابی

به دوسته

۹۶  
۰۲  
۰۳  
۰۲  
۰۳



دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  
ریاست تهییه و تدارکات

قرارداد

پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشان  
ميان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

و

شرکت ساختمانی نو بهار بریالی

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/135/98

بودجه: کود انکشافی AFG-390676

تاریخ: ۱۳۹۸ / /

## فورم موافقتنامه قرارداد

این موافقتنامه در ماه حمل سال 1398 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت ساختمانی نوبهار بریالی دارنده جواز نمبر (D-26404)، نمبر تشخصیه (1043478013) ایمیل آدرس [makbar\\_satari@yahoo.com](mailto:makbar_satari@yahoo.com) ، شماره تماس 0797777707-0744153898 واقع ناحیه 3، شهر فیض آباد، مرکز بدخشن، فیض آباد، بدخشن عقد گردیده است.

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجرآت در قراردادپژوه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشن که در پژوهه انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارای کود نمبر AFG-390676 به قیمت مجموع 2,046,942.90 افغانی (دو میلیون و چهل و شش هزار و نه صد و چهل و دو اعشاریه نه افغانی) پذیرفته و قراردادی قرارداد شده که را در <sup>۱</sup> میلیون و ۶۰ هزار و ۹۴۲ روپیه و ۹۰ سنت

این موافقتنامه موارد ذیل پذیرفته و قراردادی قرارداد شده که را در <sup>۱</sup> میلیون و ۶۰ هزار و ۹۴۲ روپیه و ۹۰ سنت

۱. کلمات و اصطلاحات شاهد این موافقتنامه عین معنی را اینجا ننمایند که بتوییب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و تجویی از این موافقتنامه اعترافی نمایند و میرجیده

۲. قراردادی در مقابل پرداخته اکلاه تعهد می کنند که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نمایند

۳. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد را در مقابل اجرآت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده تحویل این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع

۴. طرف های شاهد که سبب تعلیل این موافقتنامه گردیده اند


فرمایش دهنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری) شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بریالی

انجینیر محمد ظاهر "ایوب"

سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

( محل امضاء و مهر)

اسم: احمد سعید  
موقت: نایابه نهاده  
( محل امضاء و مهر)



شرایط خاص قرارداد	
تعدادات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد	مواد شرایط عمومی قرارداد
<b>الف: مسایل عمومی</b>	
میعاد رفع نوافص بعد از تاریخ تکمیل مدت یکسال میباشد.	جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
اداره وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.	جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی 6 ماه تقویمی می باشد.	جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه: یکتن از انجمن ایران وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.	جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
ساحه کار امور ساختمانی واقع و لسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان میباشد.	جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ آغاز کار امور ساختمانی: بعد از تاریخ صدور مكتوب آغاز کار می باشد.	جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
امور ساختمانی شامل بازسازی سریند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع و لسوالی اشکاشم ولايت بدخشنان می باشد.	جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تکمیل قسمت وارتفاصل تطبیق نیست.	بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد

<p>اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد و شامل قرارداد می باشند.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- موافقتنامه;</li> <li>2- نامه قبولی آفر؛</li> <li>3- آفر قراردادی؛</li> <li>4- شرایط خاص قرارداد؛</li> <li>5- شرایط عمومی قرارداد؛</li> <li>6- مشخصات تخفیکی؛</li> <li>7- نقشه ها؛</li> <li>8- بل احجام کاری؛</li> </ul>	<p>جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>زبان قرارداد یکی از زبان های رسمی کشور میباشد. زبان قرارداد همان زبان آفر میباشد.</p> <p>قانون نافذ بر این قرارداد قوانین جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>جدول فعالیت های قراردادی دیگر قابل تطبیق نمیباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>کارمندان کلیدی یک مدیر قرارداد یعنی انجینر با 5 سال تجربه در اجرای قراردادهای امور ساختمانی که دارای ماهیت و حجم معادل و مشابه، به شمول اینکه به حیث مدیر پروژه برای مدت حد اقل سه سال تجربه داشته باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>مبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: (تبیه بیمه از وجایب ومکلفیت داوطلبان میباشد و شامل موارد ذیل می باشد).</p> <p>برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد ( ) (افغانی</p> <p>برای زبان یا خساره به تجهیرات قیمت تعویضی آن (تجهیزات مربوطه) پرداخته میشود.</p> <p>برای زبان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات ( ) (افغانی</p> <p>مرگ یا خساره به کارمندان:</p> <p>کارمندان قراردادی ( ) (افغانی در هر رویداد</p> <p>(0) افراد دیگر ( ) (افغانی</p> <p>بیمه مطابق ماده 13 شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق است</p>	<p>بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد</p>

(۱) گزارشات بررسی ساحه نظر بر تقاضا داوطلبان ارایه خواهد گردید.	بند ۱ ماده 14 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات ارائه می نماید	بند ۱ ماده 15 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست اداری می باشد.	بند ۱ بند 21 شرایط عمومی قرارداد
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد /مرکز حل و فصل منازعات تجارتی افغانستان / میباشد. محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد. حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.	ماده 62 شرایط عمومی قرارداد
<b>ب. کنترول زمان</b>	
قراردادی پلان کاری امور ساختمانی را در جریان 10 روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تائید، ارائه مینماید.	بند ۱ ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30. سی روز میباشد.	بند ۳ ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، پرداخت 20.000 الی ارائه پلان کاری تجدید شده معطل قرار می گیرد.	
<b>ج. کنترول کیفیت</b>	

بند ۱ ماده ۳۳  
شرایط عمومی  
قرارداد

میعاد رفع نواقص (یک سال) میباشد.

بند ۱ ماده ۴۱  
شرایط عمومی  
قرارداد

۱. پرداخت بعد از تکمیل کار نظر به فیصدی بعد از ارائه گزارش از جانب فرمایش گیرنده و تصدیق نماینده وزارت زراعت، آباداری و مالداری پرداخته میشود.

۲. پول فرمایش گیرنده در هجاء قسط پرداخته میشود که در قسط اول ۲۵ فیصد بعد از ۲۵ فیصد تکمیل کار، در قسط دوم ۲۵ فیصد بعد از ۵۰ فیصد تکمیل کار، در قسط سوم ۲۵ فیصد بعد از ۷۵ فیصد تکمیل کار، و در قسط چهارم ۲۵ فیصد بعد از ۱۰۰ فیصد تکمیل کار پرداخته میشود.  
پرداخت های بعدی در جریان کار ترا فرق در مقابل گزارشات بیسروفت کار انجام شده بعد از تصدیق مراقبت کننده از جانب فرمایش دهنده صورت میگیرد.

#### د. کنترول مصرف

بند 1 ماده 45  
شرایط عمومی  
قرارداد

قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعديل نیست" و معلومات ذیل در مورد ضرایب "قابل تطبیق نیست"

ضرایب تعديل قیم قرارذیل میباشد:

برای واحد پول افغانی:

ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل /رقم به ارقام و حروف درج گردد/ میباشد.

ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل /رقم به ارقام و حروف درج گردد/ میباشد.

به واحد پول { واحد پولی درج گردد}:

ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل /رقم به ارقام و حروف درج گردد/ میباشد.

ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل /رقم به ارقام و حروف درج گردد/ میباشد.

شاخص 1 به واحد پول افغانی {شاخص درج گردد} می باشد.

شاخص 1 به واحد پولی بین المللی مشخص شده {شاخص درج گردد} می باشد.

{اين شاخص ها توسط قراردادي پيشنهاد و از جانب اداره تائيد ميگردد}

شاخص 1 اسعار به استثنای واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی {شاخص درج گردد} میباشد.

{اين شاخص ها توسط قراردادي پيشنهاد و از جانب اداره تائيد ميگردد}

بند 2 ماده 46  
شرایط عمومی  
قرارداد

فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 10٪ ده فیصد میباشد.

تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورانی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد

بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد	اندازه جریمه تاخیر (0.05) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد. قرارداد مطابق ماده 57 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.
بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد	انعام برای انجام تمام امور ساختمان: نظر به لزوم دید فرمایش دهنده.
بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد	پیش پرداخت صفر فیصد و پیش از صفر پرداخت میگردد. لازم نیست
بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد	مبلغ تضمین اجرا (پنج(5) فیصد مجموع قرارداد میباشد. تضمين اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط.
<b>هـ ختم قرارداد</b>	
بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.
بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ 20000 از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید.
جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد	حداکثر تأخیر 100 روز میباشد. تعداد روز ها باید در مطابقت به بند 1 ماده 49 جریمه تاخیر شرایط خاص قرارداد می باشد.
بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد	فیصی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی
مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کارباقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در میعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.	

#### قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

ا<sup>ن</sup> شرایط عمومی قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد.

این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تعییرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با بالمقطع نیز استفاده میگردد.

الف: عمومیات	
ماده ۱- تعاریفات	۱- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:
	۱- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند.
	۲- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده ۴۴ شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.
	۳- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند ۱ ماده ۵۵ شرایط عمومی قرارداد.
	۴- قرارداد: موافقنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند ۲ ماده ۳ شرایط عمومی قرارداد می باشد.
	۵- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.
	۶- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.
	۷- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعديلات بعدی وارد مطابق قرارداد می باشد.
	۸- روز: روز تقویمی می باشد.
	۹- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیضی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد.
	۱۰- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.
	۱۱- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد.
	۱۲- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند ۱ ماده ۳۵ شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.
	۱۳- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه

بمنظور اجرای قرارداد می باشد.

14-اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.

15-تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت مؤقت در ساحه کار فراهم میگرددند.

16-قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.

17-تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.

18-مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.

19-تاسیسات: منصمات امور ساختمانی که دارایی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد.

20-مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسؤولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.

SCC-21: به معنی شرایط خاص قرارداد است.

22-ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.

23-گزارش بررسی ساحه: شامل شرط‌نامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

24-مشخصات: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات واردہ یا تائید شده توسط مدیر پروژه می باشد.

25-تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسليمی ساحه نمی باشد.

26-قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.

27-ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.

28-تعديل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.

29-امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نوسازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن

(برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.

#### ماده 2- تفسیر

2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکور یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت شخص تعریف گردیده باشند. مدیر پژوهه به پرسش ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می نماید.

2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.

2.3 اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردد:

1- موافقنامه؛

2- نامه قبولی آفر؛

3- آفر قراردادی؛

4- شرایط خاص قرارداد؛

5- شرایط عمومی قرارداد؛

6- مشخصات تخفیکی؛

7- نقشه ها؛

8- بل احجام کاری؛ و

9- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.

#### ماده 3- زبان و قانون قرارداد

3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.

#### ماده 4- تصامیم مدیر پژوهه

4.1 مدیر پژوهه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسائل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.

#### ماده 5- واگذاری

5.1 مدیر پژوهه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.

#### ماده 6- ارتباطات

6.1 هر گونه ارتباط برقرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد.

#### ماده 7- عقد قرارداد های فرعی

7.1 قراردادی باید اداره را کتبیاً در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبل از آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجاip

	و مسؤولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متأثر نمی سازد.	
7.2	در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.	
8.1	قراردادی سache کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.	ماده 8- سایر قراردادی ها
9.1	قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تأیید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.	ماده 9- کارمندان
9.2	مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.	
10.2	اداره و قراردادی هر کدام مستول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.	ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی
11.1	خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:	ماده 11- خطرات مربوط اداره
1	- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:	
(1)	استفاده یا تصرف سache توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نپذیر امور ساختمان باشد؛ یا	
(2)	غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی	
2	- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که سache کار در آن	

	واقع شده است را متاثر سازد.	
11.2	<p>خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار الی صدور تصديقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اينکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذيل باشد:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- نقص موجود در تاريخ تكميلي امور ساختمانی؛</li> <li>2- حادثه صورت گرفته قبل از تاريخ تكميلي که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا</li> <li>3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاريخ تكميل.</li> </ol>	
12.1	<p>خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصديقنامه مسئولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسئولیت قراردادی می باشد.</p>	ماهه 12- خطرات مربوط به قراردادی
13.1	<p>قراردادی مکلف است پوشش بيمه حادثات ذيل ناشی از خطرات خود را از تاريخ آغاز کار الی ختم ميعاد مسئولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛</li> <li>2- زیان یا خساره تجهیزات؛</li> <li>3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و</li> <li>4- صدمه شخصی یا مرگ.</li> </ol>	ماهه 13- بيمه
13.2	<p>قراردادی، پالیسی بيمه را قبل از تاريخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بيمه در برگيرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.</p>	
13.3	<p>در صورت عدم ارائه پالیسی بيمه و تصديقنامه بيمه توسط قراردادی، اداره بيمه لازم را بدین منظور فراهم و قيمت بيمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالاي قراردادی محسوب ميگردد.</p>	
13.4	<p>هرگونه تغيير در شرایط بيمه بدون تأييد مدیر پروژه قابل قبول نمي باشد.</p>	
13.5	<p>طرفين مطابق شرایط پالیسی بيمه عمل می نمایند.</p>	
14.1	<p>قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.</p>	ماهه 14- آگاراش تحقیق ساحه
15.1	<p>مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.</p>	ماهه 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد
16.1	<p>قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تехنیکی و نقشه ها اجرا و نصب می</p>	ماهه 16- قراردادی

		نماید.
17.1	ماده 17- تاریخ تخصیصی امور ساختمان	قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروره تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخصیصی تکمیلی، تکمیل می نماید.
18.1	ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروره	قراردادی مشخصات تخصیکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروره جهت تأیید ارائه می نماید.
18.2		قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.
18.3		تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروره، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های مؤقت را متاثر نمی سازد.
18.4		در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.
18.5		تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروره تأیید گرددند.
19.1	ماده 19- اینمنی	قراردادی مسؤول اینمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.
20.1	ماده 20- اکتشاف	هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروره را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروره موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.
21.1	ماده 21- ملکیت ساحه	اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر در شروع فعالیت های مربوط تقسیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.
22.1	ماده 22- دسترسی به ساحه	قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروره یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروره معرفی گردیده، می دهد.
23.1		قراردادی تمام دستایر مدیر پروره را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.
23.2	ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی	قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یادداشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتخر موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.
24.1	ماده 24- منازعه	در صورتیکه تصمیم مدیر پروره به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد.
24.2		مرجع تصمیم کشی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.

ب. کنترول زمان

25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های امواساختمانی را جهت تائیدی به مدیر پروژه ارائه نماید.	ماده 25- پلان کاری
25.2 پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلسل فعالیت ها باشد.	
25.3 قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تائید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.	
25.4 تائید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.	
26.1 مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.	ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل
26.2 مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.	
27.1 در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و توسط اداره و قراردادی تأیید میگردد.	ماده 27- تسریع
27.2 پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.	
28.1 مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تاخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.	ماده 28- تأخیرسفارش شده توسط مدیر پروژه
29.1 اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند 1 ماده 32 می باشد.	ماده 29- جلسات مدیریت
29.2 مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کایی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.	
30.1 قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت	ماده 30- هشدار زود هنگام

<p>قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.</p> <p>30.1 قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.</p>	<b>ج. کنترول کیفیت</b>
<p>31.1 مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤولیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است، بررسی می نماید.</p> <p>32.1 در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تختنیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قبل جبران تلقی میگردد.</p> <p>33.1 مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. میعاد رفع نواقص الى تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.</p> <p>33.2 قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسط مدیر پروژه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می نماید.</p> <p>34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ مذکوره از تامینات قراردادی وضع می گردد.</p>	<b>ماده 31- تشخیص نواقص</b> <b>ماده 32- آزمایش</b> <b>ماده 33- تصحیح نواقص</b> <b>ماده 34- نواقص تصحیح نا شده</b>
<p>35.1 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.</p> <p>35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.</p> <p>36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.</p> <p>37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.</p>	<b>د. کنترول مصارف</b> <b>ماده 35- بل احجام کاری<sup>۱</sup></b> <b>ماده 36- تغییر مقدار<sup>۲</sup></b> <b>ماده 37- اضافه کاری</b>

<sup>۱</sup> از قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند ۱ ماده ۳۷ شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعریض گردید.  
 بند ۱ ماده ۳۷ قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شد خوبیش را در جریان ۱۴ روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید، فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.

<sup>۲</sup> از قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده ۳۸ شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعریض گردید.  
 بند ۱ ماده ۳۸ تغییر جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه پا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، تبیین های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

و کم کاری	
ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها	38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.
38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبلًا ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.	
38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تغیین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.	
38.4 در صورتیکه به نسبت استجعاليت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می شود.	
38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بايست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.	
ماده 39- تخمین جریان پول نقد	39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری <sup>۳</sup> ، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبالغه قرارداد تبدیل میگردد.
ماده 40- تصدیقنامه پرداخت ها	40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفي مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.
40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.	
40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.	
40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری <sup>۴</sup> تکمیل شده می باشد.	
40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد.	
40.6 مدیر پروژه اقلام قبلًا تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگفته و یا متناسب به مقدار قبلًا تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.	
ماده 41- پرداخت ها	41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرما می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.
41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.	
41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.	
ماده 42- واقعی قابل جبران	42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد: ۱- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند ۱ ماده 21 شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده است.

<sup>۳</sup> در قرارداد با پرداخت بالطفعه، بعد از برنامه کاری، جدول تعالیت اضافه گردید  
۴ در قرارداد با پرداخت بالطفعه، این پارagraf شکل نیل تحریر گردید: "ارزش کسر امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول تعالیت می باشد"<sup>۵</sup>

	<p>2- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متأثر می سازد؛</p> <p>3- مدیر پروژه دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تختیکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛</p> <p>4- مدیر پروژه دستور بر ملاساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، نواقص ثبت نمی گردد؛</p> <p>5- مدیر پروژه بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛</p> <p>6- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولي آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (شمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛</p> <p>7- مدیر پروژه دستور حل وضیعت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل اینمی یا سایر دلایل لازم باشد؛</p> <p>8- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛</p> <p>9- تأخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره</p> <p>10- تاثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛</p> <p>11- تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلایل نا معقول از جانب مدیر پروژه؛</p>	
42.2	در صورت وقوع حادثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد. مدیر پروژه تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.	
42.3	در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.	
43.1	مدیر پروژه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی (BRT)، و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسليمی آفرها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعديل می نماید. این تعديل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبلاً در قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.	
44.1	مداده 43- مالیه 44- اسعار 45- تعديل قیم	در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.
45.1	45.1 تعديل قیم	در صورت که طرف قرارداد از آن تذکر رفته باشد.
46.1	46- تأمینات 47- جریمه	اداره الى ختم تمام کار، قسمتی از پول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.
46.2	47- جریمه	نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.
47.1	تا خیر	جریمه تأخیر به نرخ فی روز مندرج شرایط خاص قرارداد برای روز های تأخیر محاسبه

میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتاد طرز العمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جریمه تأخیر تاثیری بر مسؤولیت های قراردادی ندارد.

47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تأخیر، مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تأخیر توسط قراردادی را با تعديل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.

48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مكافات به نزد فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مكافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است) **شرط خاص قرارداد**، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرانسیسه است تصدیق می نماید.

49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج **شرط خاص قرارداد**، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکنانه وضع نمیگردد.

49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت ثبت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کاپی های اتوایس ها یا دیگر استناد را به مدیر پروژه ارائه می نماید.

49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعديل قیم، حداده قابل جبران، مكافات، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.

50.1 داوطلب برنده در مدت 10 روز بعد از یافتن نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در **شرط خاص قرارداد**، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.

51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.

51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فورم های تائید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورم تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.

51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورم های امضاء شده، صورت میگیرد.

ماده 48- مكافات

ماده 49- پیش  
پرداخت

ماده 50- تضمینات

ماده 51 - مزد کار

<p>52.1 قراردادی بمصرف خود، مسؤولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم ميعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.</p>	<p>ماده 52- مصارف ترمیمه</p>
ح. اختتام قرارداد	
<p>53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروره درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروره بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید.</p>	<p>ماده 53- تکمیل</p>
<p>54.1 اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.</p>	<p>ماده 54- تسلیم</p>
<p>55.1 قراردادی قبل از ختم ميعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع بول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروره ارائه می نماید. مدیر پروره تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروره در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروره تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.</p>	<p>ماده 55- حساب نهایی</p>
<p>56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید.</p>	<p>ماده 56- رهنمود عملیاتی و مراقبت</p>
<p>56.2 در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده شرایط خاص قرارداد از جانب قراردادی یا عدم تأییدی آن از جانب مدیر پروره، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از برداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.</p>	

<p>57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.</p> <p>57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تأیید نگردیده باشد؛</li> <li>2- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصراف از این دستور صورت نگرفته باشد؛</li> <li>3- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی</li> <li>4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نوافض را رفع نماید؛</li> <li>5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛</li> <li>6- در صورتیکه مقدار جرمیه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.</li> </ol> <p>57.3 علغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.</p> <p>57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.</p>	ماده 57- فسخ قرارداد
<p>58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبایی، اجبار، یا ایجاد موانع در پرسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد.</p> <p>58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبایی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد.</p> <p>58.3 اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آنی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرجیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر<sup>۳</sup> (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.</li> <li>2- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهوأ به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.</li> <li>3- تبایی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر<sup>۴</sup> داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قرارداد نادرست اعمال سائزین طرح گردیده باشد.</li> <li>4- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.</li> </ol>	ماده 58- فساد و تقلب

<sup>۳</sup> به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مربوط به پرسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.  
<sup>۴</sup> به شرکت کننده های پرسه تدارکات (پیشمول مقامات دولتی) که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت بر پرسه تدارکات را داشته اند. اطلاق میگردد.

۵- ایجاد اخلاق و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربیط ارجاع می نماید.

اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتيش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسليمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشين موظف از جانب اداره فراهم نماید.

58.4 هیچ نوع فیس، مكافات، تخفیف، تخفیف، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهاییکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.

59.1 در صورت فسخ قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفرقی پیش پرداخت شده الی تاریخ صدور تصدیقنامه و فیضی قابل تطبیق بالای کل امور ساختمانی تکمیل ناشده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می نماید. جریمه تأخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محاسب می گردد.

ماده 59- پرداخت  
بمحض فسخ

59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصدیقنامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفرقی پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور تصدیقنامه را صادر می نماید.

60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.

ماده 60- ملکیت

61.1 در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره یا قراردادی متأثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیقنامه و کارها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد.

ماده 61- عدم امکان  
تطبیق قرارداد

62.1 حل منازعه بطور دوستانه:  
۱- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند.

ماده 62- حل منازعه

#### مرجع حل و فصل منازعات:

2- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتنی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مرجع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد.

حکمیت:

3- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (28) روز از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.



د افغانستان اسلامی جمهوریت

د سوداک سری او صنعت سایسوس و دارا

د مرکزی ثبت او فکری مالکیت لوي ریاست

لاری افغانستان

و ادارت تجارت و صنعت

ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری

Reg #: 80154  
License #: D-26404

**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Commerce and Industries  
Directorate General of Central Business Registry & Intellectual Property**

ریاست ثبت: ۸۰۱۵۴  
ریاست نمبر: D-۲۶۴۰۴

TIN شناسنامه ملی /  
1043478013



جوړل تشبيث  
Business License

شرکت ساختگاهی نوبهار بیانی  
Naw Bahar Bayanai Construction and Road Building Company



کوئندی کړدی دا جواړ ټېټه ښه پوره ډالد ټېټه د افغانستان د تاق د ټېټو ۴۵ پېښت ثبت او صادر شو.

کوئندی کړدی میرګردیده اړیه جواړ که ټام آن اړ فوی ټکر میښد، در مطابقت با قوانین ننګه افغانستان ثبت او صادر ګردیده است.

It is certified that this license with mentioned name, is registered and issued in accordance with and subject to the effective laws of Afghanistan.

Issue Date:	13/07/2017	رегистر ټینکر: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
Valid Date:	11/07/2020	د ټېټن ټینکر: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
Established:	2007	د تاسیس کول: ۱۳۸۹
		ستکندر نفعیت: ساختگاه
		المن میرکت: تاجپه ۳۴۶۷ نیشنل ایم میڈیا میڈیا - نیشنل ایم
		باظطن

نمر مسلسل: 18404  
قىمىت حىچ اىلىك (۰۰.۰۰) افغانى

طاریق احمد سرفراز  
Tariq Ahmad Sarfaraz

NBRC



دیغستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

*Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*



معینت آبیاری و ملابع طبیعی  
ریاست آبیاری  
امرت اخیری

Province : Badakhshan

District : Ishkashim

Village : Namazgah

Project : Namazgah Weir and Canal Protection

ولایت : بدخشان

ویسالی : اشکاشم

قریه : نمازگه

پروژه : سریند و تحکیم کاری کتال نمازگه

شماره	تفصیل امور	حجم	واحد	قیمت فیات	قیمت مجموعی	ملحوظه
1	کدن کاری برای تیدابها در زمین ریگی و چندر	812.51	متر مکعب	170	138126.7	
2	سنگ کاری بالصله نسبت 1:4	617.58	متر مکعب	2600	1605708	
3	هنگاف کاری بالصله نسبت 1:3	675.05	مترمربع	100	67505	
4	کانگریت سیخ دار (RCC) بترکیب نسبت 1:1.5:3	0.22	متر مکعب	13000	2860	
5	کانگریت بدون سیخ (PCC) بترکیب نسبت 1:1.5:3	32.76	متر مکعب	5800	190008	
6	پرکاری کف کتال توسط چفل مطابق به نقشه	0.96	متر مکعب	120	115.2	
7	دروازه سریند مکمل اسپاب مطابق به مشخصات نقشه	1	پایه	20000	20000	
8	پرکاری عقب دیوارها با مواد کدن کاری شده مطابق به مشخصات نقشه	150.8	متر مکعب	150	22620	
مجموع قیمت تخمینی به افغانی				2046943	نحوی	

قرارشح فوق جدول برآورد اول امورکاری پروژه ( سریند و تحکیم کاری کتال نمازگه ) ویسالی اشکاشم ولایت بدخشان غرض اجرآت بعدی ترتیب و تقدیم است.

الجیر سالار ( اکبر ) :

وحید الله الجیرینه این :

محمدزمان الجیر برآورده :

سلیمان دوسلیمان حیل شن هزارون هزار جعل سه تری میلیون

فورمہ تسلیمی آفر

فورمه امور ساختمانی کوچک/01

داوطلب این فورم را خانه پری و همراه با آفر خویش تسليم می نماید.

اداره روزارت زراعت، آبیاری و مالداری

شماره دادگاهی: MAIL/PD/NCB/W/135/98

عنوان تدارکات: بازسازی سربند وتحکیم کاری کانل نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخشان مایان که در زیر این فهرست اجتناب نموده اند از اینها منع می شوند.

ما شرط‌نامه را دقیق مطالعه کردیم و هیچ ملاحظه‌یی در قسمت آن شامل ضمیمه شماره: (۱۰۰۰) نداشتیم و همچنانکه در مطابقت به شرایط عمومی قرارداد به

قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از: ۲۰۴۶۹۴۳ - دو میلیون هشتاد و سه هزار و نهصد و هجده تومان (می باشد).

۱۰. تخفیفات پیشنهاد شده: در صورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:

(2) قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:

ما جهت اجرای این قرارداد مبلغ **هزار و سیصد هزار و دویست هزار** را منحیت پیش پرداخت درخواست می نمائیم.

ما میدانیم که اداره مکلف به قبولي، آفر دا اي نازلترين قيمت ارائه شده و پا هر آفر در رفاقت شده ديجگر نیست.

ما بدینویسیله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مندرج صفحه معلومات دادگستری، می باشد.

آفر مایه‌ای میعاد مشخص در بند ۱ ماده ۱۶ دستورالعمل برای دارطلبان، سر از تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند ۱ ماده ۲۱ دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن بالای ما الزامی و قابل قبول بوده می‌شود.

هرگاه آفرینش قبول شود، ما تعهد می‌سپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با بند ۱ ماده ۳۵ دستورالعمل برای داوطلبان، بخاطر اجرای معمق قرار داد فراهم می‌نماییم؛

ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اكمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند ۱ ماده ۴ دستور العمل، سار، دامنه ظلیلان: مر. باشیم.

ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل برای دامطلبانه نداشیم.

ما بشمول قراردادیان فرعی یا اكمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به بند های 3 و 4 ماده


لایهای NCB/W/135/98 پایانی MAIL/PD/NCB/W/135/98



دکر هنی، اوبولگولو او مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغستان اسلامی جمهوری دولت  
دولت جمهوری اسلامی افغانستان

**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**



معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۶

شماره: (۵۴۴)

**نامه قبولی آفر**

از نزیاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

آدرس: جمال مینه ناحیه سوم کابل افغانستان

به: شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بربالی دارنده جواز نمبر (D-26404)

آدرس: ناحیه سوم شهر فیض آباد، مرکز بدخشنان، فیض آباد

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارایه شده شما مؤخر ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ برای قرارداد پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان به قیمت مجموعی ۲,۰۴۶,۹۴۲.۹۰ - افغانی (دو میلیون و چهل و شش هزار و نه صد و چهل و دو اعشاریه نه افغانی) اعطای نماید. طوریکه در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرط‌نامه مربوطه تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است. لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشت تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود.

مشخصات تدارکات / قرارداد: پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشنان

شماره تشخیصیه تدارکات: MAIL/PD/NCB/W/135/98

قیمت مجموعی: ۲,۰۴۶,۹۴۲.۹۰ - افغانی (دو میلیون و چهل و شش هزار و نه صد و چهل و دو اعشاریه نه افغانی)

نوعیت تضمین اجرای قرارداد: تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی و غیر مشروط باشد

مقدار تضمین اجرای قرارداد: پنج فیصد (۱۰۳۰۰۰) افغانی – به مدت ۷.۵ ماه تضمین اجرا ارائه گردد.

زمان عقد قرارداد: بعد از ارائه تضمین حسن اجرا قرارداد عقد می گردد.

مکان عقد قرارداد: ریاست تهیه و تدارکات

همچین عرض مطالعه و مزین معلومات اشما، موافقنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص: محمد الله الساحل

وظیفه: رئیس تهیه و تدارکات

امضاء و تاریخ

کابینه  
به دستیجه همراه

# ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

## MINISTRY

IRRIGATION DIRECTORATE

Engineering Department

Project name: Nemazzah Weir and Canal Protection.

Province: Badakhshan

District: Ishkashim

Village: Nemazzah

Kabul, Afghanistan  
29, 11, 2017  
08,09, 1396

## INDEX SHEET

SHEET No.	DRAWING TITLES	REMARKS
1	INDEX SHEET	
2	GENERAL REQUIREMENT OF MATERIALS	
3	SITE PLAN 1	
4	PLAN1	
5	ALL SECTIONS	
6	Site Plan2 and Section 1-1	
7	Site Plan 3 and Section 2-2, Section 3-3	
8	Site Plan 4, Plan4 and Section 4-4	
9	Gate Detail	

Surveyed By Eng. Hashem Eng. Hashem		Reviewed By Eng. Abdurahman Eng. Abdurahman	Scale No to scale	Province Badakhshan	Project Name: Nemzagh Weir and Canal Protection
Drawn By Eng. Hashem Eng. Hashem		Checked By Eng. Salar Afbar Eng. Salar Afbar	Date 10.01.2017	District Ishkashim	Drawing Title: Index Sheet
Designed By Eng. Wahidullah Engineering Department KABUL		Approved By Irrigation Directorate	Revision No. 0	Village Nemzagh	
 Scale: 1:50000  Sheet No.: 1					

**Hydraulic Data:-**

The Hydraulic design usually involves a general procedure that is essentially the same for each case. Some of the basic components inherent in the design of any hydraulic structure include data: surveys of existing characteristics, estimates of future characteristics, engineering design criteria, discharge estimates, structure requirements and constraints and receiving facilities.

**Note:-**  
Site engineer should implement the structure fit with river condition.

**BM. 1**  
E:459792.5400m  
N:3811721.0950m  
Z:2482.216m

**BM. 2**  
E:459761.3140m  
N:3811722.0310m  
Z:2483.400m

**3. CONCRETE:-**

28 days standard strength :  $f_c = 25 \text{ N/mm}^2$  (250 kg/cm<sup>2</sup>)  
compressing strength (standard cube) :

Minimum clear cover to main reinforcement bar:


1. a) for rcc elements : baton bar side - 50 mm - 50 mm
- b) Members cast against and permanently exposed to non-saline water/soil : 75 mm
- c) Members permanently exposed to saline water / soil : 100 mm
2. Mixer machine and vibrator must be used in all rcc casting.
3. Written dimensions are to be taken in preference to scaled ones.
4. Minimum bearing capacity of soil considered 1.5 kg/cm<sup>2</sup> (0.15n/mm<sup>2</sup>).
5. Bearing capacity of soil under foundation shall be test before implementation of foundation.
6. Height and length of retaining wall should be adjusted to site condition .
7. Stone masonry work with mortar, mortar ratio cement : sand (1:4).
8. All exposed surface of stone masonry work should be pointed).
9. The locations of all Turn outs must be identified by the communities.
10. The distance of 200 to 250m between two turn outs must be kept.

**Structural Requirements.**

- 1- All elevations, given in Meter, are based on the local benchmarks as shown on the site plan.
- 2- All dimensions are in Centimeter unless otherwise shown.
- 3- All mortar for , stone masonry to have cement:sand ratio of 1:4
- 4- The average compressive strength at 28 days of the trial mixes of concrete shall be 30 % higher than the average works cube compressive strength at 28 days.
- 5- Placing and/or finishing concrete at night shall be with adequate lighting and by written permission of the Supervisor.
- 6- Construction joints shall be located where shown on the Drawings or permitted by the Supervisor. Construction joints shall be perpendicular to the principal lines of stress and in general shall be located at point of minimum shear.
- 7- 20 x 20 mm chamfer shall be made on all corners successive lifts of walls and columns, of concrete unless shown otherwise.
- 8- Stone pitching shall comprise 300 mm size stones minimum, and packing stone of 100 mm size minimum for wedging and to fill gaps under the pitching stone.
- 9- Mortar for pointing and plaster is 1:3
- 10- Compaction in remote area where the proper roller not accessible, must be done by hand hammer.
- 11 The distance between each typical turn outs must be kept 200 m
- 12 The total number of typical turn out structures along the canal considered 14 number .
- 13 Along the canal there are many hard cutting.
- 14 Roc (1 : 5 : 2)
- 15 Construction Joint should be after each 15 m With 5 cm materail Pcc


State Bank of Afghanistan Ministry of Water Resources and Irrigation Irrigation Directorate Engineering Department KABUL		SURVEYED BY Eng Aqasir DRAWN BY Eng G Hashem DESIGNED BY Eng Wahidullah	REVIEWED BY Eng Abdurrahman CHECKED BY Eng Salar Akbar APPROVED BY Irrigation Directorate	PROJECT NAME: Nemzagh Weir and Canal Protection DRAWING TITLE: General Requirements DATE: 10.01.2017 REVISION NO. 0 SCALE: 1:2000 SHEET NO. 2/9
--	--	---	---	--

# Site Plan1

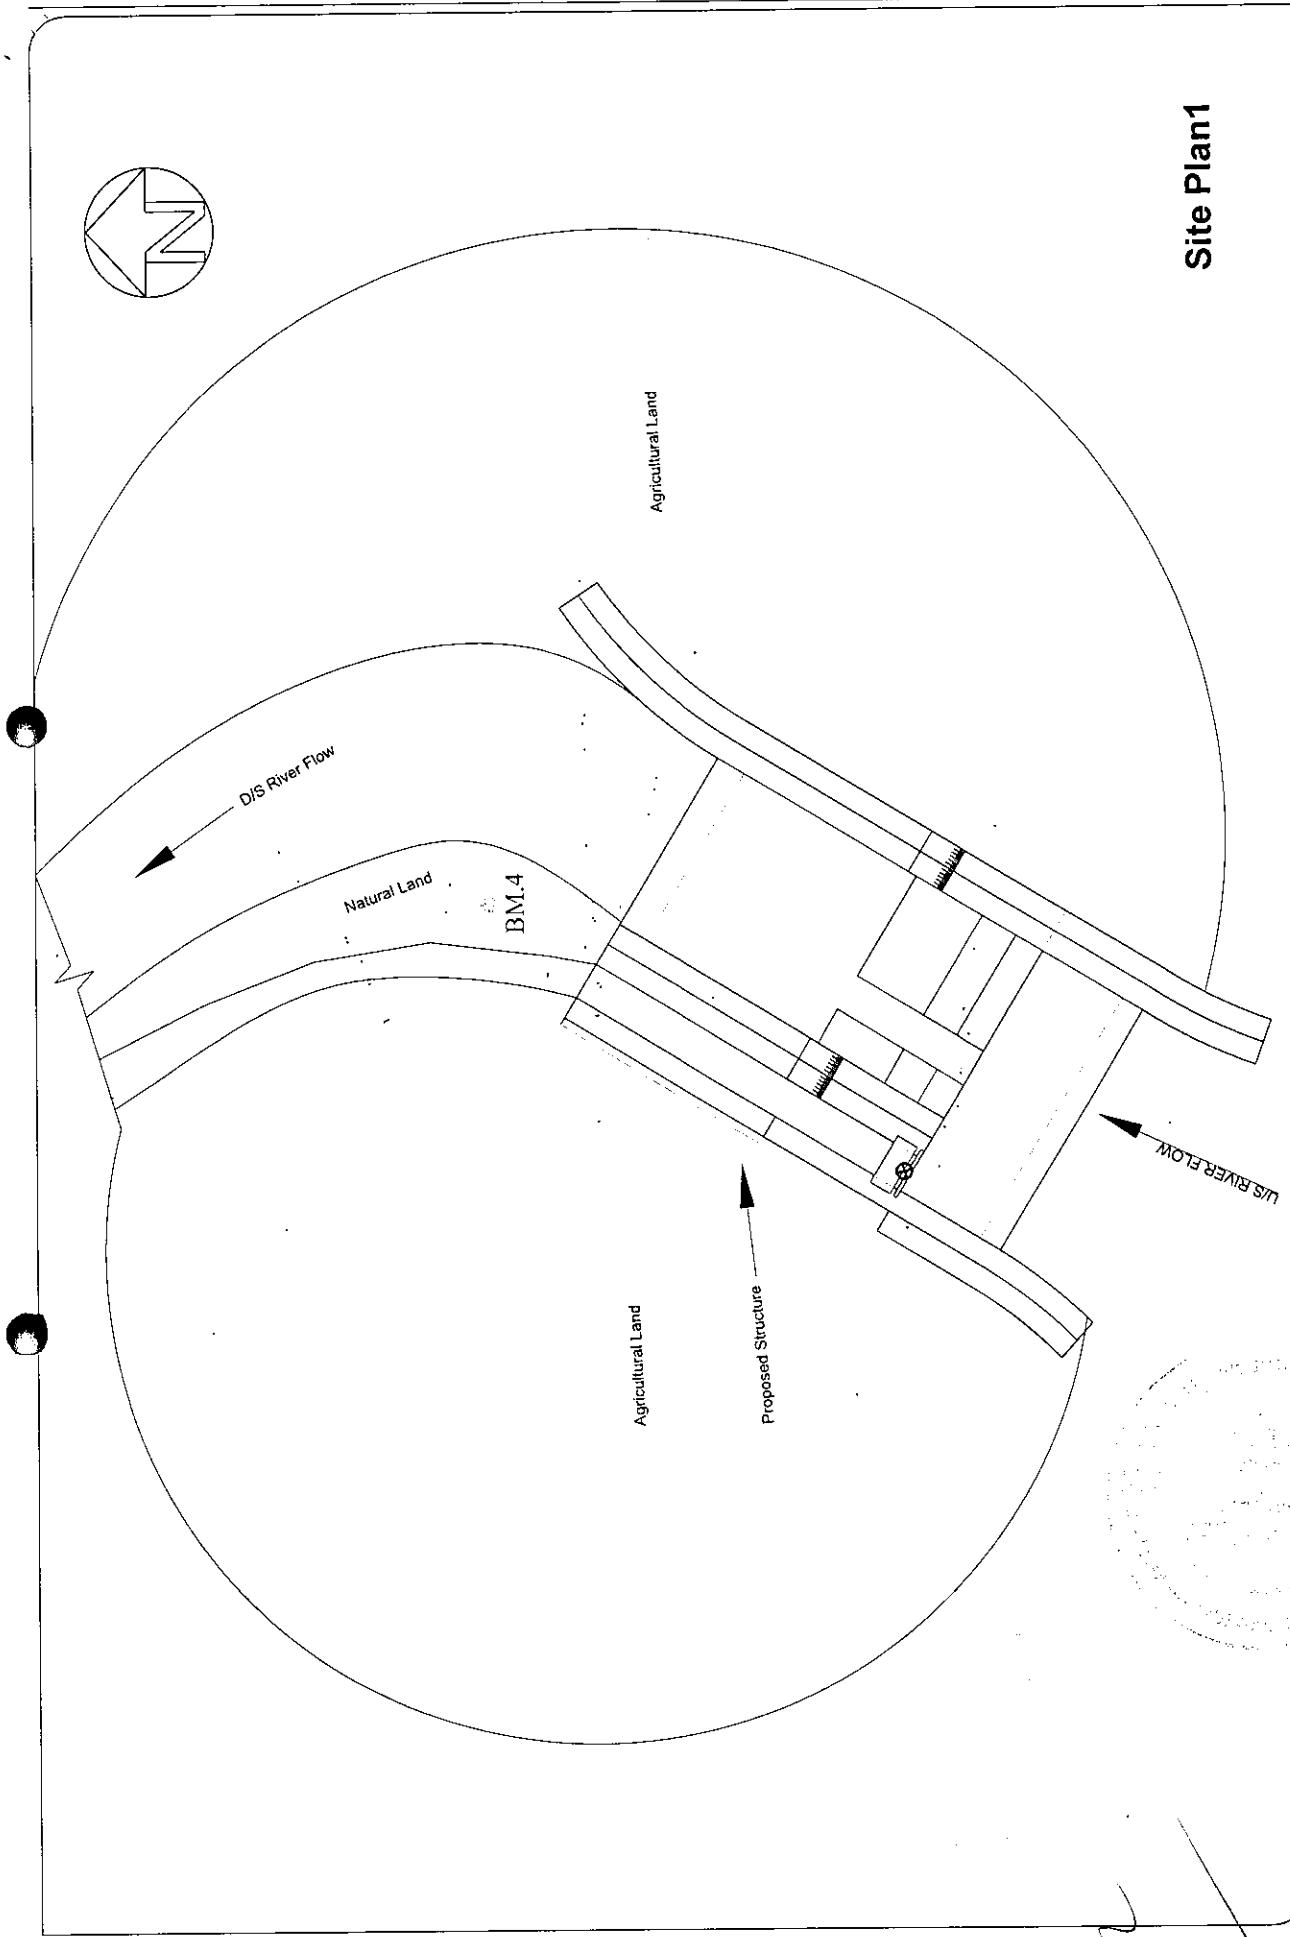


SURVEYED BY Eng.Aqashir Eng.S Hashem		CHECKED BY Eng.Saleh		PROJECT NAME Nemazgah Wein and Canal Protection.	
DESIGNED BY Eng.Wahidullah		REVIEWED BY Eng.Abdurrahman		DATE Aug.2012	
DRAWN BY Eng.Wahidullah		APPROVED BY Irrigation Directorate		DISTRICT Iskashim	DRAWING TITLE Site Plan1
REVISION NO. 1					
REVISION NO. 2					
REVISION NO. 3					
REVISION NO. 4					
REVISION NO. 5					
REVISION NO. 6					
REVISION NO. 7					
REVISION NO. 8					
REVISION NO. 9					
REVISION NO. 10					
REVISION NO. 11					
REVISION NO. 12					
REVISION NO. 13					
REVISION NO. 14					
REVISION NO. 15					
REVISION NO. 16					
REVISION NO. 17					
REVISION NO. 18					
REVISION NO. 19					
REVISION NO. 20					
REVISION NO. 21					
REVISION NO. 22					
REVISION NO. 23					
REVISION NO. 24					
REVISION NO. 25					
REVISION NO. 26					
REVISION NO. 27					
REVISION NO. 28					
REVISION NO. 29					
REVISION NO. 30					
REVISION NO. 31					
REVISION NO. 32					
REVISION NO. 33					
REVISION NO. 34					
REVISION NO. 35					
REVISION NO. 36					
REVISION NO. 37					
REVISION NO. 38					
REVISION NO. 39					
REVISION NO. 40					
REVISION NO. 41					
REVISION NO. 42					
REVISION NO. 43					
REVISION NO. 44					
REVISION NO. 45					
REVISION NO. 46					
REVISION NO. 47					
REVISION NO. 48					
REVISION NO. 49					
REVISION NO. 50					
REVISION NO. 51					
REVISION NO. 52					
REVISION NO. 53					
REVISION NO. 54					
REVISION NO. 55					
REVISION NO. 56					
REVISION NO. 57					
REVISION NO. 58					
REVISION NO. 59					
REVISION NO. 60					
REVISION NO. 61					
REVISION NO. 62					
REVISION NO. 63					
REVISION NO. 64					
REVISION NO. 65					
REVISION NO. 66					
REVISION NO. 67					
REVISION NO. 68					
REVISION NO. 69					
REVISION NO. 70					
REVISION NO. 71					
REVISION NO. 72					
REVISION NO. 73					
REVISION NO. 74					
REVISION NO. 75					
REVISION NO. 76					
REVISION NO. 77					
REVISION NO. 78					
REVISION NO. 79					
REVISION NO. 80					
REVISION NO. 81					
REVISION NO. 82					
REVISION NO. 83					
REVISION NO. 84					
REVISION NO. 85					
REVISION NO. 86					
REVISION NO. 87					
REVISION NO. 88					
REVISION NO. 89					
REVISION NO. 90					
REVISION NO. 91					
REVISION NO. 92					
REVISION NO. 93					
REVISION NO. 94					
REVISION NO. 95					
REVISION NO. 96					
REVISION NO. 97					
REVISION NO. 98					
REVISION NO. 99					
REVISION NO. 100					
REVISION NO. 101					
REVISION NO. 102					
REVISION NO. 103					
REVISION NO. 104					
REVISION NO. 105					
REVISION NO. 106					
REVISION NO. 107					
REVISION NO. 108					
REVISION NO. 109					
REVISION NO. 110					
REVISION NO. 111					
REVISION NO. 112					
REVISION NO. 113					
REVISION NO. 114					
REVISION NO. 115					
REVISION NO. 116					
REVISION NO. 117					
REVISION NO. 118					
REVISION NO. 119					
REVISION NO. 120					
REVISION NO. 121					
REVISION NO. 122					
REVISION NO. 123					
REVISION NO. 124					
REVISION NO. 125					
REVISION NO. 126					
REVISION NO. 127					
REVISION NO. 128					
REVISION NO. 129					
REVISION NO. 130					
REVISION NO. 131					
REVISION NO. 132					
REVISION NO. 133					
REVISION NO. 134					
REVISION NO. 135					
REVISION NO. 136					
REVISION NO. 137					
REVISION NO. 138					
REVISION NO. 139					
REVISION NO. 140					
REVISION NO. 141					
REVISION NO. 142					
REVISION NO. 143					
REVISION NO. 144					
REVISION NO. 145					
REVISION NO. 146					
REVISION NO. 147					
REVISION NO. 148					
REVISION NO. 149					
REVISION NO. 150					
REVISION NO. 151					
REVISION NO. 152					
REVISION NO. 153					
REVISION NO. 154					
REVISION NO. 155					
REVISION NO. 156					
REVISION NO. 157					
REVISION NO. 158					
REVISION NO. 159					
REVISION NO. 160					
REVISION NO. 161					
REVISION NO. 162					
REVISION NO. 163					
REVISION NO. 164					
REVISION NO. 165					
REVISION NO. 166					
REVISION NO. 167					
REVISION NO. 168					
REVISION NO. 169					
REVISION NO. 170					
REVISION NO. 171					
REVISION NO. 172					
REVISION NO. 173					
REVISION NO. 174					
REVISION NO. 175					
REVISION NO. 176					
REVISION NO. 177					
REVISION NO. 178					
REVISION NO. 179					
REVISION NO. 180					
REVISION NO. 181					
REVISION NO. 182					
REVISION NO. 183					
REVISION NO. 184					
REVISION NO. 185					
REVISION NO. 186					
REVISION NO. 187					
REVISION NO. 188					
REVISION NO. 189					
REVISION NO. 190					
REVISION NO. 191					
REVISION NO. 192					
REVISION NO. 193					
REVISION NO. 194					
REVISION NO. 195					
REVISION NO. 196					
REVISION NO. 197					
REVISION NO. 198					
REVISION NO. 199					
REVISION NO. 200					
REVISION NO. 201					
REVISION NO. 202					
REVISION NO. 203					
REVISION NO. 204					
REVISION NO. 205					
REVISION NO. 206					
REVISION NO. 207					
REVISION NO. 208					
REVISION NO. 209					
REVISION NO. 210					
REVISION NO. 211					
REVISION NO. 212					
REVISION NO. 213					
REVISION NO. 214					
REVISION NO. 215					
REVISION NO. 216					
REVISION NO. 217					
REVISION NO. 218					
REVISION NO. 219					
REVISION NO. 220					
REVISION NO. 221					
REVISION NO. 222					
REVISION NO. 223					
REVISION NO. 224					
REVISION NO. 225					
REVISION NO. 226					
REVISION NO. 227					
REVISION NO. 228					
REVISION NO. 229					
REVISION NO. 230					
REVISION NO. 231					
REVISION NO. 232					
REVISION NO. 233					
REVISION NO. 234					
REVISION NO. 235					
REVISION NO. 236					
REVISION NO. 237					
REVISION NO. 238					
REVISION NO. 239					
REVISION NO. 240					
REVISION NO. 241					
REVISION NO. 242					
REVISION NO. 243					
REVISION NO. 244					
REVISION NO. 245					
REVISION NO. 246					
REVISION NO. 247					
REVISION NO. 248					
REVISION NO. 249					
REVISION NO. 250					
REVISION NO. 251					
REVISION NO. 252					
REVISION NO. 253					
REVISION NO. 254					
REVISION NO. 255					
REVISION NO. 256					
REVISION NO. 257					
REVISION NO. 258					
REVISION NO. 259					
REVISION NO. 260					
REVISION NO. 261					
REVISION NO. 262					
REVISION NO. 263					
REVISION NO. 264					
REVISION NO. 265					
REVISION NO. 266					
REVISION NO. 267					
REVISION NO. 268					
REVISION NO. 269					
REVISION NO. 270					
REVISION NO. 271					
REVISION NO. 272					
REVISION NO. 273					
REVISION NO. 274					
REVISION NO. 275					
REVISION NO. 276					
REVISION NO. 277					
REVISION NO. 278					
REVISION NO. 279					
REVISION NO. 280					
REVISION NO. 281					
REVISION NO. 282					
REVISION NO. 283					
REVISION NO. 284					
REVISION NO. 285					
REVISION NO. 286					
REVISION NO. 287					
REVISION NO. 288					
REVISION NO. 289					
REVISION NO. 290					
REVISION NO. 291					
REVISION NO. 292					
REVISION NO. 293					
REVISION NO. 294					
REVISION NO. 295					
REVISION NO. 296					
REVISION NO. 297					
REVISION NO. 298					
REVISION NO. 299					
REVISION NO. 300					
REVISION NO. 301					
REVISION NO. 302					
REVISION NO. 303					
REVISION NO. 304					
REVISION NO. 305					
REVISION NO. 306					
REVISION NO. 307					
REVISION NO. 308					
REVISION NO. 309					
REVISION NO. 310					
REVISION NO. 311					
REVISION NO. 312					
REVISION NO. 313					
REVISION NO. 314					
REVISION NO. 315					
REVISION NO. 316					
REVISION NO. 317					
REVISION NO. 318					
REVISION NO. 319					
REVISION NO. 320					
REVISION NO. 321					
REVISION NO. 322					
REVISION NO. 323					
REVISION NO. 324					
REVISION NO. 325					
REVISION NO. 326					
REVISION NO. 327					
REVISION NO. 328					
REVISION NO. 329					
REVISION NO. 330					
REVISION NO. 331					
REVISION NO. 332					
REVISION NO. 333					
REVISION NO. 334					
REVISION NO. 335					
REVISION NO. 336					
REVISION NO. 337					
REVISION NO. 338					
REVISION NO. 339					
REVISION NO. 340					
REVISION NO. 341					
REVISION NO. 342					
REVISION NO. 343					
REVISION NO. 344					
REVISION NO. 345					
REVISION NO. 346					
REVISION NO. 347					
REVISION NO. 348					
REVISION NO. 349					
REVISION NO. 350					
REVISION NO. 351					
REVISION NO. 352					
REVISION NO. 353					
REVISION NO. 354					
REVISION NO. 355					
REVISION NO. 356					
REVISION NO. 357					
REVISION NO. 358					
REVISION NO. 359					
REVISION NO. 360					
REVISION NO. 361					
REVISION NO. 362					
REVISION NO. 363					
REVISION NO. 364					
REVISION NO. 365					
REVISION NO. 366					
REVISION NO. 367					
REVISION NO. 368					
REVISION NO. 369					
REVISION NO. 370					
REVISION NO. 371					
REVISION NO. 372					
REVISION NO. 373					
REVISION NO. 374					
REVISION NO. 375					
REVISION NO. 376					
REVISION NO. 377					
REVISION NO. 378					
REVISION NO. 379					
REVISION NO. 380					
REVISION NO. 381					
REVISION NO. 382					
REVISION NO. 383					
REVISION NO. 384					
REVISION NO. 385					
REVISION NO. 386					
REVISION NO. 387					
REVISION NO. 388					
REVISION NO. 389					
REVISION NO. 390					
REVISION NO. 391					
REVISION NO. 392					
REVISION NO. 393					
REVISION NO. 394					
REVISION NO. 395					
REVISION NO. 396					
REVISION NO. 397					
REVISION NO. 398					
REVISION NO. 399					
REVISION NO. 400					
REVISION NO. 401					
REVISION NO. 402					
REVISION NO. 403					
REVISION NO. 404					
REVISION NO. 405					
REVISION NO. 406					
REVISION NO. 407					
REVISION NO. 408					
REVISION NO. 409					
REVISION NO. 410					
REVISION NO. 411					
REVISION NO. 412					
REVISION NO. 413					
REVISION NO. 414					
REVISION NO. 415					
REVISION NO. 416					
REVISION NO. 417					
REVISION NO. 418					
REVISION NO. 419					
REVISION NO. 420					
REVISION NO. 421					
REVISION NO. 422					
REVISION NO. 423					
REVISION NO. 424					
REVISION NO. 425					
REVISION NO. 426					
REVISION NO. 427					
REVISION NO. 428					
REVISION NO. 429					
REVISION NO. 430					
REVISION NO. 431					
REVISION NO. 432					
REVISION NO. 433					
REVISION NO. 434					
REVISION NO. 435					
REVISION NO. 436					
REVISION NO. 437					
REVISION NO. 438					
REVISION NO. 439					
REVISION NO. 440					
REVISION NO. 441					
REVISION NO. 442					
REVISION NO. 443					
REVISION NO. 444					
REVISION NO. 445					
REVISION NO. 446					
REVISION NO. 447					
REVISION NO. 448					
REVISION NO. 449					
REVISION NO. 450					
REVISION NO. 451					
REVISION NO. 452					
REVISION NO. 453					
REVISION NO. 454					
REVISION NO. 455					
REVISION NO. 456					
REVISION NO. 457					
REVISION NO. 458					
REVISION NO. 459					
REVISION NO. 460					
REVISION NO. 461					
REVISION NO. 462					
REVISION NO. 463					
REVISION NO. 464					
REVISION NO. 465					
REVISION NO. 466					
REVISION NO. 467					
REVISION NO. 468					
REVISION NO. 469					
REVISION NO. 470					
REVISION NO. 471					
REVISION NO. 472					
REVISION NO. 473					
REVISION NO. 474					
REVISION NO. 475					
REVISION NO. 476					
REVISION NO. 477					
REVISION NO. 478					
REVISION NO. 479					
REVISION NO. 480					
REVISION NO. 481					
REVISION NO. 482					
REVISION NO. 483					
REVISION NO. 484					
REVISION NO. 485					
REVISION NO. 486					
REVISION NO. 487					
REVISION NO. 488					
REVISION NO. 489					
REVISION NO. 490					
REVISION NO. 491					
REVISION NO. 492					
REVISION NO. 493					
REVISION NO. 494					
REVISION NO. 495					
REVISION NO. 496					
REVISION NO. 497					
REVISION NO. 498					
REVISION NO. 499					
REVISION NO. 500					
REVISION NO. 501					
REVISION NO. 502					
REVISION NO. 503					
REVISION NO. 504					
REVISION NO. 505					
REVISION NO. 506					
REVISION NO. 507					
REVISION NO. 508					
REVISION NO. 509					
REVISION NO. 510					
REVISION NO. 511					
REVISION NO. 512					
REVISION NO. 513					
REVISION NO. 514					
REVISION NO. 515					
REVISION NO. 516					
REVISION NO. 517					
REVISION NO. 518					
REVISION NO. 519					
REVISION NO. 520					
REVISION NO. 521					
REVISION NO. 522					
REVISION NO. 523					
REVISION NO. 524					
REVISION NO. 525					
REVISION NO. 526					
REVISION NO. 527					


Plan 1

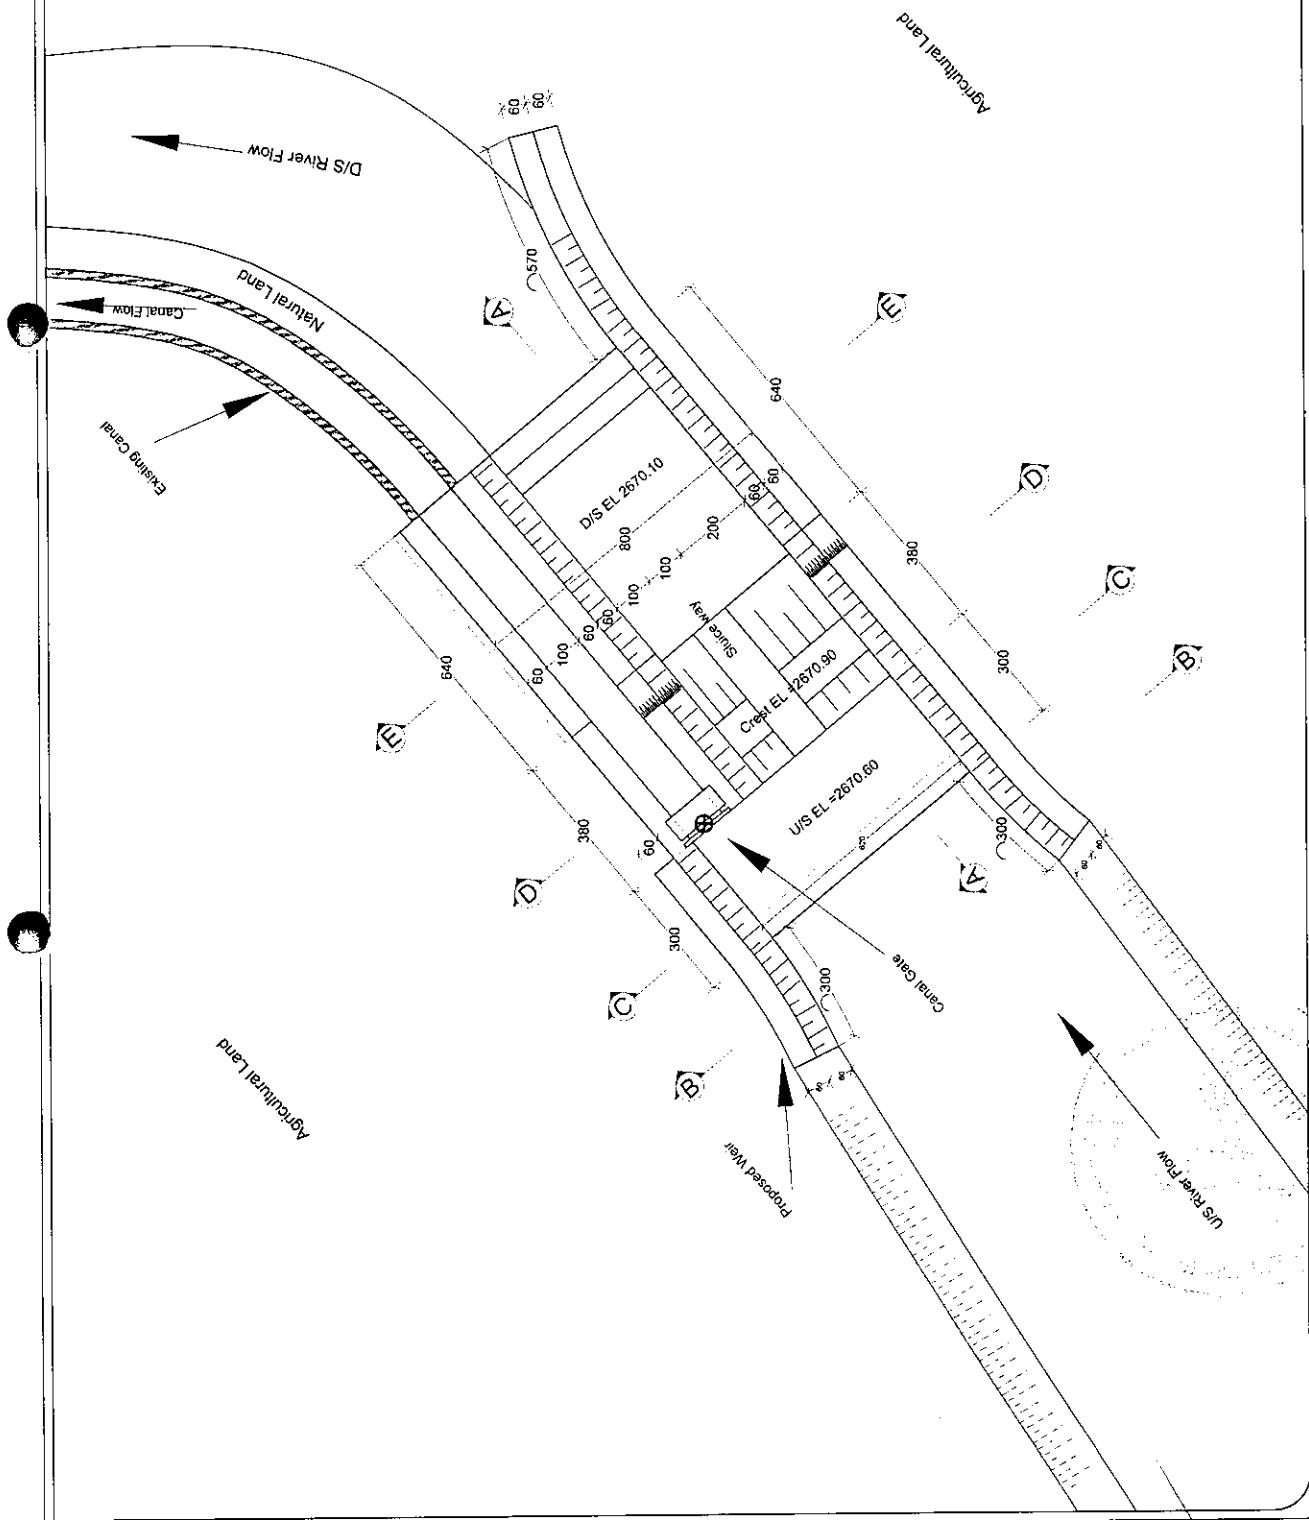


Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Resources Irrigation Directorate Engineering Department KABUL				PROJECT NAME: Nemazgah Weir and Canal Protection	
SURVEYED BY	Eng.Aqash, Eng.F.S.Ibrahim	CHECKED BY	Eng.Salar	SCALE	Not to scale
DESIGNED BY	Eng.Wahidullah	REVIEWED BY	Eng.Abdurahman	DATE	August 2012
DRAWN BY	Eng.Wahidullah	APPROVED BY	Irrigation Directorate	REVISION NO.	Nemazgah

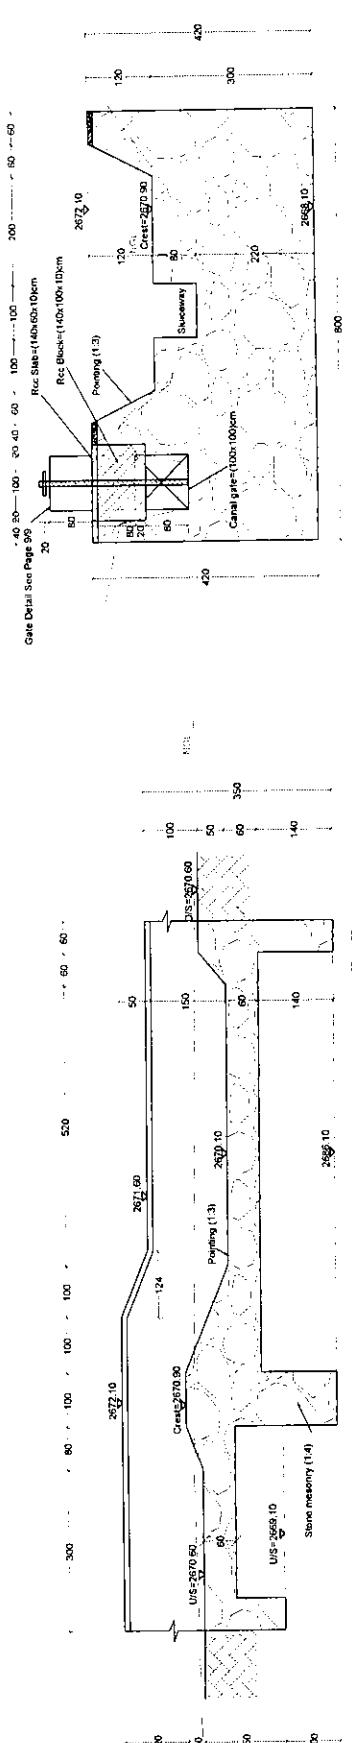


## Section A-A

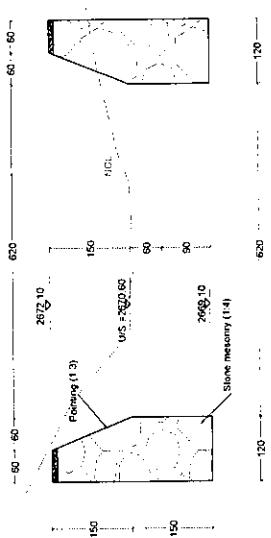

Section B-B

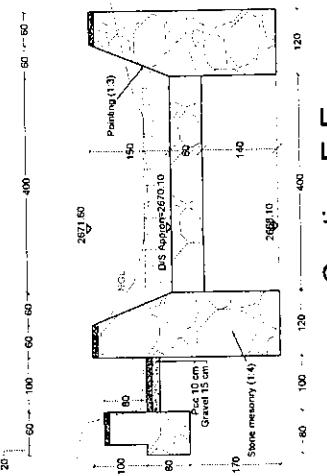

Section D-D



Section C-C

State Emblem of Afghanistan Wakf-e-Amanat-e-Insaniat		SURVEYED BY Eng. Aqashtik Eng. S. S. Ishaqzai	REVIEWED BY Eng. Abdurrahman	SCALE Not to scale	PROVINCE Badakhshan	PROJECT NAME: Nemazgah Weir and Canal Protection.
DESIGNED BY Eng. Wahidullah		CHECKED BY Eng. Salar Akbar	DATE 06.05.2017	DISTRICT Ishkashim		
DRAWN BY Eng. Wahidullah		APPROVED BY Irrigation Directorate	REVISED	VILLAGE Nemazgah	DRAWING TITLE: All Sections	
KABUL Engineering Department Irrigation Directorate						
SCALE : ON FEET 5' 6"						

Site Plan 2

Grass

1400

Chain Protection Wall

4

1

Agricultural Land

Section 1-1

Stone masonry (1:4)

40 / 30

Exist Canal

8

80

6

11

10

16

1

10

1

1

— 1 —

—


Islamic Republic of Afghanistan		Ministry of Agriculture and Irrigation		Irrigation Directorate		PROJECT NAME: Nemazgah Weir and Canal Protection.	
SURVEYED BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	REVIEWED BY	SCALE	DATE	PROVINCE	DISTRICT
Eng. Asgar Ali	Eng. Waliullah	Eng. S. Salim	Eng. Abdurrahman	Not to scale	August 2012	Badakhshan	Ishkashim
Surveyor	Designer	Checker	Reviewer				


SURVEYED BY		Eng. Aqashir	CHECKED BY	Eng. Salar	PROJECT NAME	Narmazgah Weir and Canal Protection.
DESIGNED BY		Eng. S. Hashem	REVIEWED BY	Eng. Abdurrahman	PROVINCE	Balkhistan
DRAWN BY		Eng. Wazidullah	APPROVED BY	Irrigation Directorate	DISTRICT	Ishkashim
					DATE	August 2012
					REVISION NO.	Site Plan 3


Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Irrigation, Agriculture and Livestock  
Irrigation Directorate  
Engineering Department  
KABUL


SCALE:	1:2000
Sheet No:	7

### Site Plan 3

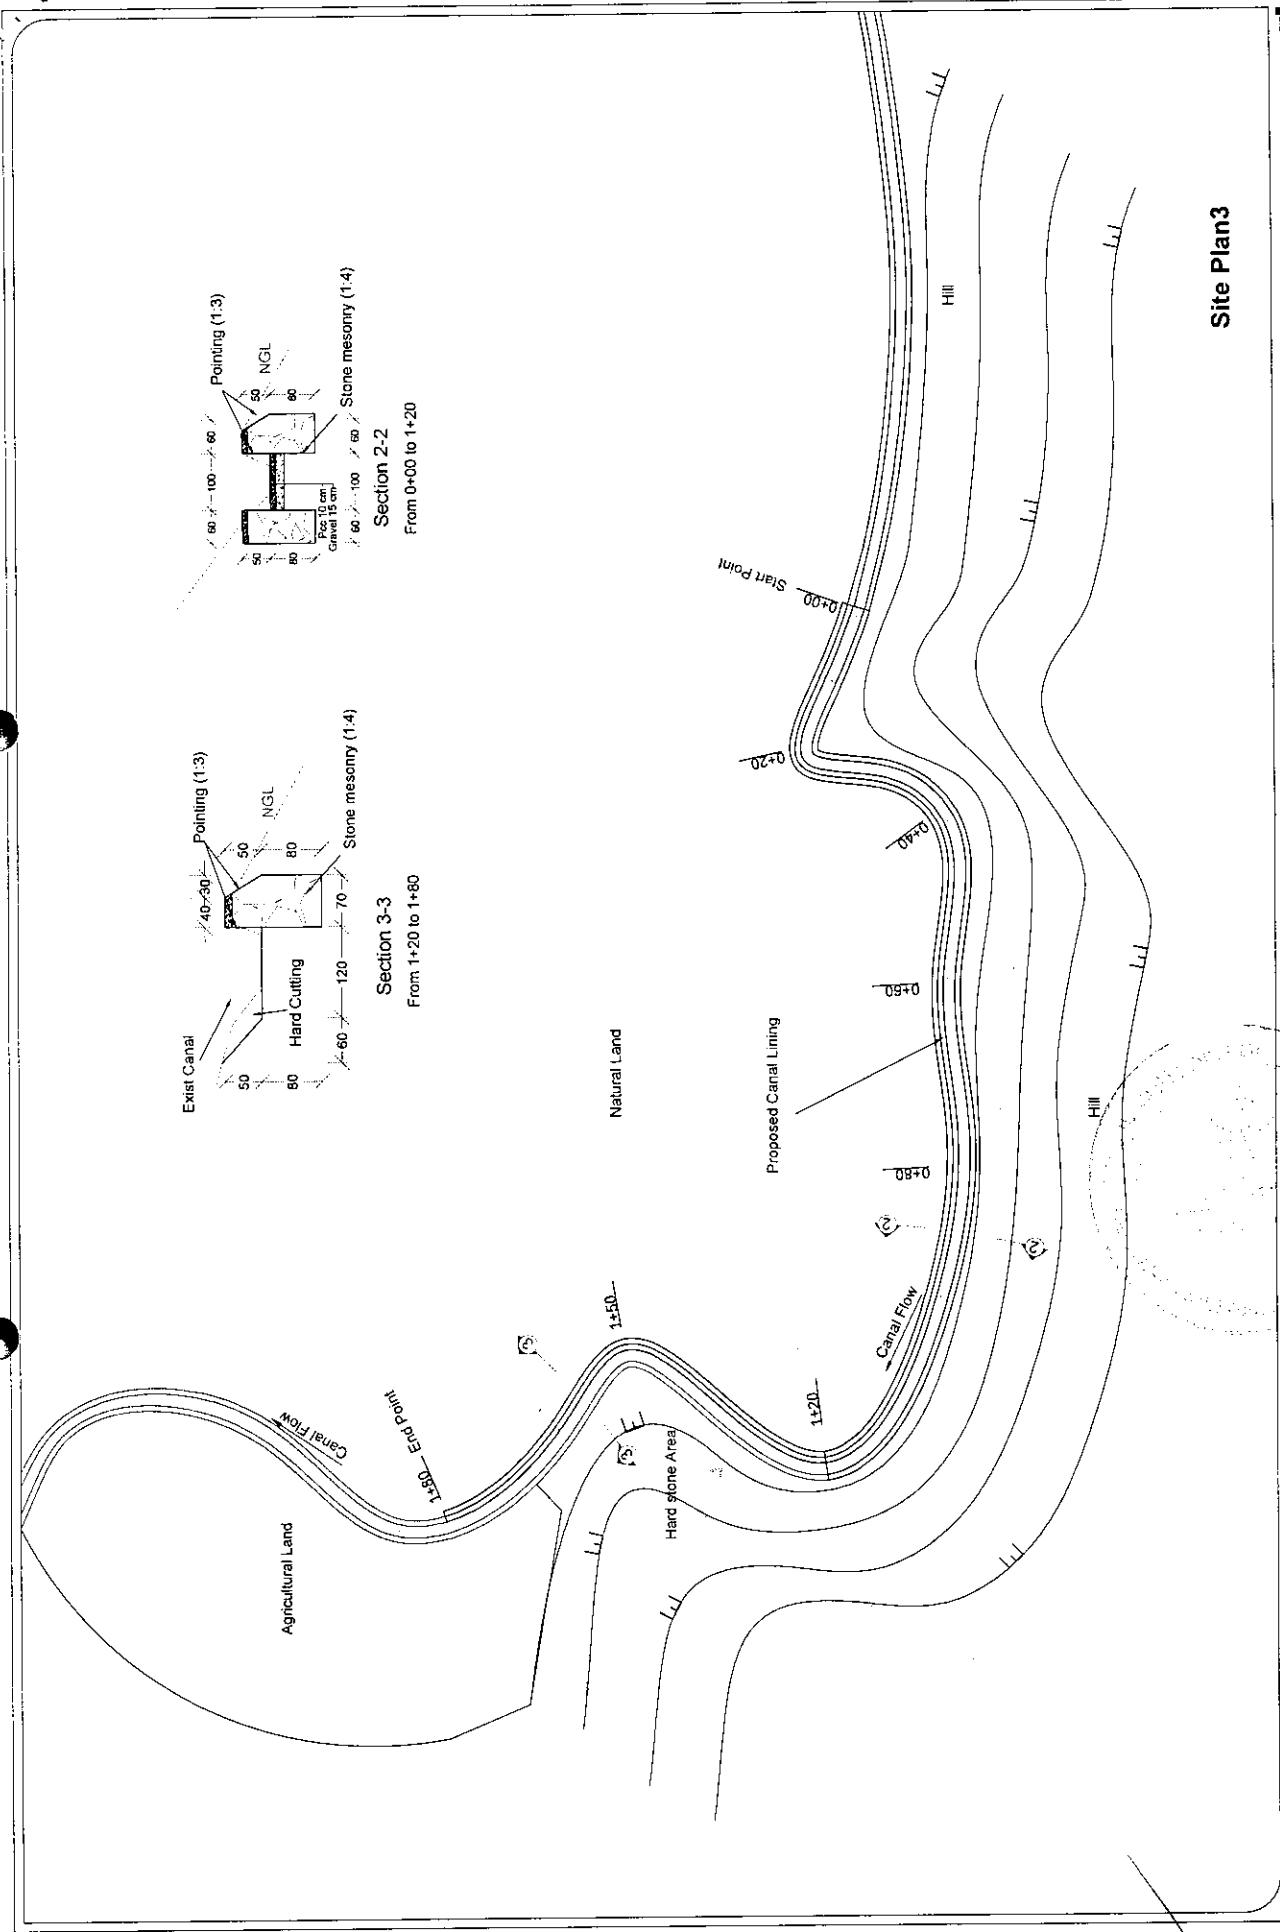

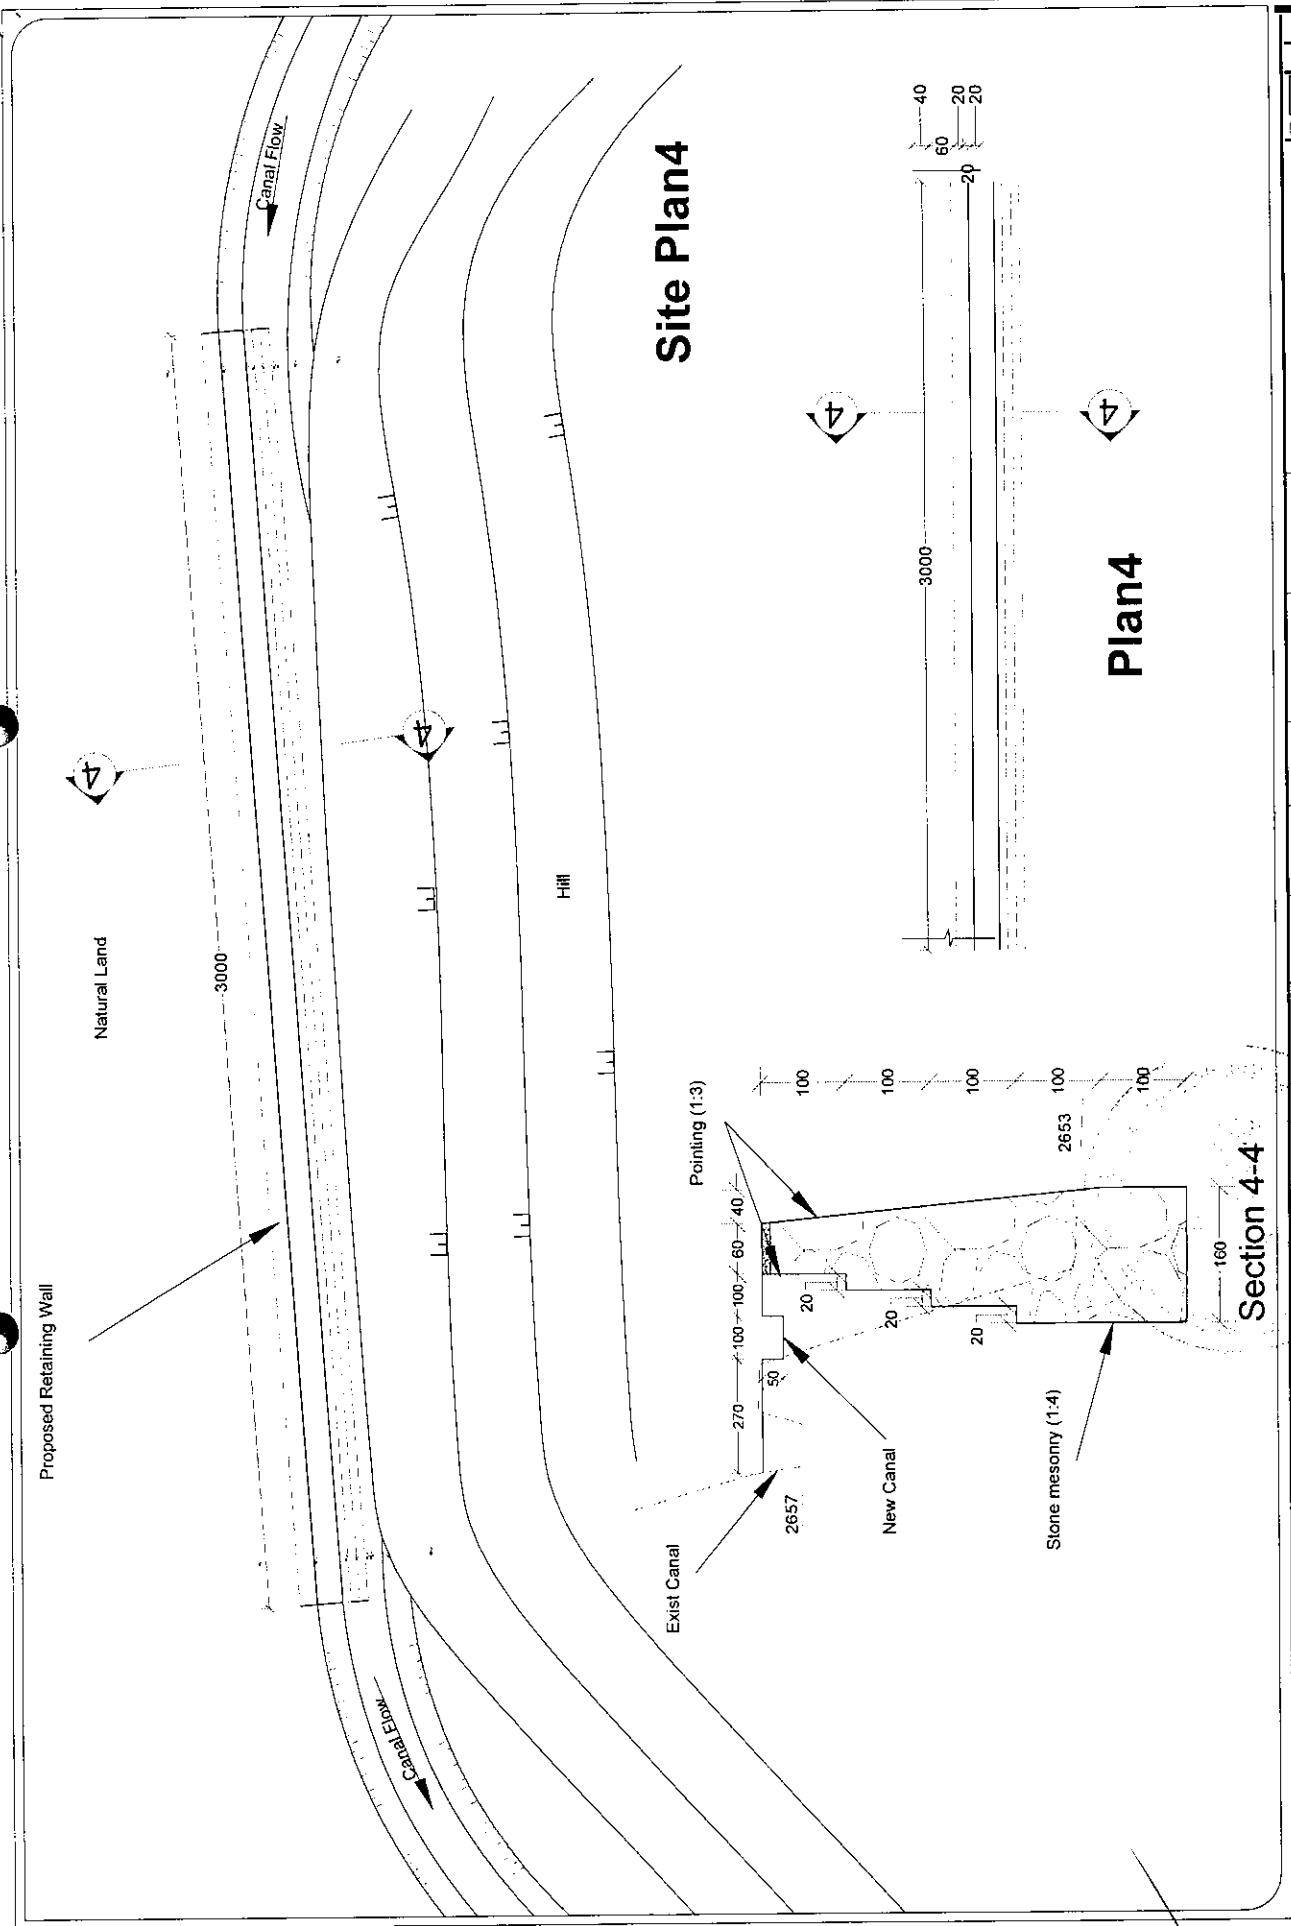

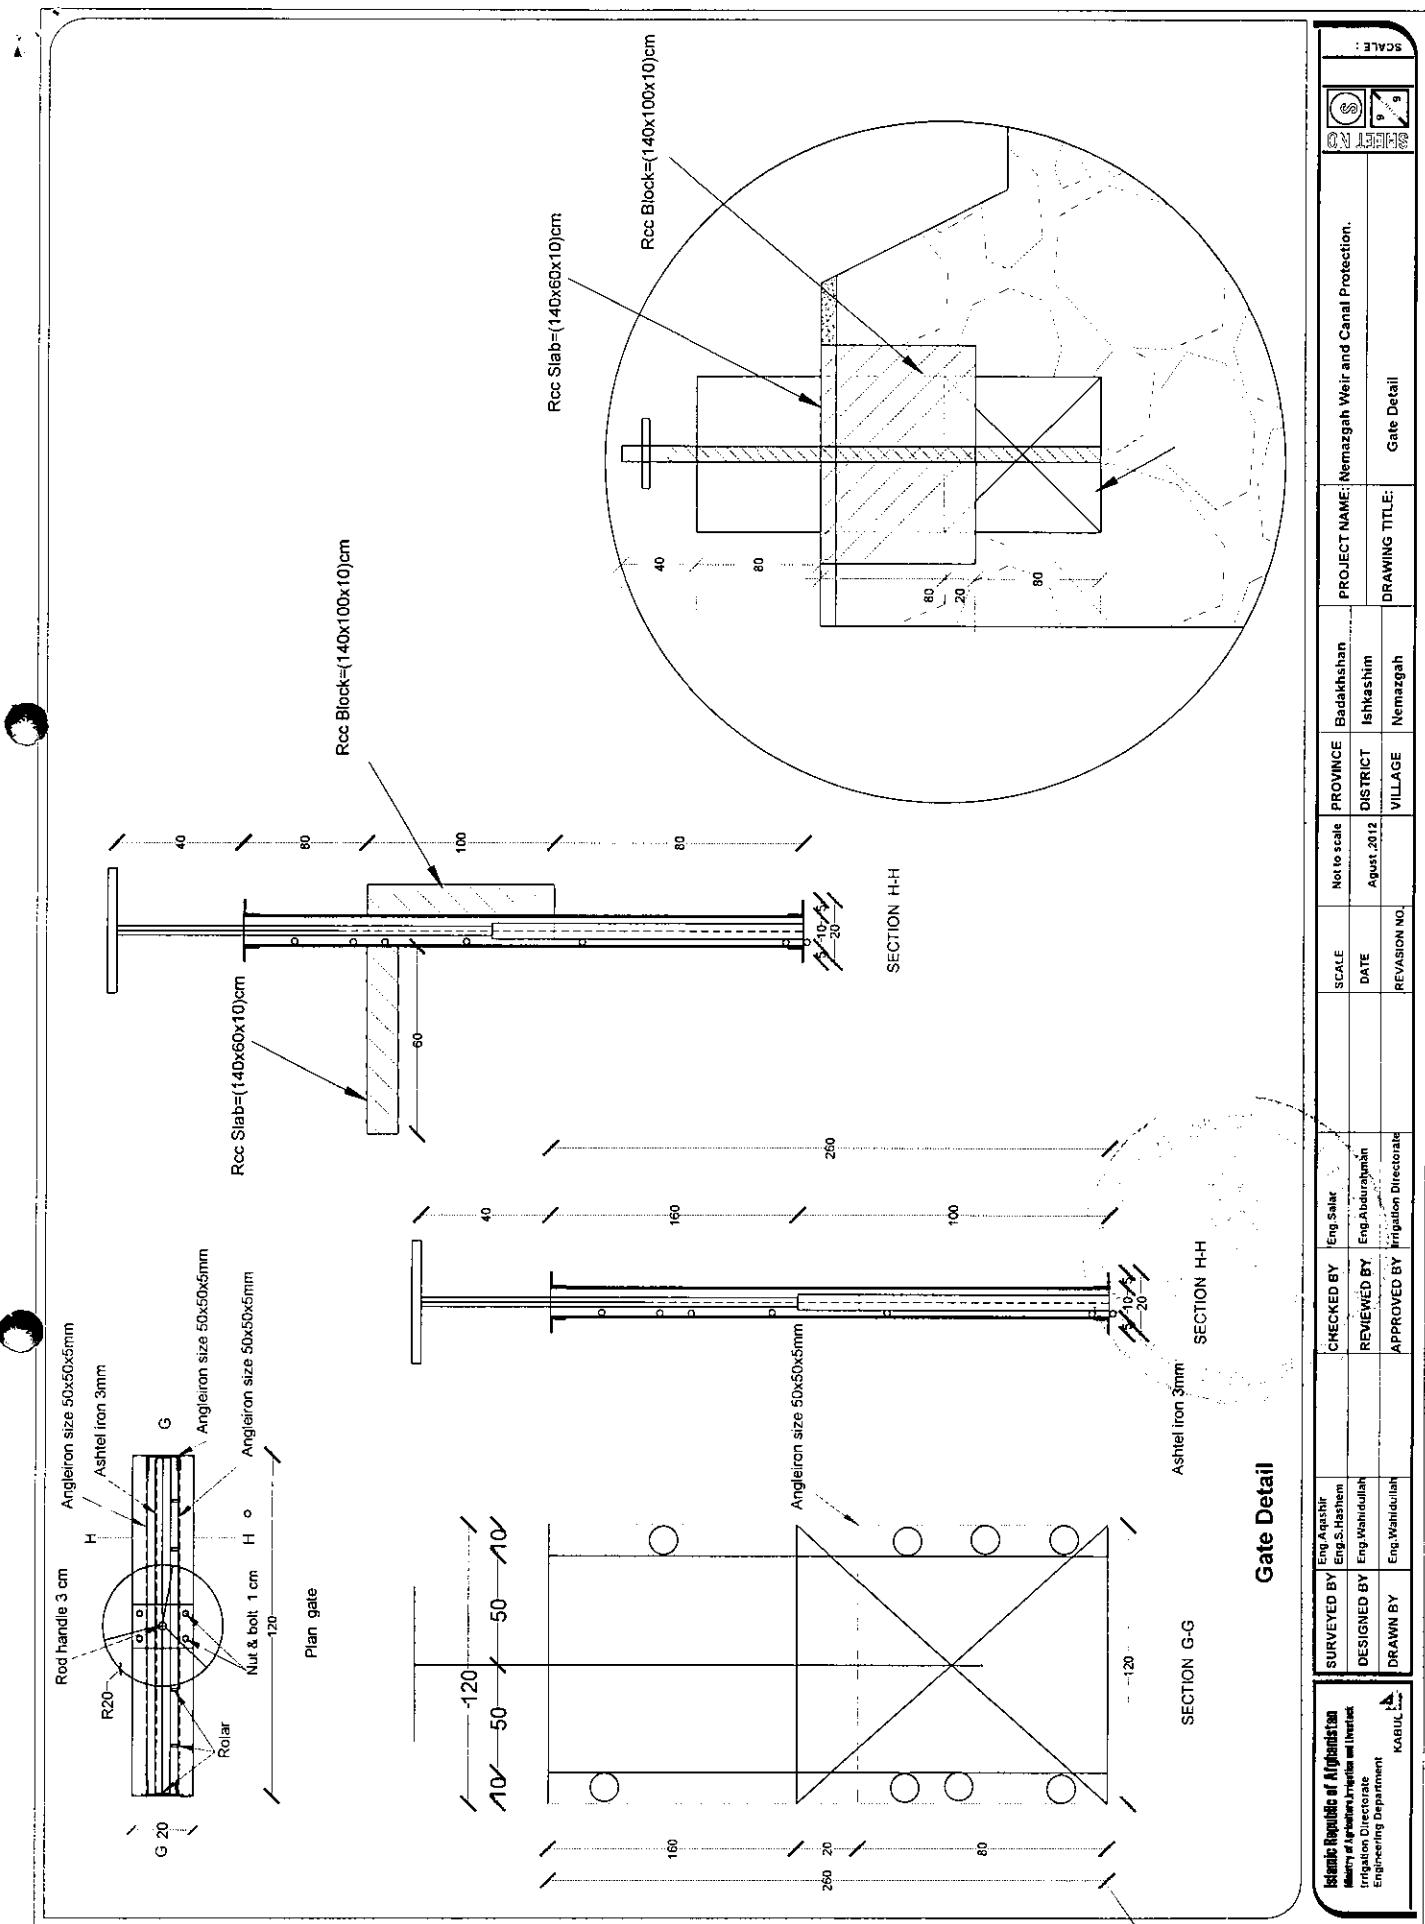



دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  
ریاست تهییه و تدارکات

قرارداد

پروژه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولايت بدخسان  
میان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

و

شرکت ساختمانی نو بهار بریالی

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/135/98

بودجه : کود انکشافی AFG-390676



تاریخ: 1398 / /

## فورمہ موافقتنامہ قرارداد

این موافقتنامه در ماه حمل سال 1398 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت ساختمانی نوبهار بریالی دارنده جواز نمبر (D-26404)، نمبر تشخیصی (1043478013) ایمیل آدرس [makbar\\_satari@yahoo.com](mailto:makbar_satari@yahoo.com) ، شماره تماس 0797777707-0744153898 واقع ناحیه 3، شهر فیض آباد، مرکز بدخشان، فیض آباد، بدخشان عقد گردیده است.

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نوافض ناشی از اجرآت در قراردادپژوه بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان که در پژوهه انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارای کود نمبر AFG-390676 به قیمت مجموعی ۲,۰۴۶,۹۴۲.۹۰ افغانی (دو امیلیون و چهل و شش هزار و نه صد و چهل و دو اعشاریه نه افغانی) پذیرفته و قراردادی قرارداد و هندرکه را لجه نمایند.

این موافقتنامه موارد ذیل پذیرفته و قراردادی قرارداد و هندرکه را لجه نمایند.

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که هر تعبیر در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه معتبر میگردند.

2. قراردادی در مقابل پرداخت اتفاقه تعهد امنی نمایند که قرارداد اموال و ممتلكات این شرکت را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نمایند.

3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت این قرارداد را با دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نوافض امور ساختمانی در زمان و شیوه مخصوص شده باشد. این قرارداد پرداخت نمایند.

4. طرف های شاهد که سبب تغییل این موافقتنامه گردیده اند.

فرمایش دهندۀ (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری) شرکت ساختمانی و سرکسازی نوبهار بریالی

اسم: همراه سلامی  
موقعاً: کارمز، کارمند امنی و کارمند (نیمی)  
( محل امضاء و مهر)

انجیل محمد طاهر "ایوب"

سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

( محل امضاء و مهر)



شرایط خاص قرارداد	
مواد شرایط عمومی قرارداد	تعدادیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسائل عمومی	
میعاد رفع نواقص بعد از تاریخ تکمیل مدت یکسال میباشد.	جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
اداره وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.	جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی 6 ماه تقویمی می باشد.	جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه: یکشن از انجینیران وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.	جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
ساحه کار امور ساختمانی واقع و لسوالی اشکاشم ولايت بدخshan میباشد.	جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ آغاز کار امور ساختمانی: بعد از تاریخ صدور مکتوب آغاز کار می باشد.	جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
امور ساختمانی شامل بازسازی سربند و تحکیم کاری کانال نمازگه واقع و لسوالی اشکاشم ولايت بدخshan می باشد.	جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تکمیل قسمت وار: قابل تطبیق نیست.	بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد

<p>اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد و شامل قرارداد می باشند.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- موافقتنامه؛</li> <li>- نامه قبولی آفر؛</li> <li>- آفر قراردادی؛</li> <li>- شرایط خاص قرارداد؛</li> <li>- شرایط عمومی قرارداد؛</li> <li>- مشخصات تخفیکی؛</li> <li>- نقشه ها؛</li> <li>- بل احجام کاری؛</li> </ul>	<p>جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>زبان قرارداد یکی از زبان های رسمی کشور میباشد. زبان قرارداد همان زبان آفر میباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>قانون نافذ بر این قرارداد قوانین جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.</p>	
<p>جدول فعالیت های قراردادی دیگر قابل تطبیق نمیباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>کارمندان کلیدی یک مدیر قرارداد یعنی انجینر با 5 سال تجربه در اجرای قراردادهای امور ساختمانی که دارای ماهیت و حجم معادل و مشابه، به شمول اینکه به حیث مدیر پروژه برای مدت حد اقل سه سال تجربه داشته باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>مبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: (تهیه بیمه از وجایب و مکلفیت داوطلبان میباشد و شامل موارد ذیل می باشد).</p> <p>برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد ( ) (افغانی</p> <p>برای زیان یا خسarde به تجهیزات قیمت تعویضی آن (تجهیزات مربوطه) پرداخته میشود.</p> <p>برای زیان یا خسarde به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات ( ) (افغانی</p> <p>مرگ یا خسarde به کارمندان:</p> <p>کارمندان قراردادی ( ) (افغانی در هر رویداد</p> <p>افراد دیگر ( ) (افغانی</p> <p>بیمه مطابق ماده 13 شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق است</p>	<p>بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد</p>

(1) گزارشات بررسی ساحه نظر بر تقاضا داوطلبان ارایه خواهد گردید.	بند 1 ماده 14 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات ارائه می نماید	بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست اداری می باشد.	بند 1 بند 21 شرایط عمومی قرارداد
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد / مرکز حل و فصل منازعات تجاری افغانستان / میباشد. محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.	ماده 62 شرایط عمومی قرارداد
<b>ب. کنترول زمان</b>	
قراردادی پلان کاری امورساختمانی را در جریان 10 روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تائید، ارائه مینماید.	بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30. سی روز میباشد.	بند 3 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، پرداخت 20.000 الی ارائه پلان کاری تجدید شده معطل قرار می گیرد.	
<b>ج. کنترول کیفیت</b>	

میعاد رفع نواقص (یک سال) میباشد.	بند ۱ ماده ۳۳ شرایط عمومی قرارداد
1. پرداخت بعد از تکمیل کار نظر به فیصدی بعد از ارائه گزارش از جانب فرمایش گیرنده و تصدیق نماینده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخته میشود. 2. بول فرمایش گیرنده در چهار قسط پرداخته میشود که در قسط اول ۲۵ فیصد بعد از ۲۵ فیصد تکمیل کار، در قسط دوم ۲۵ فیصد بعد از ۵۰ فیصد تکمیل کار، در قسط سوم ۲۵ فیصد بعد از ۷۵ فیصد تکمیل کار، و در قسط چهارم ۲۵ فیصد بعد از ۱۰۰ فیصد تکمیل کار پرداخته میشود. پرداخت های بعدی در جریان کار قرار فوق در مقابل گزارشات ییشرفت کار انجام شده بعد از تصدیق مراقبت کننده از جانب فرمایش دهنده صورت میگرد.	بند ۱ ماده ۴۱ شرایط عمومی قرارداد
د. کنترول مصرف	

<p>قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعديل نیست" و معلومات ذیل در مورد ضرایب "قابل تطبیق نیست"</p> <p>ضرایب تعديل قیم قرارذیل میباشند:</p> <p>برای واحد پول افغانی:</p> <p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل ارقام به ارقام و حروف درج گردد) میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل ارقام به ارقام و حروف درج گردد) میباشد.</p> <p>به واحد پول ( واحد پولی درج گردد):</p> <p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل ارقام به ارقام و حروف درج گردد) میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل ارقام به ارقام و حروف درج گردد) میباشد.</p> <p>شاخص ۱ به واحد پول افغانی (شاخص درج گردد) می باشد.</p> <p>شاخص ۱ به واحد پولی بین المللی مشخص شده (شاخص درج گردد) می باشد.</p> <p>(این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد)</p> <p>شاخص ۱ / اسعار به استثنای واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی (شاخص درج گردد) میباشد.</p> <p>(این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد)</p>	<p>بند 1 ماده 45</p> <p>شرایط عمومی</p> <p>قرارداد</p>
<p>فیصدی تناسب پرداخت های تامینات ۱۰٪ ده فیصد میباشد.</p> <p>تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورانی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد</p>	<p>بند 2 ماده 46</p> <p>شرایط عمومی</p> <p>قرارداد</p>

بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد	اندازه جریمه تاخیر (0.05) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 57 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد، درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.
بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد	اعام برای انجام تمام امور ساختمان : نظر به نزوم دید فرمایش دهنده.
بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد	پیش پرداخت صفر فیصد و پیش از صفر پرداخت میگردد. لازم نیست
بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد	مبلغ تضمین اجرا آینه (5) فیصد مجموع قرارداد میباشد. تضمين اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط.
<b>هـ ختم قرارداد</b>	
بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.
بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ 20000 از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید.
جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد	حداکثر تأخیر 100 روز میباشد. تعداد روز ها باید در مطابقت به بند 1 ماده 49 جریمه تاخیر شرایط خاص قرارداد می باشد.
بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد	فیضنی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات، اداره تدارکاتی، کارباقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در میعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.

#### قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

شرایط عمومی قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد.

این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تعیرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با بالمقطع نیز استفاده میگردد.

الف: عمومیات	
ماده ۱- تعریفات	۱- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:
۱- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشد.	
۲- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده ۴۴ شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.	
۳- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند ۱ ماده ۵۵ شرایط عمومی قرارداد.	
۴- قرارداد: موافقنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند ۲ ماده ۳ شرایط عمومی قرارداد می باشد.	
۵- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.	
۶- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.	
۷- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر ب شامل تعديلات بعدی وارد مطابق قرارداد می باشد.	
۸- روز: روز تقویمی می باشند.	
۹- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیضی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد.	
۱۰- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.	
۱۱- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد.	
۱۲- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند ۱ ماده ۳۵ شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.	
۱۳- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه	

بمنظور اجرای قرارداد می باشد.

14-اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.

15-تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگردد.

16-قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.

17-تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.

18-مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.

19-تآسیسات: منضمه امور ساختمانی که دارائی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد.

20-مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسؤولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.

SCC-21: به معنی شرایط خاص قرارداد است.

22-ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.

23-گزارش بررسی ساحه: شامل شرطname بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

24-مشخصات: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات واردہ یا تأیید شده توسط مدیر پروژه می باشد.

25-تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسليمی ساحه نمی باشد.

26-قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.

27-ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.

28-تعديل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.

29-امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نوسازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن

<p>(برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمیمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.</p>	
<p>2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکور یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پروره به پرسش ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می نماید.</p>	ماده 2- تفسیر
<p>2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.</p>	
<p>2.3 اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر می گردد:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- موافقتنامه؛</li> <li>2- نامه قبولی آفر؛</li> <li>3- آفر قراردادی؛</li> <li>4- شرایط خاص قرارداد؛</li> <li>5- شرایط عمومی قرارداد؛</li> <li>6- مشخصات تخفیکی؛</li> <li>7- نقشه ها؛</li> <li>8- بل احجام کاری؛ و</li> <li>9- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.</li> </ol>	
<p>3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.</p>	ماده 3- زبان و قانون قرارداد
<p>4.1 مدیر پروره به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.</p>	ماده 4- تصامیم مدیر پروره
<p>5.1 مدیر پروره با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.</p>	ماده 5- واگذاری
<p>6.1 هر گونه ارتباط بر فرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هر گونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد.</p>	ماده 6- ارتباطات
<p>7.1 قراردادی باید اداره را کتبیا در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبل از آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب</p>	ماده 7- عقد قرارداد های فرعی

	و مسؤولیت های اكمال کننده تحت اين قرارداد را متاثر نمی سازد.
7.2	در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قبل استداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.
8.1	قراردادی ساحه کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قراردادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.
9.1	9. قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تأیید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.
9.2	9.2 مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.
10.2	10.2 اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.
11.1	11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:
1	1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:
(1)	(1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب ناپذیر امور ساختمان باشد؛ یا
(2)	(2) غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی
2	2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا اثر جنگ یا آلوودگی که منطقه که ساحه کار در آن

	واقع شده است را متأثر سازد.	
11.2	<p>خطر زیان یا خسarde به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خسarde از زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خسarde ناشی از موارد ذیل باشد:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛</li> <li>2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا</li> <li>3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.</li> </ol>	
12.1	<p>خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خسarde به مالکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤولیت قراردادی می باشد.</p>	ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی
13.1	<p>قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- زیان یا خسarde به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛</li> <li>2- زیان یا خسarde تجهیزات؛</li> <li>3- زیان یا خسarde ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و</li> <li>4- صدمه شخصی یا مرگ.</li> </ol>	ماده 13- بیمه
13.2	<p>قراردادی، پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خسarde قابل پرداخت می باشد.</p>	
13.3	<p>در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.</p>	
13.4	<p>هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.</p>	
13.5	<p>طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.</p>	
14.1	<p>قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداد می شود انتکا می نماید.</p>	ماده 14- گزارش تحقيق ساحه
15.1	<p>مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.</p>	ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد
16.1	<p>قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخفیکی و نقشه ها اجرا و نصب می</p>	ماده 16- قراردادی

		نماید.
ماده 17	تاریخ تخمینی امور ساختمان	17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروره تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.
ماده 18	تصدیق توسط مدیر پروره	18.1 قراردادی مشخصات تخریکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروره جهت تأیید ارائه می نماید. 18.2 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.
		18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروره، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های مؤقت را متاثر نمی سازد.
		18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.
ماده 19	ایمنی	18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروره تأیید گرددند.
ماده 20	اکتشاف	20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروره را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروره موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارایی های فرهنگی و تاریخی می رساند.
ماده 21	ملکیت ساحه	21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرعاً خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.
ماده 22	دسترسی به ساحه	22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروره یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروره معرفی گردیده، می دهد.
		23.1 قراردادی تمام دستیر مدل پروره را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.
ماده 23	دستور، تفتیش و بررسی	23.2 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.
ماده 24	منازعه	24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروره به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم ، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد. 24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.

ب. کنترول زمان

ماده 25- پلان کاری	25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های امواسختمانی را جهت تائیدی به مدیر پروژه ارائه نماید.
25.2	پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیمانده، پشمول هر تغییر در تسلیل فعالیت ها باشد.
25.3	قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تائید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و ای ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.
25.4	تائید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.
26.1	مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسريع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.
26.2	مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموضع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.
27.1	در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسريع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و توسط اداره و قراردادی تأیید میگردد.
27.2	پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسريع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.
28.1	مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تاخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.
29.1	ماده 29- جلسات مدیرت اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند 1 ماده 32 می باشد.
29.2	مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کاپی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قبل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.
30.1	ماده 30- هشدار زود هنگام قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت

<p>قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروره ارائه می نماید.</p> <p><b>30.1</b> قراردادی با مدیر پروره در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذی دخل و جهت انجام دستور مدیر پروره، همکاری می نماید.</p>	<b>ج. کنترول کیفیت</b>
<p><b>31.1</b> مدیر پروره کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤولیت قراردادی ندارد. مدیر پروره دستور جستجو و بر ملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروره دارای نواقص است، بررسی می نماید.</p>	<b>ماده 31- تشخیص نواقص</b>
<p><b>32.1</b> در صورت دستور مدیر پروره جهت انجام آزمایش که در مشخصات تختیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حدائقه قابل جبران تلقی میگردد.</p>	<b>ماده 32- آزمایش</b>
<p><b>33.1</b> مدیر پروره قراردادی را از موجودیت هر گونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.</p>	<b>ماده 33- تصحیح نواقص</b>
<p><b>33.2</b> قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسط مدیر پروره را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می نماید.</p>	
<p><b>34.1</b> در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروره، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروره مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ مذکور از تامینات قراردادی وضع می گردد.</p>	<b>ماده 34- نواقص تصحیح نا شده</b>
<p><b>35.1</b> بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.</p>	<b>ماده 35- بل احجام کاری<sup>۱</sup></b>
<p><b>35.2</b> بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.</p>	
<p><b>36.1</b> قراردادی به درخواست مدیر پروره، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.</p>	<b>ماده 36- تغییر مقدار<sup>۲</sup></b>
<p><b>37.1</b> تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.</p>	<b>ماده 37- اضافه کاری</b>

<sup>۱</sup> در قرارداد با پرداخت بالقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند ۱ ماده ۳۷ شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعریض گردید:

بند ۱ ماده ۳۷ قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را در چریان ۱۴ روز از اطلاعیه، به مدیر پروره ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی ناشنده بشکند.

بند ۲ ماده ۳۷ در صورت پرداخت برای مواد خام بر ساحه بطور جدگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام بر ساحه را بطور جدگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.

<sup>۲</sup> در قرارداد با پرداخت بالقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده ۳۸ شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعریض گردید:

بند ۱ ماده ۳۸ تعديل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه با مشیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

و کم کاری	
ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها	38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.
38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبلاً ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.	
38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.	
38.4 در صورتیکه به نسبت استجعالت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می شود.	
38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.	
ماده 39- تخمین جریان پول نقد	39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری <sup>۳</sup> ، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.
ماده 40- تصدیقنامه پرداخت ها	40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.
40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.	
40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.	
40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری <sup>۴</sup> تکمیل شده می باشد.	
40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد.	
40.6 مدیر پروژه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا مناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.	
ماده 41- پرداخت ها	41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرای گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.
41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.	
41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.	
ماده 42- وقایع قابل جبران	42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد: ۱- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند ۱ ماده 21 شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده است.

<sup>۳</sup> نر فقرارداد با پرداخت بالقطع، بعد از برگایه کاری، جدول تعاملات اضافه گردید  
امید قرارداد با پرداخت بالقطع، این پاراگراف تکلیف تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول تعاملات  
می باشد"!<sup>۴</sup>

- 2- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متأثر می سازد؛
- 3- مدیر پروژه دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تختیکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛
- 4- مدیر پروژه دستور برملاساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، نوافع ثبت نمی گردد؛
- 5- مدیر پروژه بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛
- 6- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و برسی عینی ساحه می باشد؛
- 7- مدیر پروژه دستور حل وضیعت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل اینمی یا سایر دلایل لازم باشد؛
- 8- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛
- 9- تأخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره
- 10- تاثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛
- 11- تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلایل نا معقول از جانب مدیر پروژه؛

42.2 در صورت وقوع حانه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبیل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد. مدیر پروژه تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.

42.3 در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.

43.1 ماده 43- مالیه مدیر پروژه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی (BRT) و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسليمی آفرها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعديل می نماید. این تعديل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبلاً در قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.

44.1 ماده 44- اسعار در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.

45.1 ماده 45- تعديل قیم تعديل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.

46.1 ماده 46- تأمینات اداره الى ختم تمام کار، قسمتی از بول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.

46.2 ماده 47- جریمه تأمینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورلتی و رفع نوافع و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.

47.1 ماده 47- جریمه جریمه تأخیر به نرخ فی روز مندرج شرایط خاص قرارداد برای روز های تأخیر محاسبه تأثیر

میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتاد طرز العمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جریمه تأخیر تأثیری بر مسؤولیت های قراردادی ندارد.

47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تأخیر، مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تأخیر توسط قراردادی را با تعديل تصديق‌نامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.

48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مكافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مكافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است) شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است تصدیق می نماید.

49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فرم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدريج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکنانه وضع نمیگردد.

49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تنبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کاپی های اتوایس ها یا دیگر استناد را به مدیر پروژه ارائه می نماید.

49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعديل قیم، حداده قابل جبران، مكافات، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.

50.1 داوطلب برنده در مدت 10 روز بعد از یافتن نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصديق‌نامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.

51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.

51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فورم های تأیید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورم تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.

51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورم های امضاء شده، صورت میگیرد.

ماده 48- مكافات

ماده 49- پیش  
پرداخت

ماده 50- تضمینات

ماده 51- مزد کار

ماده ۵۲- مصارف  
ترمیم

۵۲.۱ قراردادی بمصرف خود، مسؤولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.

#### ح. اختتام قرارداد

ماده ۵۳- تکمیل

۵۳.۱ قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروره درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروره بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید.

ماده ۵۴- تسلیمی

۵۴.۱ اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.

ماده ۵۵- حساب

۵۵.۱ قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروره ارائه می نماید. مدیر پروره تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید در غیر آن، مدیر پروره در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروره تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.

ماده ۵۶- رهنمود

۵۶.۱ در صورت لروم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید.

عملیاتی و مراقبت

۵۶.۲ در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده شرایط خاص قرارداد از جانب قراردادی با عدم تأییدی آن از جانب مدیر پروره، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.

ماده 57- فسخ قرارداد

57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.

57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:

1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تأیید نگردیده باشد؛

2- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصراف از این دستور صورت نگرفته باشد؛

3- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی

4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نوافض را رفع نماید؛

5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پنهان فراهم ننماید؛ و

6- در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.

57.3 علغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجا به فسخ نماید.

57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.

ماده 58- فساد و تقلب

58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبائی، اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد.

58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبائی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد.

58.3 اداره، داوطلب، قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مواحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ احطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:

1- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرجیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر<sup>۵</sup> (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.

2- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهوأ به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.

3- تبائی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر<sup>۶</sup> داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قرارداد نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

4- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

<sup>5</sup> به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت" و "مکلفت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.

<sup>6</sup> به شرکت کننده های پرونده تدارکات (بیش از مقامات دولتی) که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را ناشئه اند، اطلاق میگردد.

۵- ایجاد اخلاق و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پرسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتكب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلاق و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلاق در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربطر ارجاع می نماید.

اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتشی و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسليمه آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.

58.4 هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهاست که در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.

ماده 59- پرداخت  
بمحض فسخ

59.1 در صورت فسخ قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیق‌نامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفہیق پیش پرداخت شده‌ای تاریخ صدور تصدیق‌نامه و پیش‌دی قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل نشده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می نماید. جریمه تأخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محاسب می گردد.

59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصدیق‌نامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفہیق پیش پرداخت اخذ ای تاریخ صدور تصدیق‌نامه را صادر می نماید.

ماده 60- ملکیت

60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.

ماده 61- عدم امکان  
تطبیق قرارداد

61.1 در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره یا قراردادی متأثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیق‌نامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیق‌نامه و کار‌ها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیق‌نامه انجام می یابد، صورت می گیرد.

ماده 62- حل منازعه

62.1 حل منازعه بطور دوستانه:  
۱- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند.

#### 64.1 مرجع حل و فصل منازعات:

2- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (۱۴) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مر جع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع می‌سازد.

#### 64.2 حکمیت:

3- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (۲۸) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (۲۸) روز از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.
